

RFC emisor: MARJ620407R1A
 Nombre emisor: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO
 RFC receptor: CEA091222BM2
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 59811943-93F4-473F-B93C-F1665EB38D56
 No. de serie del CSD: 00001000000404851356
 Código postal, fecha y hora de emisión: 90200 2018-11-06 13:09:34
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102998		1	1187		17062.39	17062.39				
Descripción	OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO.1 EN PLAZA PRINCIPAL SIN Y TANQUE ELEVADO NO.2 EN CALLE ASTRONAUTAS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MPIO. NATIVITAS TLAX. NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18 PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PERIODO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES): 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2018 IMPORT E EJECUTADO: \$17,062.39 16% POR CIENTO DE IVA \$2,729.98 TOTAL \$19,79 2.37 DEDUCCION 5 AL MILLAR OFS Y SFP EDO. \$3,831.84 IMPORTE LIQUIDO A COBRAR \$15,861.33 REVISO Jefe DE PLANEACION MVZ. ALBERT O VAZQUEZ DIAZ.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17062.39	Tasa	16.0000%	2729.98

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 17,062.39
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 2,729.98
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 19,792.37

Sello digital del CFDI:

e1KnUcPrp7coCnkHMr6IRc+S87EmK4pEpVe0t7MeOJD+cMNTxYe/7IDwhKlfa7WPPW8yIOIH1xnDwsT48igY5q60zOI5bDrquvHThFayUK00mtpUs1NTsOlwFvBAaosTwdojirfXeYyZUOrq2Xkl5a8/8iUP5brXOs/TZDnhoAmA4Vu5+I7nNeYonwldQ5gMxhmNGbe1ZSyDkiE8NqA/VdoTBI5+BrqGUUpqEjkYloS6Jy8hPzn9aWo/kd4CjVN1v+xESwOxx3Xly6cbsLocvX+KJGRA5JWfzPXdkK08I9U2f5pISVlyzRZkMUp23/pDz3EZvmhcroe2yk1HzncLe8A==

Sello digital del SAT:

H0g58fcJXbL0GVCVDf7KmqghTBp0DQH7C+SACxSZyaE7pE+mfZzGxaZyvnefHlePIFFA0aZdxEY3KCgQthP5ODaYGXulBWQ4LxbTTWSnJp1kANn3fElqgP0vtWCLRVtpVBs926WaRq qqK14DIWwugglK7cwh/vJZbhkcQy2eLIRN6uWD1nXKZkrikuvXfQb2m+JeNeuXlucChHca/Xt3HY9fs7oFhMOQlVkf+an2QCDCIusN8FbITwvxQlbRwSDFb0wC2Fxr1khIPFtHfcG9juCP642n6FTI7Spq6dErAA7B6g11hFTQkbASRFcK0U2Dwpkr9IGv4l3f4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.1|59811943-93F4-473F-B93C-F1665EB38D56|2018-11-06T13:19:37|SAT970701NN3|e1KnUcPrp7coCnkHMr6IRc+S87EmK4pEpVe0t7MeOJD+cMNTxYe/7IDwhKlfa7WPPW8yIOIH1xnDwsT48igY5q60zOI5bDrquvHThFayUK00mtpUs1NTsOlwFvBAaosTwdojirfXeYyZUOrq2Xkl5a8/8iUP5brXOs/TZDnhoAmA4Vu5+I7nNeYonwldQ5gMxhmNGbe1ZSyDkiE8NqA/VdoTBI5+BrqGUUpqEjkYloS6Jy8hPzn9aWo/kd4CjVN1v+xESwOxx3Xly6cbsLocvX+KJGRA5JWfzPXdkK08I9U2f5pISVlyzRZkMUp23/pDz3EZvmhcroe2yk1HzncLe8A==|00001000000403258748|}

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-06 13:19:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.
JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

CARATULA DE LA ESTIMACION

CEAT

ENTIDAD: TLAXCALA
ESTIMACION No. : 03 (TRES)

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO RFC: MARJ620407R1A
DOMICILIO: CALLE PROL. XICOHTENCATL NO. 5-B COL. CENTRO CALPULALPAN TLAX.
C.P.: 30200

DATOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO. 1 EN PLAZA PRINCIPAL S/N TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE
ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVEN DA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO
NATIVITAS TLAX.

CLAVE: CON-CEAT-023-18

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS, TLAXCALA.

CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO
CON-CEAT-023-18	\$ 444,400.00	\$133,320.00

PERIODO DEL CONTRATO

INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2018.
TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

CONVENIO MODIFICATORIO

DEL:
AL:

PERIODO DE LA ESTIMACION

DEL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AL: 01 DE OCTUBRE DE 2018

BUENO POR: \$15,961.33

Recibí de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, la cantidad de: QUINCE MIL, NOVECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.

en pago de la estimacion numero: 03 (TRES) FINIQUITO
amparando los trabajos realizados al: 01 DE OCTUBRE DE 2018.

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO :		
DEDUCCION 5 A. MILLAR OFS	\$	1,915.52
DEDUCCION 5 A. MILLAR SFP	\$	1,915.52
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	3,831.04

CALCULO DE LA ESTIMACION

IMPORTE EJECUTADO	\$	17,062.39
IVA 16%	\$	2,729.98
IMPORTE TOTAL	\$	19,792.37
-DEDUCCIONES OFS Y SFP	\$	3,831.04
SALDO A PAGAR:	\$	15,961.33

ELABORO

CONTRATISTA
ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BO.

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DFTO. DE PLANEACIÓN.

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA
 DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL
 E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 3 (TRES)

CONTRATISTA: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

DOMICILIO : CALLE PROL. XICOHTENCATL NO. 5-B COL. CENTRO
 CP.90200 CALPULALPAN TLAX.

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO. 1 EN PLAZA PRINCIPAL S/N TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS TLAX.

LOCALIDAD: SANTIAGO MICHAC, TLAX.

CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DE ANTICIPO	FECHA
CON-CEAT-023-18	\$444,400.00	14/08/2018 AL 30/11/2018	\$133,320.00	01-10-2018.

ESTIM.	PERIODO	IMPORTE	IVA A ENTERAR	AMORTIZACION ANTICIPO	DEDUCCIONES NOMBRE	IMPORTE	TOTAL DE DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR
1	14/08/2018 AL 29/08/2018	\$ 170,961.43	\$ 27,353.83	\$ 59,494.58	ANTICIPO	\$ 198,315.26	\$ 59,494.58	\$ 138,820.68
2	30/08/2018 AL 15/09/18	\$ 195,079.63	\$ 31,212.74	\$ 73,825.42		\$ 226,292.37	\$ 73,825.42	\$ 152,466.95
3	16/09/2018 AL 31/10/2018	\$ 17,062.39	\$ 2,729.98	\$ 0.00		\$ 19,792.37	\$ 3,831.04	\$ 15,961.33
					O.F.S. 5 AL MILLAR	\$ 1,915.52		
					S.F.P DEL EDO. 5 AL MILLAR	\$ 1,915.52		

TOTALES DE ESTIMACION: 1 (UNO)	\$ 170,961.43	\$ 27,353.83	\$ 59,494.58	\$ 198,315.26	\$ 59,494.58	\$ 138,820.68
TOTALES DE ESTIMACION: 2 (DOS)	\$ 195,079.63	\$ 31,212.74	\$ 73,825.42	\$ 226,292.37	\$ 73,825.42	\$ 152,466.95
TOTALES ESTIMACION: 3 (TRES)	\$ 17,062.39	\$ 2,729.98	\$ 0.00	\$ 19,792.37	\$ 3,831.04	\$ 15,961.33

TOTALES GENERALES: \$ 383,103.45 \$ 61,396.55 \$ 133,320.00 \$ 444,400.00 \$ 133,320.00

POR EJERCER: -\$ 0.00 POR AMORTIZAR \$ - \$ -

ELABORO

CONTRATISTA
 ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BO.

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
 JEFE DPTO. DE PLANEACIÓN.

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
 Grupo Financiero Aserta Antes
 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,
 Grupo Financiero Aserta
 RFC: AAS92C7314T7
 Avenida Periférico Sur Número 4829,
 Interior Piso 9
 Col. Parque del Pedregal
 México 1401C, Delegación Tlalpan,
 Ciudad de México
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3560-09553-0
 Código de Seguridad: xRF01.TU
 Folio: 2504759
 Monto de la fianza: \$44,440.00
 Monto de este movimiento: \$44,440.00

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 3 de Octubre de 2018 Moneda: MXN
 Movimiento: Emisión
 Fiado: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.


PARA GARANTIZAR POR ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO. LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CCN-CEAT-023-18 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2018, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$444,400.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO N°. 1 UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N, TANQUE ELEVADO N°. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA DEPENDENCIA LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZAGARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPCRTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. En la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



HUMBERTO COLIN YAÑEZ

LÍNEA DE VALIDACIÓN
 A19F A0YY 18

Firma: sDzZrH8S63d9CC1Cw0qjNXxvYdDEWZTf3yctqr5shhBc+3XsVt8qXkVb2f0QMJuA1R1Fepk3jBkVceKij3Uv58k--qglTsdCv0xvclVhYqzC03hmY2gYzsDlC0LsjoNF7gp32ot.EJNOjRgguvLmz6sFimzaWHC+nK9Lo= Digital Firmante: HUMBERTO COLIN YAÑEZ. Serie Certificado: 0000010000950c0c0d46. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE NO. 1 EN PLAZA PRINCIPAL Y TANQUE NO. 2 CALLE ASTRONAUTAS ESQ. AV. SANTA ELENA.
 UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N. SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS, TLAXCALA.

PERIODO DEL CONTRATO:
 Del 14 de Agosto de 2018 al 30 de Noviembre de 2018.
 PERIODO DE ESTIMACION:
 01 DE SEPTIEMBRE al 01 DE OCTUBRE DE 2018.
 ESTIMACION:
 03 (TRES)

No. DE CONTRATO:
CON-CEAT-023-18

FECHA DE ESTIMACION:

01 DE OCTUBRE DE 2018.

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.

SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

NO.	CONCEPTO	EST.	Presup.	EJE	TRAMO	No. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	LADOS	SUBTOTAL	U	REFERENCIA
26-20	ELABORACION DE PROTECCION Y DE ESCALERA MARINA (PASO HOMBRE), A BASE DE SOLERA DE 11/2" X 3/16", OMEGAS A CADA 70 CM. Y TRES LONGITUDINALES INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3			COMPLEMENTO DE ESCALERA	4.00					4.00	ML.	
26-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANDADOR EN FORMA DE CRUZ EN INTERIOR DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. A BASE DE ANGULO DE 2" X 1/4" REFORZADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" @ 50 CM. INCLUYE: ESMALTE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MISCELANEOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	3			CRUZ EN INTERIOR DE TANQUE	4.80				2.00	9.6	ML.	
26-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA A BASE DE MALLA CICLONICA, CAL 12.5 A UNA ALTURA DE 1.95 M. INCLUYE: POSTERIA, CONEXIONES, ALAMBRE DE PUAS A TRES HILOS, COLOCACION, EXCAVACION, CONCRETO, PUERTA DE ACCESO DE 1.00 M. DE ANCHO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3			COSTADO LONGITUDINAL	2.0	11.00		2.00		44.00		
					LADO ORIENTE	1.0	8.50		2.00		17.00		
					LADO PONIENTE	1.0	8.3		2.00		16.60		
											77.60	M2.	

ELABORO

VO.BO.

REVISO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

M.V.Z. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION.

ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT

SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURAI FS, TOPOGRAFIA, OBRA PIVRI ICA, CIVIL
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.



OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.2 CONCENTRADO DE ESTIMACION

ESTIMACION: 03 (TRES)

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018.

UBICACION: SANTIAGO MICHAC
MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.

No. DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18


PERIODO DEL ESTIMACION: 16 DE SEPTIEMBRE al 01 DE OCTUBRE DE 2018.

PERIODO DEL CONTRATO: Del 14 de Agosto de 2018 al 30 de Noviembre de 2018.

CLAVE	CONCEPTO	EST.	UNID.	BASE PRESUPUESTO	ESTIMA ESTIMACION	SALDO POR EJERCER	IMPORTE		SALDO POR EJERCER
							PRECIO UNITARIO	BASE PRESUPUESTO	
	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.2 ATRONAUTAS Y STA. ELENA				3				
26-20	ELABORACION DE PROTECCION Y DE ESCALERA MARINA (PASO HOMBRE), A BASE DE SOLERA DE 1 1/2" X 3/16", OMEGAS A CADA 70 CM Y TRES LONGITUDINALES INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3	ML.	3.50	3.50	0.00	\$ 1,450.00	\$ 5 075.00	\$ 5,075.00
26-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANDADOR EN FORMA DE CRUZ EN INTERIOR DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, A BASE DE ANGULO DE 2" x 1/4" REFORZADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" @ 50 CM. INCLUYE: ESMALTE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MISCELANEOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	3	ML.	9.80	9.60	0.20	\$ 958.55	\$ 9,393.79	\$ 9,202.08

26-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA A BASE DE MALLA CICLONICA CAL 12.5 A UNA ALTURA DE 1.95 M. INCLUYE: PASTERIA, CONECCIONES, ALAMBRE DE PUAS A TRES HILOS, COLOCACION, EXCAVACION, CONCRETO, PUERTA DE ACCESO DE 1.00 M. DE ANCHO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3	M2.	75.00	75.00	0.00	\$ 308.00	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00
SUBTOTAL									\$ 37,377.08

ELABORO



CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

REVISO



M. VZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION.

VO. BO.



ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.2

ESTIMACION: 03 (TRES)

UBICACIÓN: CALLE ASTRONAUTAS Y ESQ. AV. STA. ELENA
MUNICIPIO: NATIVITAS TLAX.




NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOV. DEL 2018.
PERIODO DE LA ESTIMACION: 16 DE SEPTIEMBRE al 01 DE OCTUBRE DE 2018.

DESCRIPCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL. 12.5

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018.

REPORTE FOTOGRAFICO

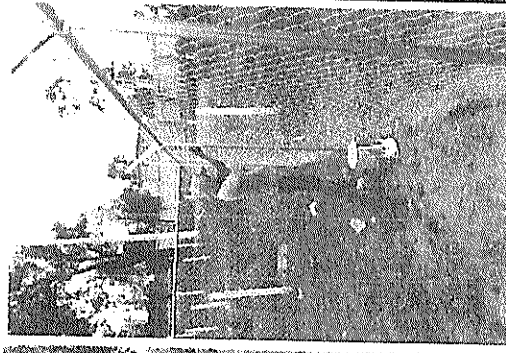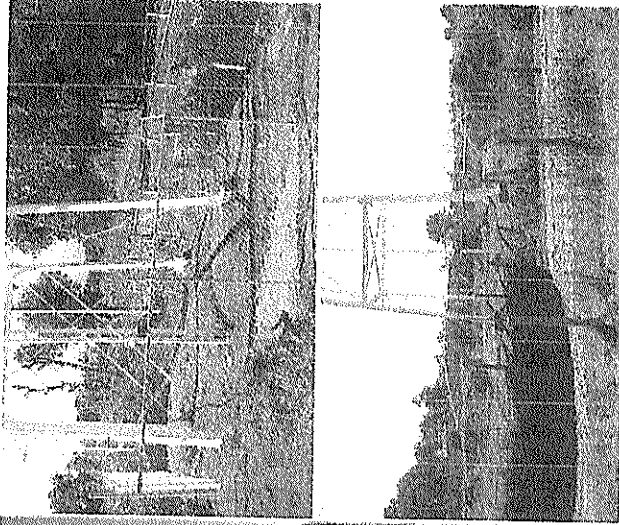

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL 12.5 DE 2.00 M. DE ALTURA

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BO

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.2

ESTIMACION: 03 (TRES)

NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

UBICACIÓN: CALLE ASTRONAUTAS Y ESQ. AV. STA. ELENA

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOV. DEL 2018.



MUNICIPIO: NATIVITAS TLAX.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 16 DE SEPTIEMBRE al 01 DE OCTUBRE DE 2018.

DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DE PROTECCIÓN EN ESCALERA MARINA, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDADOR EN INTERIOR DE TANQUE.

FFCHA: 01 DE OCTUBRE DE 2018.

REPORTE FOTOGRAFICO

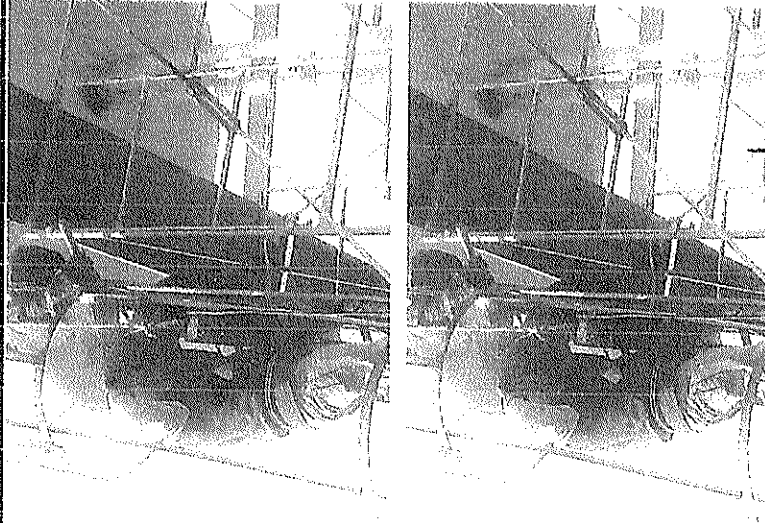

ELABORACIÓN DE PROTECCIÓN ESCALERA MARINA Y COLOCACIÓN DE ANDADO EN FORMA DE CRUZ.

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO. BO

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL E
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.

ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO RFC. MARJ620407R1A

Prol. Xicohtencatl 5-b Col. Centro C.P.90200 Calpulalpan Tlax. TEL.7499180464 CEL.7491031844

EMAIL sistmod@hotmail.com Y www.sistmod.com

TLAXCALA, TLAX. A 02 DE OCTUBRE DE 2018.

C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA DEL ESTADO DE TLAXCALA.


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS HORAS 12:00 DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018, SE HACE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO METALICO NO. 1 EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N Y TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS ESQ. AV. SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MPIO. DE NATIVITAS TLAX. BAJO NUMERO DE CONTRATO CON-CEAT-023-18 Y QUE LA CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO, HA TERMINADO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS COMO LO MARCA EL PERIODO DE CONTRATO, DEL 09 DE JULIO DE 2018 AL 22 DE AGOSTO DE 2018, Y CON UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ 444,400.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR LO QUE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LA PRESENTE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA Y EL CONTRATISTA MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, MEDIANTE SUS FIRMAS AL CALCE.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE UD. AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SIRVA DAR A LA PRESENTE A DEMAS DE ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

RECIBE


ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT

ENTREGA


ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO
CONTRATISTA



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL E
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.

ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO RFC. MARJ620407R1A

Probl. Xicohtencatl 5-b Col. Centro C.P.90200 CalpulalpanTlax. TEL.7499180464 CEL7491031844

EMAIL sistmod@hotmail.com Y sistmod@hotmail.com

TLAXCALA, TLAX. A 02 DE OCTUBRE DE 2018.

C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SIENDO LAS HORAS 12:00 DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018, SE HACE ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO METALICO NO. 1 EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N Y TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS ESQ. AV. SANTA ELENA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MPIO. DE NATIVITAS TLAX. BAJO NUMERO DE CONTRATO CON-CEAT-023-18 Y QUE LA CONTRATISTA REPRESENTADA POR EL ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO, HA TERMINADO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS COMO LO MARCA EL PERIODO DE CONTRATO, DEL 09 DE JULIO DE 2018 AL 22 DE AGOSTO DE 2018, Y CON UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ 444,400.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) POR LO QUE SE RECIBE DE CONFORMIDAD LA PRESENTE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA Y EL CONTRATISTA MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, MEDIANTE SUS FIRMAS AL CALCE.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE UD. AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SIRVA DAR A LA PRESENTE A DEMAS DE ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

RECIBE


ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT

ENTREGA


ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO
CONTRATISTA

21 DE SEPT. 2018

09

con esta fecha la Contratista informa de la Conclusión de los trabajos en tanque No. 2 de Hornos y Pintura en su totalidad, y se encuentran por colocar los Palitos, y comenzar la colocación del descado Perimetral de malla ciclónica, en la Poligonal descrita y conciliada con la DTE. de comunidad.

Inq. Oscar Ramos Acuña
Supervisor CEST.

Ing. Javier E. Morales Romero
Contratista.

01 de octubre de 2018

Nota No. 10

Con esta fecha la Contratista informa que los trabajos están concluidos al 100% de la obra denominada Rehabilitación de Tanque No. 1 de agua Potable de la plaza Central y Tanque No. 2 ubicado en calle Istapañitas esq. Av. Sts Elena, de la Comunidad de Santiago Michoacán Municipio de Nativitas, listos para su Verificación y Recepción y con la Firma de los Interesados al cual se cierra esta Bitácora de obra.

Inq. Oscar Ramos Acuña
Supervisor CEST.

Ing. Javier E. Morales Romero
Contratista.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

CONVENIO NÚMERO: CON-CEAT-MUN-017-18

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO No. 1 UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N, TANQUE ELEVADO No. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS TLAX.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;

CONTRATO: CON-CEAT-023-18

FECHA DE INICIO: 14-AGOSTO-18 FECHA DE TÉRMINO: 30-NOVIEMBRE-18


EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS, TLAX; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, ASÍ COMO C. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA, ASI COMO EL ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO, PERSONA FÍSICA EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA., ASI COMO LOS BENEFICIARIOS REPRESENTADOS POR EL LIC. OSCAR MURIAS JUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE NATIVITAS, TLAX., Y LA C. LIVIA TENCHIL LINARES, PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS, TLAX., PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO No. 1 UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N, TANQUE ELEVADO No. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS TLAX. POR LO QUE SE VERIFICO QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, TERMINADAS ESTAS ACCIONES SE HACE ENTREGA FIRMANDO DE CONFORMIDAD.


MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$444,400.00


SIN MÁS POR EL MOMENTO AMBAS PARTES FIRMAN DE CONFORMIDAD:


C. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ARQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO
PERSONA FÍSICA


C. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
LIC. OSCAR MURIAS JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE NATIVITAS, TLAX.


PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
SANTIAGO MICHAC
NATIVITAS, TLAX. 2017 - 2021
C. LIVIA TENCHIL LINARES
PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE
SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO
NATIVITAS, TLAX.
