



04/09/2018 1:56:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
04/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111325655
Cuenta de depósito:	0456334598
Nombre del tercero:	JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO
Fecha de operación:	04/09/2018
Nombre corto:	JAVIER MAC
Importe:	\$138,820.68
Folio de Internet:	0056959005

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Corrar

Imprimir

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

R.F.C. MARJ620407R1A
 PROLONGACION XICOHTENCATL 5B
 COL. CENTRO CALPULALPAN
 TLAXCALA C.P. 90200

Régimen Fiscal 6-2
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura	
Series y Folio	A30
Fecha de Emisión	2018-09-03T09:25:38
Clave de Emisión	00001000000406760285
Clave de SAT	00001000000403557578
Folio SAT	EE058364-AF85-11E8-AD12-00155D014009
Fecha de Pago	2018-09-03T09:30:39

RECEPTOR

R.F.C CEA091222BM2
 NOMBRE COMIS ON ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
 DIRECCION MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ZAHUAPAN S/N SAN HIPOLITO TLAXCALA TLAXCALA, MEX CP. 90112

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Código	Descripción	Clave	Importe	
1.000000	Unidad de servicio	E48	72102900	OBRA REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO.1 EN PLAZA PRINCIPAL S/N Y TANQUE ELEVADO NO.2 EN CALLE ASTRONAUTAS, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MPIO. NATIVITAS TLAX. NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18 PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PERIODO DE LA ESTIMACION: 14 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2018 IMPORTE EJECUTADO: \$170,961.43 16% POR CIENTO DE IVA: \$27,353.83 TOTAL: \$198,315.26 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30% 59,494.58 IMPORTE LIQUIDO A COBRAR: \$138,820.68 REVISO JEFE DE PLANEACION MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ.		\$119,673.00	\$119,673.00

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	Importe
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 68/100 M.N.		119,673.00
	IVA	19,147.68
	TOTAL	\$ 138,820.68

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 FORMA DE PAGC: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 USO DE CFDI GC3 - GASTOS EN GENERAL
 MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 CONDICIÓN DEL PAGO: CONTADO

Sello Digital Del CFDI

MZCaxKsTxKRDRYSClJm775JDT8Y4YGQxROl0f0Ryket8QGRdmZ0G3Mlb14DJE6tF8JfyK3iwqdemLYkXLT3We07zWITCEwAcv8VuSmw
 XRP3g3zdKkyIU4rwaXF92A1gU6kgETwuHDTzSNoa1S1AZX9Vd6tEqKvfxqFdehwFjrYtBBzlyaHF0I4ghRMH4MfYfYAHdUv6c1bYc
 jQ5d0MF1yj+mywuCWb3zUrdEQyh5IjDoXRWzSmmpM7Odf0cR3LcxY0R8zPE780P9TcTiQqN1+fxSKMhEEJ6kPR20WKMAJWsaEAC9pG3D
 0Z0KcTmvsXLg2BYbhMDwxFRmInA==

Sello del SAT

vonRb+o1q4ae7qMnM5glJhMQhB3uqzZOZgWrbCakQIFLU0P7YL+bc2IdOmZJ6341r7sEDyq8qtwhSiaaaLURgeLJMQB2b+wGf
 ycnJ9HxkFKlfF0hzMJGE/aeE+Zpc1mclS3d2WQWRDlirh9TvjUQ5EDh+06IGFP1WIRISrU3VVFEmQJdD5ReUR3XolPJaHsJbpd
 zDLdNzaDbM+xEJv7eWc3Z8RQ10+PbLMUohl6+yITGXIA5hsWt9zQ7r7gjlB02Is5GX8olq91/qLsnNQIF5kHfYBPBU9Gv+s7q3



Cadena Original

||1.1|EE058364-AF85-11E8-AD12-0C165D014009|2018-09-03T09:30:39|MZCaxKsTxKRDRYSClJm775JDT8Y4YGQxROl0f0Ryket8QGRdmZ0G3Mlb14DJE6tF8JfyK3iwqdemLYkXLT3We07zWITCEwAcv8VuSmwXRP3g3zdKkyIU4rwaXF92A1gU6kgETwuHDTzSNoa1S1AZX9Vd6tEqKvfxqFdehwFjrYtBBzlyaHF0I4ghRMH4MfYfYAHdUv6c1bYcJQ5d0MF1yj+mywuCWb3zUrdEQyh5IjDoXRWzSmmpM7Odf0cR3LcxY0R8zPE780P9TcTiQqN1+fxSKMhEEJ6kPR20WKMAJWsaEAC9pG3D0Z0KcTmvsXLg2BYbhMDwxFRmInA==|00001000000403557578||



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.
JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

CARATULA DE LA ESTIMACION

CEAT

ENTIDAD: TLAXCALA
ESTIMACION 1 (UNO)

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO RFC: MARJ620407R1A
DOMICILIO: CALLE PROL. XICOHTENCATL NO. 5-B COL. CENTRO CALPULALPAN TLAX.
C.P.: 90200

DATOS DE LA OBRA

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO. 1 EN PLAZA PRINCIPAL S/N TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA FEERA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS TLAX.

CLAVE: CON-CEAT-023-18

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS, TLAXCALA.

PERIODO DEL CONTRATO

INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2018.
TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE 2018.

CONVENIO MODIFICATORIO

DEL:
AL:

CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO
CON-CEAT-023-18	\$ 444,400.00	\$133,320.00

PERIODO DE LA ESTIMACION

DEL: 14 DE AGOSTO DE 2018
AL: 29 DE AGOSTO DE 2018

BUENO POR: \$138,820.68

Recibí de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, la cantidad de: ciento treinta y ocho mil, ochocientos veinte pesos 68/100 M.N

en pago de la estimacion numero: 1 (UNO)
amparando los trabajos realizados al: 29 DE AGOSTO DE 2018.

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO :	\$	59,494.58
DEDUCCION 5 AL MILLAR OFS		
DEDUCCION 5 AL MILLAR SFP		
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	59,494.58

CALCULO DE LA ESTIMACION

IMPORTE EJECUTADO	\$	170,961.43
IVA 16%	\$	27,353.83
IMPORTE TOTAL	\$	198,315.26
- AMORTIZACION ANTICIPO	\$	59,494.58
SALDO A PAGAR:	\$	138,820.68

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BO.

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DPTO. DE PLANEACIÓN.

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA, OBRA PUBLICA, CIVIL
E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES.

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION: 1 (UNO)

CONTRATISTA: JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

DOMICILIO : CALLE PROL. XICOHTENCATL NO. 5-B COL. CENTRO
CP.90200 CALPULALPAN TLAX.

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO NO. 1 EN PLAZA PRINCIPAL S/N TANQUE ELEVADO NO. 2 EN CALLE ASTRONAUTAS, ESQUINA CON AVENIDA SANTA ELENA, DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO NATIVITAS TLAX.

LOCALIDAD: SANTIAGO MICHAC, TLAX.

CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DE ANTICIPO	FECHA
CON-CEAT-023-18	\$444,400.00	14/08/2018 AL 30/11/2018	\$133,320.00	29-08-2018.

ESTIM.	PERIODO	IMPORTE	IVA A ENTERAR	AMORTIZACION ANTICIPO	DEDUCCIONES NOMBRE	IMPORTE	TOTAL DE DEDUCCIONES	SALDO A PAGAR
1	14/08/2018 AL 29/08/2018	\$ 170,961.43	\$ 27,353.83	\$ 59,494.58	ANTICIPO	\$ 198,315.26	\$ 59,494.58	\$ 138,820.68
					O.F.S. 5 AL MILLAR	\$ -		
					S.F.P DEL EDO. 5 AL MILLAR	\$ -		
TOTALES DE ESTA ESTIM 1 (UNO)		\$ 170,961.43	\$ 27,353.83	\$ 59,494.58		\$ 198,315.26	\$ -	\$ 138,820.68
TOTALES GENERALES:		\$ 170,961.43	\$ 27,353.83	\$ 59,494.58		\$ 198,315.26	\$ -	\$ 138,820.68
POR EJERCER:		\$ 212,142.02		POR AMORTIZAR \$ 73,825.42		\$ 246,084.74		

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BO.

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DPTO. DE PLANEACIÓN.

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA
 DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TOPOGRAFIA OBRA PUBLICA, CIVIL
 E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTRICA, COMPRA VENTA DE MATERIALES
JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO.

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1

CONCENTRADO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN 1 (UNO)

FECHA: 29/08/2018.

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAAC

No. DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18


MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.


PERIODO DE ESTIMACION Del 14 de Agosto de 2018 al 29 de Agosto de 2018.


PERIODO DEL CONTRATO: Del 14 de Agosto de 2018 al 30 de Noviembre de 2018.


CLAVE	CONCEPTO	EST.	UNID.	BASE PRESUPUESTO	ESTA ESTIMACION	SALDO POR EJERCER	IMPORTE S		SALDO POR EJERCER		
							PRECIO UNITARIO	BASE PRESUPUESTO			
26-01	LIMPIEZA EN INTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARDEADO PARA RETIRO DE OXIDO, PARA ALCANZAR UN PERFIL DE ANCLAJE DE 1 A 1.5 MILESIMAS EN INTERIOR DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, MANIOBRAS Y DESCONEXION DE TUBERIA O TREN PARA RETIRO DE ARENA Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	M2.	95.00	1	95.00	\$ 206.60	\$ 19,627.00	\$ 19,627.00	\$ -	
26-03	LIMPIEZA EN EXTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARDEADO PARA RETIRO DE OXIDO, PARA ALCANZAR UN PERFIL DE ANCLAJE DE 1 A 1.5 MILESIMAS EN INTERIOR DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	M2.	200.00	1	200.00	\$ 218.00	\$ 43,600.00	\$ 43,600.00	\$ -	
26-17	ELABORACION DE CORDONES CON SOLDADURA A TOPE EN FISURAS DE PLACA INCLUYE: BISELADO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	ML.	5.00	1	5.00	\$ 564.00	\$ 2,820.00	\$ 2,820.00	\$ -	
26-18	ELABORACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTABONES EN ESTRUCTURA A BASE DE PLACA DE 1/2" CON SECCION DE 0.20 X 0.25 M. PARA REFUERZO DE CPR, INCLUYE: IZAJE, MONTAJE, COLOCACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	KG.	40.00	1	39.84	\$ 0.16	\$ 84.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 13.44

26-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE EN FORMA PERIMETRAL A BASE DE IPR DE 6" X 4" DE ESPESOR DE PATÍN, INCLUYE: MATERIAL, IZAJE, MONTAJE, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1	KG.	358.92	358.92	\$	92.00	\$	33,020.64	\$	33,020.64	\$	-
26-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO EN INTERIOR INCLUYE: MISCELANEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, Y MANO DE OBRA.	1	M2.	95.00	95.00	\$	292.00	\$	27,740.00	\$	27,740.00	\$	-
26-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN EXTERIOR DE TANQUE, ESTRUCTURA, Y ESMALTE ALKIDALCO, INCLUYE: MISCELANEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.	1	M2.	200.00	200.00	\$	157.00	\$	31,400.00	\$	31,400.00	\$	-
26-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDADOR EN FORJIA DE CRUZ EN INTERIOR DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, A BASE DE ANGULO DE 2" x 1/4" REFORZADO CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" @ 50 CM. INCLUYE: ESMALTE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MISCELANEOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	1	ML.	9.80	9.80	\$	958.55	\$	9,393.79	\$	9,393.79	\$	-
SUBTOTAL											\$	170,961.43	

ELABORO 
 COMPARATISTA
 ARO. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

REVISO 
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION.
 M. V. Z. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

VO. BO. 
 SUPERVISOR CEAT
 ING. OSCAR RAMOS AVILA



OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1
 UBICACIÓN: PLAZA PRINCIPAL S/N. SANTIAGO MICHAC, NATIVITAS, TLAXCALA.

NUMEROS GENERADORES
 No. DE CONTRATO:
CON-CEAT-023-18

FECHA DE ESTIMACION:

29 DE AGOSTO DE 2018.

PERIODO DEL CONTRATO:
 Del 14 de Agosto de 2018 al 30 de Noviembre de 2018.
 PERIODO DE ESTIMACION:
 Del 14 de Agosto de 2018 al 29 de Agosto de 2018.
 UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAXCALA.
 ESTIMACION: 01 (UNO)

SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

NO.	CONCEPTO	EST.	Presup.	EIE	TRAMO	No. PZAS	PERIMETRO		ALTO	LADOS	SUBTOTAL	U	REFERENCIA		
							LARGO	ANCHO							
26-01	LIMPIEZA EN INTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARBADO PARA RETIRO DE OXIDO, PARA ALCANZAR UN PERIL DE ANCLAJE DE 1 A 1.5 MILESIMAS EN INTERIOR DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, MANIOBRAS Y DESCONEXION DE TUBERIA O TREN PARA RETIRO DE ARENA Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		95.00	$R = r^2 + h^2$ $A = 2\pi(R)(h)$			17.04	PI	2.63	1.00	44.82	M2	CILINDRO		
					3.68	3.14	1.55	1.00	35.84	M2	CASQUETE				
						3.68	PI								
26-03	LIMPIEZA EN EXTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARBADO PARA RETIRO DE OXIDO, PARA ALCANZAR UN PERIL DE ANCLAJE DE 1 A 1.5 MILESIMAS EN INTERIOR DE TANQUE ELEVADO, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		200.00			4.00		6.70	0.08	1.00	8.56	M2	PIERNA		
					4.00	4.58	0.17	4.00	12.46	M2	CPR				
					4.00	4.58	0.10	4.00	7.33	M2	CPR				
					1.00	17.04	0.73	2.00	24.98	M2	ANDADOR				
					1.00	19.54	0.12	1.00	2.34	M2	BARROTE BARANDAL				
					18.00	0.90	0.12	1.00	1.94	M2	BARROTE BARANDAL				
					18.00	0.73	0.16	2.00	4.20	M2	CARTELA DE BARANDAL				
26-17	ELABORACION DE CORDONES CON SRI DADURA A TOPE EN FISURAS DE PLACA INCLUYE: BISELADO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		5.00			9.00		4.00	0.20	4.00	28.80	ML	CORDON		



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)

NUMERO DE CONTRATO:

CON-CEAT-023-18

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC

MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.




PERIODO DEL CONTRATO:

14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 2018

DESCRIPCION: LIMPIEZA EN INTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARDEADO PARA RETIRO DE OXIDO.

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018.

REPORTE FOTOGRAFICO

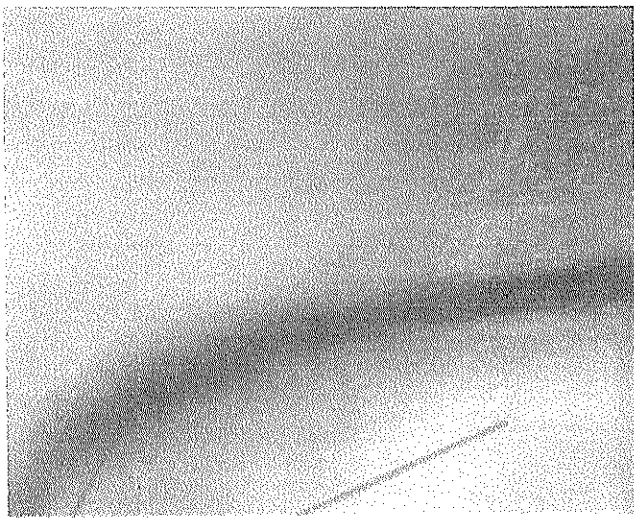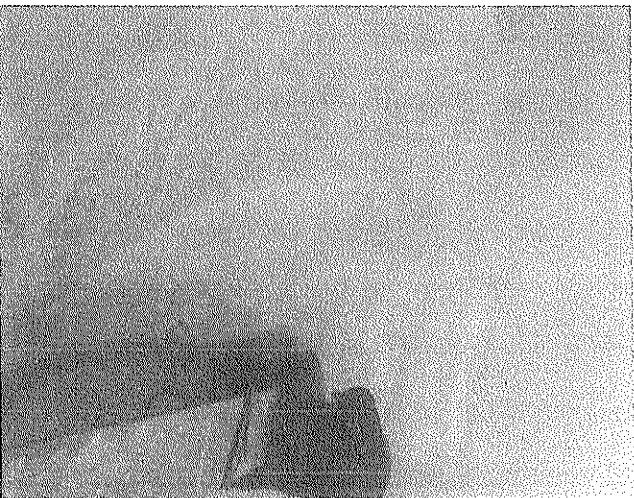

ELABORO


CONTRATISTA
ARO. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BC.

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

REVISU

ING. CEAT RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)


NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 2018

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC
MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.
DESCRIPCION: LIMPIEZA EN EXTERIOR DE TANQUE A BASE DE CARDEADO PARA RETIRO DE OXIDO.

REPORTE FOTOGRAFICO

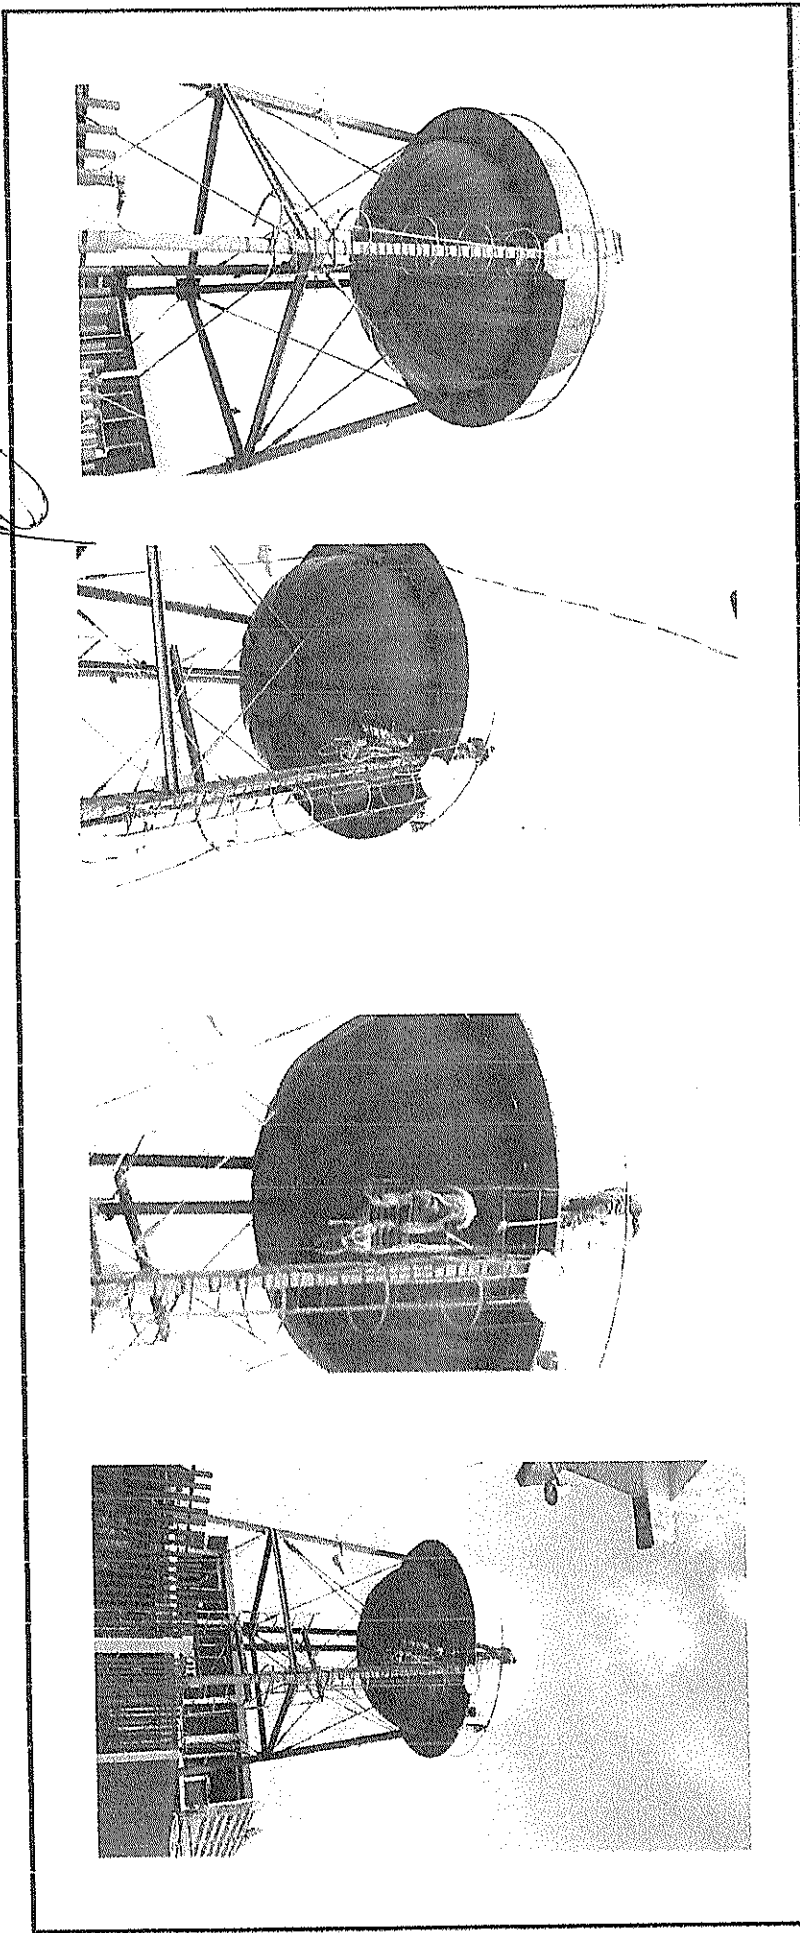

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO

VO.BC.

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)

NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/M SANTIAGO MICHAC

MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.




PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20

PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 20

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018.

DESCRIPCION: ELABORACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTABONES Y DE REFUERZOS HORIZONTALES EN ESTRUCTURA DE SOPORTE EN FORMA PERIMETRAL.

REPORTE FOTOGRAFICO

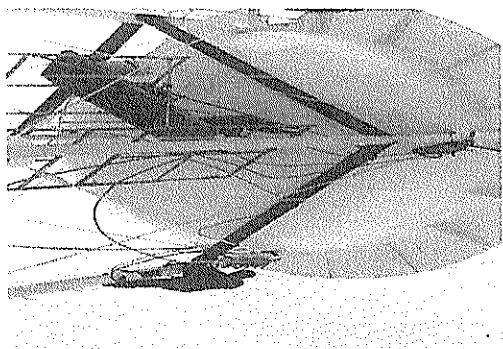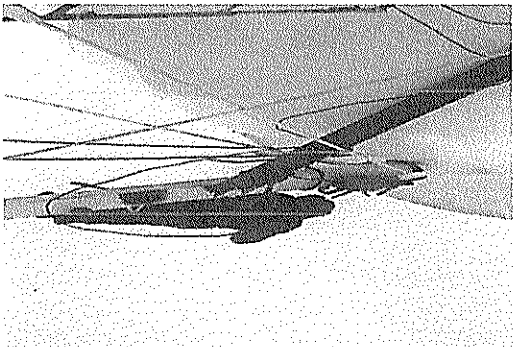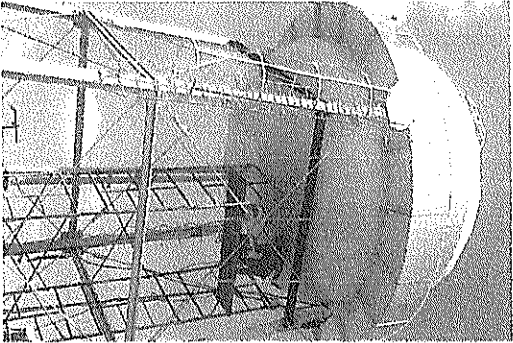

ELABORO

CONTRATISTA

ARO. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO. R.C.

ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION

REVISO

INGENIERO CAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)

NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20




PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 20

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018.

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC
MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.

DESCRIPCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y
ESMALTE EPOXICO EN INTERIOR.

REPORTE FOTOGRAFICO

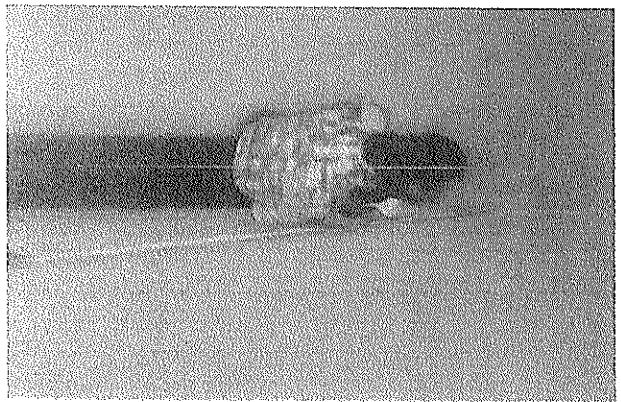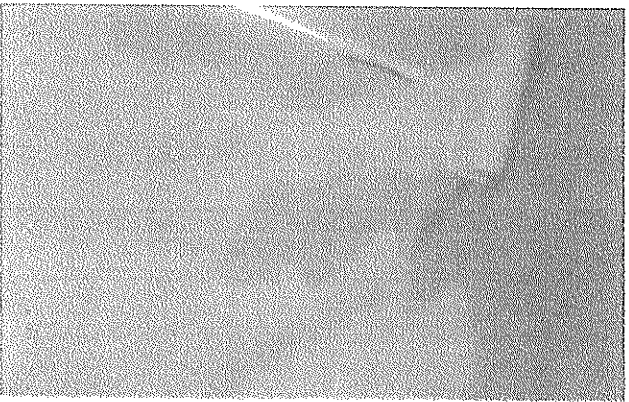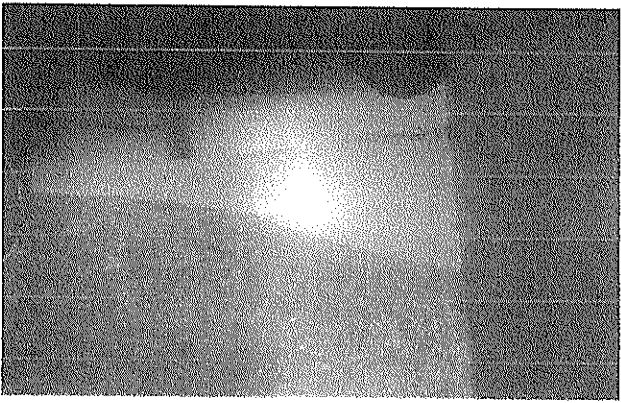

ELABORO

CONTRACTISTA

ARO. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO.BC.


ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)

NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAAC

MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.




DESCRIPCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN EXTERIOR DE TANQUE Y ESTRUCTURA.

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20

PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 20

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018.

REPORTE FOTOGRAFICO

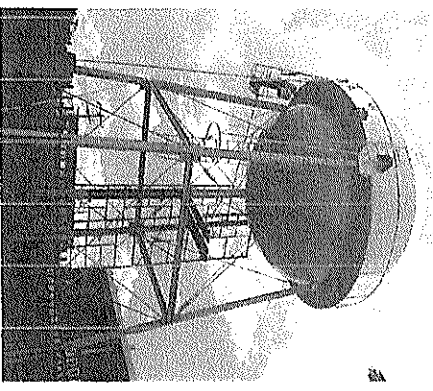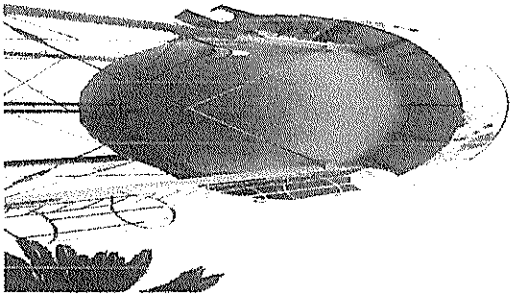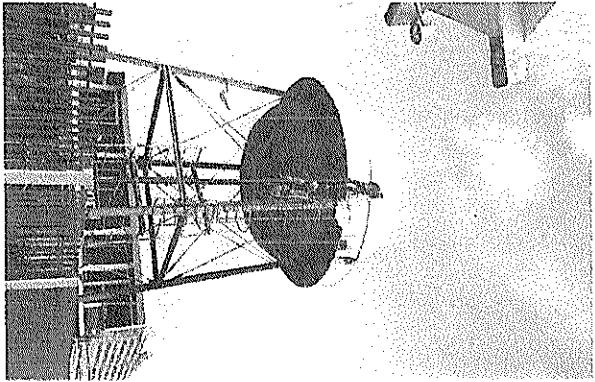

ELABORO

CONTRATISTA

ARQ. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

VO. BC.

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

REVISO

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT.



SISTEMAS MODULARES E INFRAESTRUCTURA

JAVIER EPIFANIO MACIAS ROMERO

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO NO.1.

ESTIMACION: 1 (UNO)

NUMERO DE CONTRATO: CON-CEAT-023-18

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO MICHAC

PERIODO DEL CONTRATO: 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20



MUNICIPIO: NATIVITAS, TLAX.

PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 14 DE AGOSTO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 20

DESCRIPCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANDADOR EN FORMA DE CRUZ EN INTERIOR DE TANQUE PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2018.

REPORTE FOTOGRAFICO

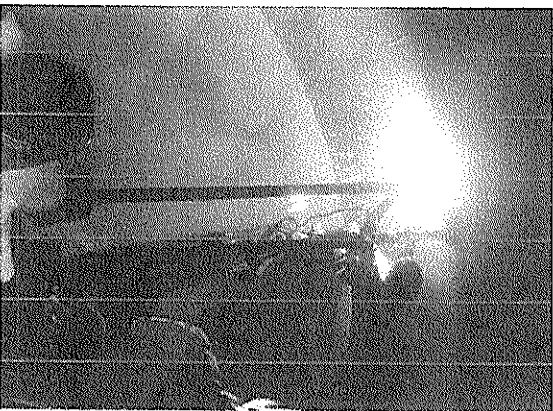

ELABORO

VO.BC.

REVISO

CONTRATISTA
ARO. JAVIER E. MACIAS ROMERO.

ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

INS. CARLOS RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT.

FECHA

14 de Agosto DE 2018

NÚM.


01

Con esta Fecha se da apertura a esta Bitácora de obras; de los trabajos denominados Rehabilitación de Tanque elevado No. 1 en plaza Principal s/n TANQUE ELEVADO No 2 en Calle Astronautas, esq. con calle SANTA ELENA, de la Comunidad de SAN-TISGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAX. Bajo No. DE CONTRATO No. CON-CEAT-023-18 con un periodo de ejecución del 14 de Agosto de 2018 al 30 de Noviembre de 2018.

FIRMANDO EN LA PRESENTE POR LA CONTRATISTA el SRQ. JAVIER EPIFANIO MACIAS POMERO y POR PARTE de LA COMISION ESTATAL DE AGUAS DE TLAXCALA, EL ING. OSCAR RAMOS BULLA, como Supervisor de OBRAS y con la firma al Calce de los Intereses se dan Inicio los trabajos de la señalada OBRAS:



Ing. Oscar Ramos Bulla
Supervisor CEAT.



SRQ. JAVIER E. MACIAS P.
CONTRATISTA.


Fecha


17 DE AGOSTO DE 2018.

No.

02

Con esta Fecha la Contratista Informa avance de los Trabajos de Cerdado y colocación de PRIMER EN EXTERIOR de Tanque No. 1 en plaza central de la Comunidad de SANTISIMO MICHOAC.



Ing. OSCAR RAMOS AVILA
Supervisor CEST.



SR. JAVIER E. MORALES R.
Contratista.

20 DE AGOSTO DE 2018

Nota No. 03

Con esta Fecha y en Presencia de la Supervisión se dio una explicación de los Trabajos a Realizar en los TANQUES, al comite de ACCTA potable de la Comunidad, para despejar cualquier duda y quedara claro los alcances de los TRABAJOS.


Ing. OSCAR RAMOS AVILA
Supervisor CEST.


SR. JAVIER E. MORALES R.
Contratista.

Fecha: 24 de Agosto de 2018.

No. 04

con esta fecha le Contratista Informa que Continúa con los Trabajos de Cardeado, en Exteriores y se programan el Corte del Servicio de Abasto de Agua, en coordinación con el Comité, la Presidencia de Comunidad y Bombero.

Además de Iniciar los Trabajos de pintura de Esmalte en Exteriores, y se da Inicio al montaje de Vigas IPR de 6" x 4" y 50 Perzo con Cantabamos de 1/2" y a en Espesa de Ruz Verde para Inicio de Trabajos al Interior del Tanque No. 1.



Inq. Oscar Ramos Avila
SUPERVISOR CEST



Sr. Javier E. Macías R.
Contratista


28 de Agosto de 2018.

Nota No. 05

con esta fecha se Informa de los Avances de Los Trabajos al Interior del Tanque No. 1, con los Trabajos de Cardeado y pintura, así como el andador Intermedio Concluido, con un avance total de Los Trabajos de un 90%.



Inq. Oscar Ramos Avila
SUPERVISOR CEST



Sr. Javier Macías R.
CONTRATISTA
