

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Factura

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72103300	1	ACT - Actividad	OBRA DESOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTEULPAN MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAXCALA CONTRATO CON-CEAT-008-21 PERIODO DE CONTRATO 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DEL 2021 PERIODO DE LA ESTIMACION 06 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2021 LA ESTIMACION \$109,086.20 IVA: \$17,453.79 IMPORTE TOTAL: \$126,539.99 DEDUCCIONES OFS 5.51 AL MILLAR 601.06 C.E 5. AL MILLAR \$545.53 TOTAL DEDUCCIONES \$ 1 146.49 IMPORTE LIQUIDO A COBRAR \$ 125,393.50	109,086.20	109,086.20


Subtotal 109,086.20

Descuento

IVA (16) % 17,453.79

Total 126,539.99

CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506249409

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1|E7C624C1-6D6B-4441-B0B5-64516076BCC0|2021-04-19T15:04:30|TSP080724QW6jvDBpjJmP1eQjsEV5uFvMal3XXn4fXPArmmEr7xDTA/N
bjPxFPmHU/in036WH5S5B2MdSxKB/lu41UjSnD0oYrM929JvCYwKbeXqH6sk4YgyR/LqAZR54QOlgRnSDkXbbW6JDe2Qf6ViDKaobdPnW6OPpjFKIGnR
I1CA+8Fo3ipXuRB3ntHgzsJiNqmEVzaU2yCJrKkOuzlwEKbJzroxKKTWmfmpI5dw0EPwVMJxsY/40+TRGI72l/QaVNI2CY8c00vCNFs8dd8bb455Dz0VGq2
eqzkgQmTJUJKjsulFn3lCFy9gFRK6by+TIAMerZh56ht8OJHymaDX9sA==|00001000000501960426j|

Sello Digital del Emisor:

vDBpjJmP1eQjsEV5uFvMal3XXn4fXPArmmEr7xDTA/NbjPxFPmHU/in036WH5S5B2MdSxKB/lu41UjSnD0oYrM929JvCYwKbeXqH6sk4YgyR/LqAZR54QOlgRnSDkX
bbW6JDe2Qf6ViDKaobdPnW6OPpjFKIGnR11CA+8Fo3ipXuRB3ntHgzsJiNqmEVzaU2yCJrKkOuzlwEKbJzroxKKTWmfmpI5dw0EPwVMJxsY/40+TRGI72l/QaVNI2CY8
c00vCNFs8dd8bb455Dz0VGq2eqzkgQmTJUJKjsulFn3lCFy9gFRK6by+TIAMerZh56ht8OJHymaDX9sA==

Sello digital del SAT:

NlcC2mKnDirUKAgGo2o2Ovqgc+U9bL119wRALFSIsaOUcLdaS9/G8P/Z5+FekycnpyZB0cs2qa9qJfM90EKARDILP5/9ezs0lEsRSwjfBTqb0SaEJxYzeEw5lWm/m
ypT+0KNqGV3zI7rI7TLuecqXbfB3R9crygU+bZqjS1XgMgWqUozAT+AAhRsrGAjcdJgCB1LioApNzOMkxMBIZOPKr93j45z8BZ3pxswbQqseFzsT69bdjMqUaITGG6qJ
E3eRjEdcC1ALvOr9C8mMyyKHJC6lkk8lP+eQI9jysLPul++mAWYnFKMxHOBra11EQcprWwUBk2Nwg==





Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
 RFC: AIS970115HG4
 Avenida Periférico Sur Número 4829,
 Interior Pliso 8
 Col. Parque del Pedregal
 México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
 Teléfono: (55) 5447-3300

Fianza Número: 4301-23883-8
Código de Seguridad: SMR3HBF
Folio: 1385366
Monto de la fianza: \$12,654.00
Monto de este movimiento: \$12,654.00

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 16 de Abril de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.


PARA GARANTIZAR POR LA C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° CON-CBAT-008-21, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$126,539.99 (CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RESPECTO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: DESASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUADRUDELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX., CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SU REGLAMENTO; ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION ASEGURADORA PROCEDERA A SU CANCELACION, C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA DEPENDENCIA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D) - LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS ASI MISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 Bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

UH7W8Zjkw08FjC2D7ezpHYKmc6yqR0R044REAF3jmbZmucd7Gatstuby4HucAR8X0CHHCZLBJduJYK2TjtlUpYaucEsmgacAGkGsmS4B4/USUkumK77roqSR7YGBANWZ2C757zOavAM3IBIKGatYAFKcc5BwRMMWNNNFqImSoog6b
 ad4MkKJ0j0pSP0cH2fBy76UR8Bk4Luz3puzdCHfgh7uQpmUnAlN4ndEtrjwa7yUpjmsr1Z2zmsjD5iz11G4VoyMhW8G03R5wCDEKKFongYhtVraV25wKcmGdGch89z33qat+PepdIP1P1g=
 Serie Certificado: 0000010009900012781, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

LÍNEA DE VALIDACIÓN

1184 D5FU 21

E/R XIX-IV-MMXXI V.1



Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AIS970115HG4
 Avenida Periférico Sur Número 4829,
 Interior Piso 8
 Col. Parque del Pedregal
 México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	4301-23888-3
Código de Seguridad:	LF5SUMr
Folio:	1385368
Monto de la fianza:	\$12,654.00
Monto de este movimiento:	\$12,654.00

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Abril de 2021
Movimiento: Emisión
Fiado: CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Moneda: MXN
Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.


Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA,
 PARA GARANTIZAR POR LA C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° CON-CEAT-008-21, DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$126,539.99 (CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYE I V.A., RESPECTO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: DESASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE OUAHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX., CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SU REGLAMENTO; ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B) EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD, D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ENTIDAD, E) LA INSTITUCION ASEGURADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".


MANUEL CARDENAS CAMPOS

LISTAGFVr-mAU8PFv4v8s-v38P0pRj1KCSgaanDwIAHfH8cW/D59c74L5omVIRgcmYK0JHfH8cWcaalDoyvZ2881wngI8K-Cx7270pda-ata-185-FN1S0L1BRCAsAsNGRCB0FhHhUPU7Z05B6C81KgnZ4F1EDFD0sLU05WZEmwA0SKRHX
 XnIMozcJPD1H808cL7Om5nkxvDFV5g9nwBVsmlkoadt8RCoK60u4amX4yFq5GvrrR0ccogta by0crl-SHEIngh144Ve0uqAmf185SWf8uYU0LDEG6a3Dxm474Lue2/h10IG6KW-0-8g4w-
 Serie Certificado: 0000100009900012781, Presador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV

LÍNEA DE VALIDACIÓN
1184 D5H8 21

CARATULA DE LA ESTIMACION

DEPENDENCIA: **COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA** FECHA: **16 DE ABRIL DE 2021**
 ESTIMACION: **1 (UNO, FINIQUITO)**

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS**

DATOS DE LA OBRA **PERIODO DEL CONTRATO**

OBRA: **DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.**
 DESCRIPCION: **DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA.** INICIO: **06 DE ABRIL DE 2021**
 TERMINO: **26 DE ABRIL DE 2021**

UBICACIÓN: **CALLE CAMINO LA LAGUNA**
 MUNICIPIO: **TLAXCALA, TLAX.**


CONTRATO **CON-CEAT-008-21** IMPORTE **\$126,539.99** ANTICIPO **\$0.00**


BUENO POR: **\$126,539.99**

RECIBI DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA LA CANTIDAD DE : **CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.**
 EN PAGO DE LA ESTIMACION: **1 (UNO, FINIQUITO)**
 AMPARANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS AL : **15 DE ABRIL DE 2021**

DEDUCCIONES **IMPORTE DE LA ESTIMACION**

DEDUCCIONES	IMPORTE DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO :	IMPORTE EJECUTADO \$ 109,086.20
O.F.S. 5.51 AL MILLAR	IVA 16% \$ 17,453.79
C.E. 5 AL MILLAR	IMPORTE TOTAL \$ 126,539.99
	AMORTIZACION ANTICIPO \$ -
	5 AL MILLAR C.E. \$ 545.43
	5.51 AL MILLAR O.F.S. \$ 601.06
	TOTAL DEDUCCIONES \$ 1,146.49
TOTAL DEDUCCIONES:	SALDO LIQUIDO A COBRAR: \$ 125,393.50


ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT


CYNTHIA IVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021

OBRA:

DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACIÓN:

CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD:

CUAUHELULPAN

MUNICIPIO:

TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO:

CON-CEAT-008-21

PERIODO CONTRATO:

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

ESTIMACIÓN:

1 (UNO, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACIÓN:

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO			\$126,539.99
IMPORTE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO, FINIQUITO)	\$126,539.99		
SALDO POR ESTIMAR	\$ 0.00		
SUMAS IGUALES	\$ 126,539.99	\$	126,539.99

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO		\$	-
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN 1 (UNO, FINIQUITO)	\$ -		
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ -	\$	-

ELABORÓ

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.
 UBICACIÓN: CALLE CAMINO LA LAGUNA
 LOCALIDAD: CUAUHTELULPAN
 MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.
 CONTRATO: CON-CEAT-008-21
 PERIODO CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$126,539.99
 ESTIMACIÓN: 1 (UNO, FINIQUITO)
 PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE CONTRATADO			ESTIMACION						
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	E-1	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE	
	DEZASOLVE DE DRENAJE											
CEAT_0101	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MADERA PARA CRUCETAS, CAL PARA INDICACION DE ANCHOS, VARILLAS Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	\$ 8.50	\$ 51.00	6.00	\$ 51.00	6.00	\$ 51.00	0.00	\$0.00	
CEAT_0609	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN TERRENO CLASE I, CON MATERIAL 0-0-100-0, (M3 0% TIERRA, 100% TEPETATE, 0% ROCA) DE 0.00 MTS 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	6.00	\$ 175.00	\$ 1,050.00	6.00	\$ 1,050.00	6.00	\$ 1,050.00	0.00	\$0.00	
CEAT_0702	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESPESOR 10 CM. EN CEPAS M2 PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE: ACARREO, ACOSTILLADO Y AFINE DE CAMA DE ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	6.00	\$ 62.00	\$ 372.00	6.00	\$ 372.00	6.00	\$ 372.00	0.00	\$0.00	
CEAT_2002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE CONCRETO TIPO ECOLOGICO DE 12" (38.00 CM) CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: ACARREO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.00	\$ 358.30	\$ 3,583.00	10.00	\$ 3,583.00	10.00	\$ 3,583.00	0.00	\$0.00	
CEAT_2403	1.20 POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A TIZON APL. PULIDO, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DIAM. DE 0.60 A 0.90 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.20 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 7,900.00	\$23,700.00	3.00	\$ 23,700.00	3.00	\$ 23,700.00	0.00	\$0.00	

AUTORIZO


 MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO


 ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT

ELABORO


 CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELUHPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACIÓN: CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD: CUAUHTELUHPAN

MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO: CON-CEAT-008-21

PERIODO CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO: \$126,539.99

ESTIMACIÓN: 1 (UNO, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	E-1	IMPORTE		VOLUMENES E IMPORTES ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE
		CONTRATADO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE				
CEAT_2405	REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A. TIZON, APL. PULIDO, BRIGAL Y TRPA DE CONCRETO DIAM. DE 0.80 A 0.90 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARRIOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.00	\$ 4,501.81	PZA	\$ 4,501.81	\$4,501.81	\$ 4,501.81	1.00	\$ 4,501.81	\$ 4,501.81	1.00	\$ 4,501.81	0.00	\$ 0.00
CEAT_2703	RELLENO DE CEPA A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 EXCAVACION Y COMPACTADO CON PIZON METALICO, INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARRIOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	4.69	\$ 116.00	M3	\$ 116.00	\$544.39	\$ 544.39	4.69	\$ 544.39	\$ 544.39	4.69	\$ 544.39	0.00	\$ 0.00
CEAT_0113	DEZASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR UTILIZANDO AGUA A PRESION, Y LIMPIEZA MANUAL DE POZOS DE VISITA EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	580.00	\$ 129.80	ML	\$ 129.80	\$75,284.00	\$ 75,284.00	580.00	\$ 75,284.00	\$ 75,284.00	580.00	\$ 75,284.00	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL:						\$109,086.20	\$109,086.20		\$109,086.20	\$109,086.20		\$109,086.20		\$0.00
16% I.V.A.:						\$17,453.79	\$17,453.79		\$17,453.79	\$17,453.79		\$17,453.79		\$0.00
IMPORTE TOTAL:						\$126,539.99	\$126,539.99		\$126,539.99	\$126,539.99		\$126,539.99		\$0.00

REVISO

ELABORÓ

Cynthia Yvette Maravilla Brindis

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

Oscar Ramos Avila

OSCAR RAMOS AVILA
SUPERVISOR CEAT

AUTORIZO

MVZ Alberto Vazquez Diaz

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO \$126,539.99
 IMPORTE DE LA EST. 1 (UNO, FINIQUITO) \$0.00
 IMPORTE POR ESTIMAR \$126,539.99
 SUMAS IGUALES \$126,539.99



FECHA: 15 DE ABRIL DE 2021

DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE FOSOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTLULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

OBRA:
 UBICACIÓN: CALLE CAMINO LA LAGUNA
 LOCALIDAD: CUAUHTLULPAN
 MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.
 CONTRATO: CON-CEAT-008-21
 PERIODO CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$126,539.99
 ESTIMACIÓN: 1 (UNO, FINIQUITO)

NUMEROS GENERADORES

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN	EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
CEAT_2403	1.20 POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A TIZON APL. PULIDO, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DIAM. DE 0.60 A 0.80 M SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.20 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		2-3	F-G	PZ	2.00				2.00		
			3	F-G	PZA	1.00				1.00		
CEAT_2405	REHABILITACION DE POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M A TIZON APL. PULIDO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DIAM. DE 0.60 A 0.90 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		3	C	PZ	1.00				1.00	3.00	
CEAT_2703	RELLENO DE CEPAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 EXCAVACION Y COMPACTADO CON PIZON METALICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A PIE EN PENDIENTES PROLONGADAS, HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		2-3		M3	1.00	6.00	0.60	1.00	3.60	1.00	
			3	F-G	M3	1.00	4.00	0.60	1.00	2.40		
										-0.71		
										-0.60		
											4.69	

Alberto Vazquez Diaz


MRZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Oscar Ramos Avila

ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT

Cynthia Yvette Maravilla Brindis

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021



OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELUHPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.
 UBICACIÓN: CALLE CAMINO LA LAGUNA
 LOCALIDAD: CUAUHTELUHPAN
 MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.
 CONTRATO: CON-CEAT-008-21
 PERIODO CONTRATO: DEL 08 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$126,539.99
 ESTIMACIÓN: 1 (UNO, FINIQUITO)
 PERIODO ESTIMACIÓN: DEL 08 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN										NUMEROS GENERADORES		
		EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
CEAT-0113	DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR UTILIZANDO AGUA A PRESION, Y LIMPIEZA MANUAL DE POZOS DE VISITA EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	A	1-2	ML	1.00	52.00						52.00		
		2	A-B	ML	1.00	34.00							34.00	
		2	B-C	ML	1.00	61.00							61.00	
		2	C-D	ML	1.00	65.00							65.00	
		2	D-E	ML	1.00	77.00							77.00	
		2	E-F	ML	1.00	28.00							28.00	
		2	F-G	ML	1.00	31.00							31.00	
		2	G-H	ML	1.00	78.00							78.00	
		2	H-I	ML	1.00	99.00							99.00	
		2	I-J	ML	1.00	55.00							55.00	
													580.00	

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

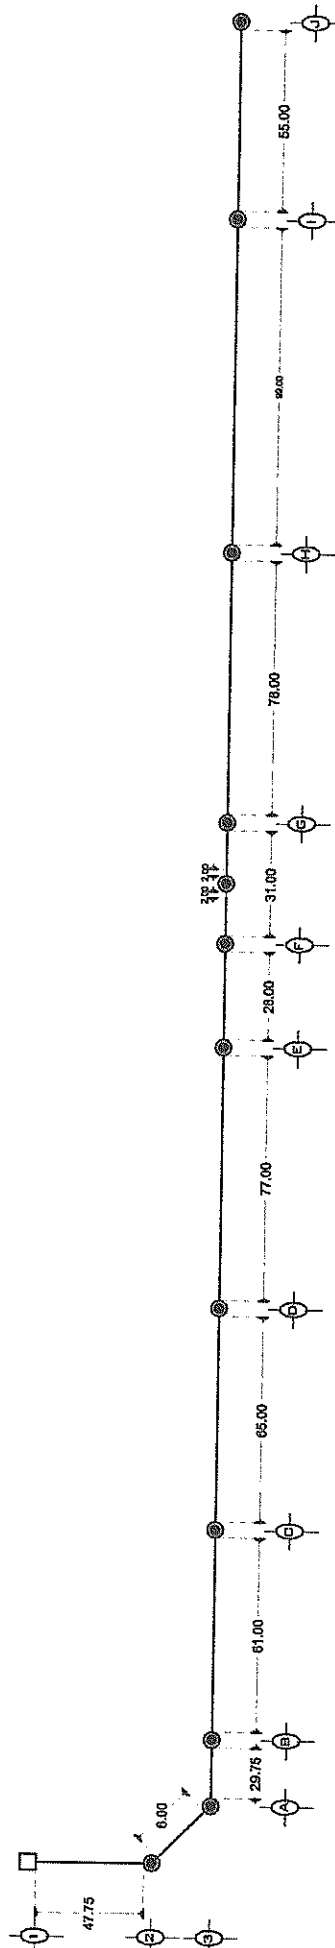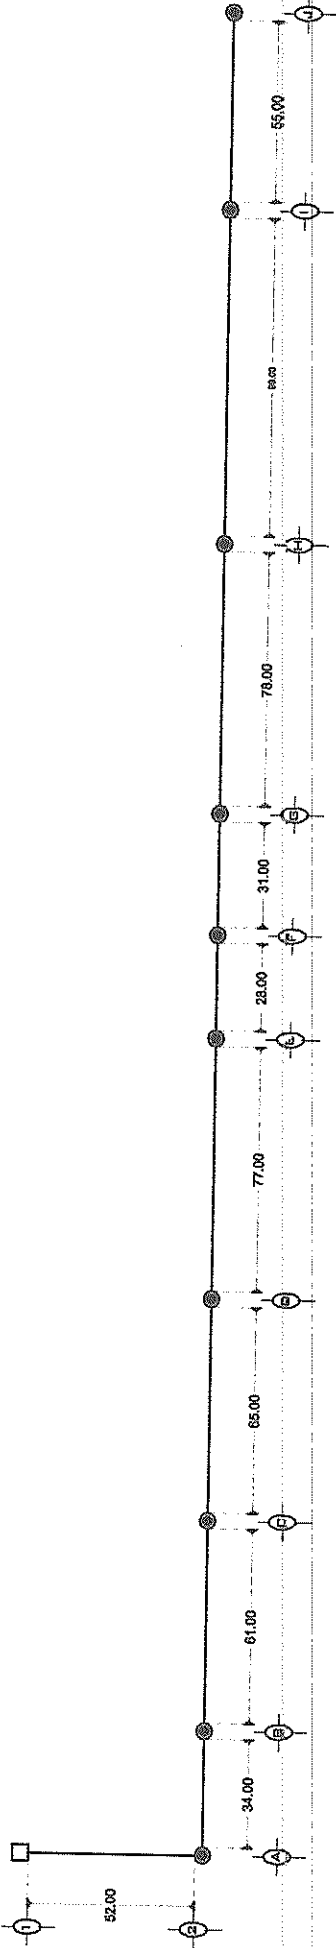

OBRA:

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021
 DESASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACIÓN:

CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD:

CUAUHTELULPAN

MUNICIPIO:

TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO:

CON-CEAT-008-21

PERIODO CONTRATO:

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO:

\$126,539.99

ESTIMACIÓN:

1 (UNO, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACIÓN:

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

CONCEPTO

DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR UTILIZANDO AGUA A PRESION, Y LIMPIEZA MANUAL DE POZOS DE VISITA EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.



[Handwritten signature]

INVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Handwritten signature]

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT

[Handwritten signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

CONTRATISTA

OBRA:

DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACIÓN:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

PERIODO CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO:

ESTIMACION:

PERIODO ESTIMACION:

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021

CALLE CAMINO LA LAGUNA

CUAUHTELULPAN

TLAXCALA, TLAX.

CON-CEAT-008-21

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021


\$126,539,99

1 (UNO, FINIQUITO)

DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

CONCEPTO

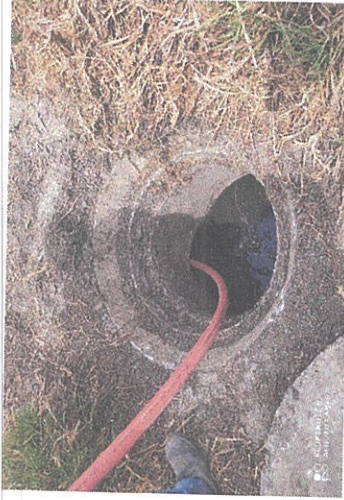

DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR UTILIZANDO AGUA A PRESION, Y LIMPIEZA MANUAL DE POZOS DE VISITA EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. OSCAR RAMOS AVILA

SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

CONTRATISTA

OBRA:

DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

CALLE CAMINO LA LAGUNA

CUAUHTELULPAN

TLAXCALA, TLAX.

CON-CEAT-008-21

PERIODO CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO: \$126,539.99

ESTIMACION: 1 (UNO, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO

DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VECTOR UTILIZANDO AGUA A PRESION, Y LIMPIEZA MANUAL DE POZOS DE VISITA EXISTENTES INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

IMZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. OSCAR RAMOS AVILA
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

ASUNTO: **RENUNCIA DE ANTICIPO**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA.

P R E S E N T E

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE EN RELACION A LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, RENUNCIO AL PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO COMO ANTICIPO (CLAUSULA QUINTA) .

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD: CUAUHELULPAN

MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO: CON-CEAT-008-21

MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99

PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAX A 06 DE ABRIL DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: CARTA DE INICIO DE OBRA

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 DOY INICIO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA
COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD: CUAUHTELULPAN

MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO: CON-CEAT-008-21

MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99


PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

POR LO TANTO, SOLICITO A USTED REALIZAR LA INSPECCION OCULAR A FIN DE DAR EL VO. BO. PARA EL COMIENZO DE LA OBRA Y CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE APERTURA DE BITACORA DE LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAX A 06 DE ABRIL DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 EL **ING. ARO. ANTONIO EDGAR MARAVILLA BRINDIS** ES ASIGNADO COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA
COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD: CUAUHTELULPAN

MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.


CONTRATO: CON-CEAT-008-21

MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99

PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE
NANACAMILPA, TLAX A 06 DE ABRIL DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: **CARTA DE TERMINO DE OBRA**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON
FECHA **15 DE ABRIL DE 2021** SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE
MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA
COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.

UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA

LOCALIDAD: CUAUHTELULPAN

MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.

CONTRATO: CON-CEAT-008-21

MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99

PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

POR LO TANTO, SOLICITO A USTED REALIZAR LA INSPECCION OCULAR A FIN DE DAR EL VISTO BUENO Y CUMPLIR
CON EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILFA, TLAX. A 15 DE ABRIL DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: **CARTA ENTREGA - RECEPCION**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA DEL **15 DE ABRIL DE 2021** SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA QUE SE MENCIONA ACONTINUACION Y UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO, DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION APROBADOS.

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA
COMUNIDAD DE CUAUHELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.
UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA
LOCALIDAD: CUAUHELULPAN
MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.
CONTRATO: CON-CEAT-008-21
MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99
PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

SIN OTRO PUNTO EN PARTICULAR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD Y CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.

NANACAMILPA, TLAX. A 15 DE ABRIL DE 2021

ENTREGA



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

RECIBE



Vo. Bo.

ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ASUNTO: **CARTA GARANTIA**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y MANIFESTARLE QUE EN REACION A LA OBRA QUE SE MENSIONA A CONTINUACION, OTORGO CARTA DE COMPROMISO POR EL EQUIVALENTE AL **10%** DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA A "LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA" PARA "**GARANTIZAR**" LO STRABAJOS POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA RELACION DE LOS MISMOS " VICIOS OCULTOS" POR UN TIEMPO DE 12 MESES, (UN AÑO) A PARTIR DE ESTA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA QUE SERA EFECTIVA SIEMPRE Y CUANDO LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES AMBIENTALES Y DE TRABAJOS NATURALES, SIN DAÑOS Y PERJUICIOS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA PERMANENCIA DE DICHS TRABAJOS.

OBRA: DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.
UBICACION: CALLE CAMINO LA LAGUNA
LOCALIDAD: CUAUHTELULPAN
MUNICIPIO: TLAXCALA, TLAX.
CONTRATO: CON-CEAT-008-21
MONTO DEL CONTRATO: \$126,539.99
PERIODO DE CONTRATO: DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE
NANACAMILPA, TLAX. A 15 DE ABRIL DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA


BITACORA DE OBRA


FECHA:	06-04-2021	NO.	
OBRA:	DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		
UBICACIÓN:	CALLE CAMINO LA LAGUNA		
LOCALIDAD:	CUAUHTELULPAN		
MUNICIPIO:	TLAXCALA, TLAX.		
CONTRATO:	CON-CEAT-008-21		
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021		

Con esta fecha informo a la CEAT Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala que se a-
perfora la presente bitacora de obra, donde
se harán las notas más relevantes de
la obra antes mencionada.

Para lo cual el ing. Oscar Ramos Avila en re-
presentación de la CEAT. será el supervisor
de obra y dará el Vo.Bo. a esta bitacora.

El Arq. Antonio F. Harauilla Brindis. estará a
cargo de la obra por parte del contratista
y también está autorizado para firma de esta
bitacora.


 Ing. Oscar Ramos Avila
 Supervisor CEAT.



 Arq. Antonio F. Harauilla.
 Residente Obra.


BITACORA DE OBRA

FECHA:	06-04-2021							NO.	
OBRA:	DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.								
UBICACIÓN:	CALLE CAMINO LA LAGUNA								
LOCALIDAD:	CUAUHTELULPAN								
MUNICIPIO:	TLAXCALA, TLAX.								
CONTRATO:	CON-CEAT-008-21								
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021								

Este día realizamos la limpieza de pozos de visita y red de drenaje sanitario en el tramo de 1-2 y de A-E de acuerdo al detalle de obra.

La limpieza se realiza de manera manual en los pozos de visita ya que tienen arenoso y la limpieza de tubería con equipo vacíol se realiza en tramos ya que se requiere ir limpiando los pozos de visita para realizar de manera correcta el trabajo y quede limpio en su totalidad para su buen funcionamiento.


 Ing. Oscar Ramos Avila
 Supervisor de Obra.



 Arg. Antonio Marañilla B.
 Residente de Obra.


BITACORA DE OBRA

FECHA:	10. Abril - 21	NO.	
OBRA:	DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.		
UBICACIÓN:	CALLE CAMINO LA LAGUNA		
LOCALIDAD:	CUAUHTELULPAN		
MUNICIPIO:	TLAXCALA, TLAX.		
CONTRATO:	CON-CEAT-008-21		
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021		

Este día se realiza la excavación a mano de la cepa donde se alojara el tubo de concreto tipo ecológico, Tramo donde se construirán los pozos de visita para evitar quebri a 90°.

También se prepara el tramo donde se construirá el tercer pozo de visita, en ese tramo se colocaran 4m de tubo.


 Ing. Oscar Ramos Avila
 Supervisor de Obra.



 Arg. Antonio Maravilla B.
 Residente de Obra.


BITACORA DE OBRA

FECHA:	14-04-2021					NO.
OBRA:	DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.					
UBICACIÓN:	CALLE CAMINO LA LAGUNA					
LOCALIDAD:	CUAUHTELULPAN					
MUNICIPIO:	TLAXCALA, TLAX.					
CONTRATO:	CON-CEAT-008-21					
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021					



Con esta fecha informo que se construyeron tres pozos de visita y se rehabilito uno demoliendo fatigues dañados, reconstruccion de muro y cambio de tapa y bicca.

Se realiza tambien el relleno y acosillado de tubo.


 Ing. Oscar Ramos Aulfo
 Supervisor de Obra.


 Arg. Antonio Harauilla B.
 Residente de Obra.

BITACORA DE OBRA

FECHA:	15. Abril. 2021									NO.	
OBRA:	DEZASOLVE DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTELULPAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAX.										
UBICACIÓN:	CALLE CAMINO LA LAGUNA										
LOCALIDAD:	CUAUHTELULPAN										
MUNICIPIO:	TLAXCALA, TLAX.										
CONTRATO:	CON-CEAT-008-21										
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 06 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021										
<p style="font-size: 1.2em;"> Esta fecha le informo a la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala que se han concluido los trabajos relacionados con esta obra; para lo cual solicito de la manera mas afien se realice la inspeccion. para de la misma y dar el Vo. Bo. de la misma para proceder con la entrega-recepcion de la misma. </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">  Ing. Oscar Ramos Aulá. Superior de Obra. </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">  Ing. Antonio Marañón B. Residente de Obra. </p> </div> </div>											
