

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Factura

RFC: [REDACTED] 1 [REDACTED]

Domicilio y Expedido en: [REDACTED] 2 [REDACTED]

Lugar de expedición: [REDACTED] 3 [REDACTED]

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

RFC: [REDACTED] 4 [REDACTED] Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] 5 [REDACTED]

Número de comprobante: A18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-08-05T11:30:40

Fecha de certificación del CFDI: 2021-08-05T11:33:46

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72103300	1	ACT - Actividad	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE LA ASCENSION HUITZCOLÓTEPEC, MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA. CONTRATO: CON-CEAT-022-21, PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021, IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00, ESTIMACION: 2 (DOS, FINQUITO) IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 23,827.71, PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021, DEDUCCIONES: (\$ 215.89) OFS 5.51 AL MILLAR \$ 102.71, C.E 5 AL MILLAR \$ 113.18, IMPORTE LIQUIDO A COBRAR: \$ 23,611.82	20,541.13	20,541.13

Subtotal	20,541.13
Descuento	
IVA (16) %	3,286.58

Total 23,827.71

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 M.N.

ELIMINANDO: 16 palabras, 1.- R.F.C., 2.- Domicilio Particular, 3.- Código postal, 4.- R.F.C., 5.-Folio fiscal. Fundamento legal por tratarse de información confidencial que contiene datos personales de conformidad en lo dispuesto en el artículo 99 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506249409

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

{}1.1|54A0A403-51F6-45FA-BADE-5B049A3A4F6D|2021-08-05T11:33:46|TSP@0724QW6|ZlVqD7JNq9lUbcAsiVEbblNLw4bqQA8|VLTfBmMCO662
l68EvG46tcPivBalgInSpmu8PwMmsi4xjdbRrdAF0ZG75ixUSoDX6AlroeWUmrngly8fYwH6cfCzQxEGM/LTrVMUGn/hpVDXe5L+ArazLzrLJ46Z4
vUuPSGjvR+YUUAU05pmdECHpcma9iCJSCfQLSnkZAaolNRqjLvsIOZICpW3zpO+fbd5UuQMxju6TEP+X9Q6PczD+fjLegSdDiej8r7NraWIANcx3hLiBmE
lRzR1CabdhqIEQ/Q+Ns3sXhoep7Qb6AhGwG60DStXo842nOMUwv07uA==|00001000000501960426|}



Sello Digital del Emisor:

ZlVqD7JNq9lUbcAsiVEbblNLw4bqQA8|VLTfBmMCO662l68EvG46tcPivBalgInSpmu8PwMmsi4xjdbRrdAF0ZG75ixUSoDX6AlroeWUmrngly8fYwH6cfCzQxEG
M/LTrVMUGn/hpVDXe5L+ArazLzrLJ46Z4vUuPSGjvR+YUUAU05pmdECHpcma9iCJSCfQLSnkZAaolNRqjLvsIOZICpW3zpO+fbd5UuQMxju6TEP+X9Q6PczD+fjLegS
dDiej8r7NraWIANcx3hLiBmE|lRzR1CabdhqIEQ/Q+Ns3sXhoep7Qb6AhGwG60DStXo842nOMUwv07uA==

Sello digital del SAT:

eQmN/DomgYgSly8rQLfCLpDVV/Awmnj597aUciE4Cdqv5LGA3LoFafEURpAFg3qll61UaFSD42DSbnpgUwwf6bltrNrG2nDyFqBBgVDeLKH5l7+lohufdd7yZgs
cC45b9JerzScgbUFcozP5gLtdj+7lAqHGWYj6c/tlIm8xhLaleu605HVFBAA0GsuqE+KuDoptOrripHz7EetQLPmcoVNzMMFDe5l2TQKuH3ru5d4JPYMV23PMKYjGAqc9im
akdyLav9ArcdUqH1SUI6c2f3lPtl6Q9F9ov1ZbW0eyjFYalsSGKJbr3sW0pm4VQcppSYUEn2lHxpSQ==

Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiera Aserta
 RFC: AIS970115HG4
 Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
 Col. Parque del Pedregal
 México 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 4301-24392-0
 Código de Seguridad: eyEgtzL
 Folio: 1402255
 Monto de la fianza: \$36,541.90
 Monto de este movimiento: \$36,541.90

POLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 2 de Agosto de 2021
 Movimiento: Emisión
 Fiado: CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Moneda: MXN
 Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.


A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR LA C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (N° CON-CEAT-C22-21, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2021, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$365,419.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RESPECTO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAX., CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021 AL DIA 29 DE JULIO DEL 2021, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION ASEGURADORA PROCEDERA A SU CANCELACION. C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA DEPENDENCIA LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS ASI MISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA


Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



MANUEL CARDENAS CAMPOS

Fianza Digital
 Serie Certificado: 00800100095900012781; Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban SA de CV
 U=H101EnjmsmIG555stf6J3UW7TZRlOnHucMaXrOmOobbuHJbKmWMTBTV2qb1V7RxeP4t41kNoYHFVMSraJQbPAJEPPym2aCdqVpCmlqgXandDDIRRXuXGGvWwWUjpuLIQ==

LÍNEA DE VALIDACIÓN
 I18G YWSB 21



CARATULA DE LA ESTIMACION

DEPENDENCIA: **COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA** FECHA: **29 DE JULIO DE 2021**
 ESTIMACION: **2 (DOS, FINIQUITO)**

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS**
 DOMICILIO: [REDACTED] 1 [REDACTED]
 C.P.: [REDACTED] 2 [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED] 3 [REDACTED]

DATOS DE LA OBRA

PERIODO DEL CONTRATO

OBRA: **REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**
 DESCRIPCION: **DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.**
 UBICACION: **LA ASCENSION HUITZCOLGTEPEC**
 MUNICIPIO: **XALTOCAN, TLAXCALA**

INICIO: **05 DE JULIO DE 2021**
 TERMINO: **29 DE JULIO DE 2021**

PERIODO DE LA ESTIMACION

DEL: **21 DE JULIO DE 2021**
 AL: **29 DE JULIO DE 2021**

PERIODO DEL CONTRATO MODIFICATORIO

DEL:
 AL:

CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO
CON-CEAT-022-21	\$365,419.00	\$0.00

BUENO POR: **\$23,827.71**
 RECIBI DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA LA CANTIDAD DE : **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.**
 EN PAGO DE LA ESTIMACION: **2 (DOS, FINIQUITO)**
 AMPARANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS AL : **29 DE JULIO DE 2021**

DEDUCCIONES

IMPORTE DE LA ESTIMACION

DEDUCCIONES	IMPORTE DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION DEL ANTICIPO :	IMPORTE EJECUTADO \$ 20,541.13
O.F.S. 5.51 AL MILLAR	IVA 16% \$ 3,286.58
C.E. 5 AL MILLAR	IMPORTE ESTIMACION DOS FINIQUITO \$ 23,827.71
	AMORTIZACION ANTICIPO \$ -
	IMPORTE TOTAL \$ 23,827.71
	5 AL MILLAR C.E. \$ 102.71
	5.51 AL MILLAR O.F.S. \$ 113.18
	TOTAL DEDUCCIONES \$ 215.89
TOTAL DEDUCCIONES:	SALDO LIQUIDO A COBRAR: \$ 23,611.82

ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ELIMINANDO: 11 palabras, 1.- Domicilio Particular, 2.- código postal, 3.- R.F.C. Fundamento legal por tratarse de información confidencial que contiene datos personales de conformidad en lo dispuesto en el artículo 99 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.



FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

OBRA:
DESCRIPCION:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACIÓN:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:
PERIODO CONTRATO:
ESTIMACIÓN:
PERIODO ESTIMACIÓN:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
XALTOCAN, TLAXCALA
CCN-CEAT-022-21
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
2 (DOS, FINIQUITO)
DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		\$	365,419.00
IMPORTE ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$	341,591.29	
IMPORTE ESTIMACIÓN No. 2 (DOS, FINIQUITO)	\$	23,827.71	
SALDO POR ESTIMAR	\$	0.00	
SUMAS IGUALES	\$	365,419.00	\$ 365,419.00

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO		\$	-
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$	-	
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

ELABORÓ

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDUARDO PÉREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA CEAT

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA:

29 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR, TODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUJERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

XALTOCAN, TLAXCALA

MUNICIPIO:

CON-CEAT-022-21

CONTRATO:

PERIODO CONTRATO:
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO:

\$365,419.00

ESTIMACION:

2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE		E-1		E-2		IMPORTE		ACUMULADO		VOLUMENES E IMPORTES		ESTIMACION		
		UNIDAD	CONTRATADO	UNIDAD	CONTRATADO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO																				
CEAT_0111	DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: APLILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO INTERIOR HASTA 30 MTS DE DISTANCIA, CARGA DE MATERIAL A MANO, ACARREO EN CAMION HASTA 1 KM. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	750.79	\$	95.50	\$	71,700.45	750.79	750.79	\$	71,700.45	0.00	0.00	\$	71,700.45	750.79	\$	71,700.66	0.00	\$0.00
CEAT_5003	BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR TODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA. INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	163.30	\$	827.90	\$	135,192.76	163.30	163.30	\$	135,192.76	0.00	0.00	\$	163.30	163.30	\$	135,192.76	0.00	\$0.00
CEAT_0114	RETIRO DE MALEZA DEL TERRENO DEL "SECADO" POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: RETIRO DE MATERIA QUE OBSTRUYE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA, RETIRO DE GRAVA (FILTRO) ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	1,678.50	\$	5,035.50	3.00	3.00	\$	5,035.50	0.00	0.00	\$	3.00	3.00	\$	5,035.50	0.00	\$0.00
CEAT_0706	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	11.82	\$	725.30	\$	8,573.05	11.82	11.82	\$	8,573.05	0.00	0.00	\$	11.82	11.82	\$	8,573.05	0.00	\$0.00

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

ELABORO

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



OBRA:

DESCRIPCIÓN

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRANA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACIÓN:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

XALTOCAN, TLAXCALA

MUNICIPIO:

CON-CEAT-022-21

CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO:

\$365,419.00

ESTIMACIÓN:

2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACIÓN:

DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:

29 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE CONTRATADO		VOLUMENES E IMPORTES		ELABORO										
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	E-1	IMPORTE	E-2	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE							
CEAT_0412	RETRO DE COMPUERTAS Y REJILLAS METALICAS EXISTENTES SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$	378.50	\$	1,892.50	5.00	\$	1,892.50	0.00	\$	-	\$	5.00	\$	1,892.50	0.00	\$	0.00
CEAT_1541	COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE CON PLACA DE ACERO DE 1/8" SECCION, 0.25 X 1.00 MTS. CON VASTAGO ESCOADO DE 3/4" Y VOLANTE DE REDONDO DE 1/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	3,878.30	\$	11,634.90	3.00	\$	11,634.90	0.00	\$	-	\$	3.00	\$	11,634.90	0.00	\$	0.00
CEAT_1542	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING PARA PRETRATAMIENTO DE 0.25 X 1.00, INCLUYE SOLERA DE CARGA DE 1" X 1/8" @ 3 CM DE SEPARACION, MARCO DE ANGULO DE 1", MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$	2,945.20	\$	5,890.40	2.00	\$	5,890.40	0.00	\$	-	\$	2.00	\$	5,890.40	0.00	\$	0.00
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	501.75	\$	95.00	\$	47,666.25	423.14	\$	40,198.57	78.61	\$	7,467.68	\$	501.75	\$	47,666.25	0.00	\$	0.00

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR/CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES BOMBEO DE AGUIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

XALTOCAN, TLAXCALA

MUNICIPIO:

CON-CEAT-022-21

CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

PERIODO CONTRATO:

\$365,419.00

IMPORTE DEL CONTRATO:

2 (DOS, FINIQUITO)

ESTIMACION:

DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO		VOLUMENES E IMPORTES			NOT EJECUTAR	IMPORTE	ACUMULADO	NOT EJECUTAR	IMPORTE							
		UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	C 1						IMPORTE	L-2	IMPORTE				
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR VINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	17.37	\$	95.00	\$1,650.15	0.00	\$	-	17.37	\$	1,650.15	17.37	\$	1,650.15	0.00	\$	0.00
CEAT_6166	REHABILITACION DE TANQUE DE FILTRACION INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA LIMPIA, CONEXION CON TUBO DE P.V.C DIAM. 6" DE SALIDA DEL TANQUE A VALVULA EXISTENTE PARA SALIDA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	14,357.13	\$14,357.13	1.00	\$	14,357.13	1.00	\$	-	1.00	\$	14,357.13	0.00	\$	0.00
CEAT_5305	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE DOS HOJAS DE 2.00 X 4.00 M. CAL. 12.5, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, POSTES EN DIFERENTES DIAMETROS, ELEMENTOS DE FIJACION, BASES DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	8,578.30	\$8,578.30	0.00	\$	-	1.00	\$	8,578.30	1.00	\$	8,578.30	0.00	\$	0.00

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

ELABORO

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES. BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA. LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
XALTOCAN, TLAXCALA
CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO:
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO:
\$385,419.00

ESTIMACION:
2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION:
DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO					VOLUMENES E IMPORTES				POR EJECUTAR	IMPORTE	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	E-1	IMPORTE	E-2	IMPORTE	ACUMULADO			
CEAT_6167	REHABILITACION DE EQUIPO DE CLORACION, INCLUYE: REHABILITACION DE TUBERIA, VALVULA DE PASO, PUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 2,845.00	\$2,845.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,845.00	1.00	\$ 2,845.00	0.00	\$0.00
		SUBTOTAL:			\$315,016.38		\$ 294,475.25		\$ 20,541.13		\$ 315,016.38		\$0.00
		16% I.V.A.:			\$50,402.62		\$ 47,116.04		\$ 3,286.58		\$ 50,402.62		\$0.00
		IMPORTE TOTAL:			\$365,419.00		\$ 341,591.29		\$ 23,827.71		\$ 365,419.00		\$0.00

ELABORÓ

[Firma]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

REVISO

[Firma]
ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

AUTORIZO

[Firma]

INVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO \$385,419.00
IMPORTE DE LA EST. 1 (JUNO) \$341,591.29
IMPORTE DE LA EST. 2 (DOS, FINIQUITO) \$ 23,827.71
IMPORTE POR ESTIMAR \$0.00
SUMAS IGUALES \$365,419.00



OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.
 LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
 CONTRATO: CON-CEAT-022-21
 PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$385,419.00
 ESTIMACION: 2 (DOS, FINIQUITO)
 PERIODO ESTIMACION: DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

NUMEROS GENERADORES

LOCALIZACION

CONCEPTO

GLAVE
 CEAT_6206

EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
A-I	3-4	M2	1.00	30.00	2.80		84.00		RAMPA
A-I	7-8	M2	1.00	30.00	2.65		79.50		RAMPA
B-I	8-9	M2	1.00	28.07	0.64		17.96		CORONA ENTRE RAMPAS
B-F	9-10	M2	1.00	13.23	1.48		19.58		RAMPA
E-F	9-15	M2	1.00	8.07	1.28		10.33		RAMPA
C-E	11-14	M2	1.00	AREA	67.26		61.02		MENOS AREA DE TAPAS = 6.24 (FOSA)
D-E	5-6	M2	3.00	11.00		0.50	16.50		(11.00 M PERIMETRO EXTERIOR) LSECADO
D-E	5-6	M2	3.00	9.96		1.54	46.02		(9.96 M PERIMETRO INTERIOR) LSECADO
B-C	11-14	M2	1.00	8.44		1.17	9.87		(8.44 M PERIMETRO EXTERIOR) FILTRO
B-C	11-14	M2	1.00	7.68		2.50	19.20		(7.68 M PERIMETRO INTERIOR) FILTRO
B-E	9-10	M2	4.00	AREA	2.70		10.80		REGISTROS DE OPERACION DE VALV.
B-E	9-10	M2	4.00	AREA	1.15		4.60		TAPAS DE REGISTRO
C-E	11-14	M2	1.00	37.40		1.17	43.76		(37.40 M PERIMETRO EXTERIOR) FOSA
							ESTIMACION 1 (UNO)	423.14	
B-F	9-10	M2	1.00	13.23	0.15		1.98		PERALTE DE GUARNICION
E-F	9-15	M2	1.00	8.07	0.35		2.82		CORONA Y PERALTE DE GUARNICION
B-E	9-10	M2	4.00	1.10	0.15		0.68		REGISTROS DE OPERACION DE VALV.
B	10-15	M2	1.00	6.50	0.35		2.28		GUARNICION
15	B-E	M2	1.00	17.50	0.35		6.13		GUARNICION
F-H	12-13	M2	1.00	10.00		1.00	10.00		MURO INTERIOR PRETRATAMIENTO
F-H	12-13	M2	1.00	16.18		1.11	17.96		(16.18 M PERIMETRO EXTERIOR) PRETRAT.
F-H	12-13	M2	1.00	14.90		1.20	17.88		(14.90 M PERIMETRO INTERIOR) PRETRAT.
H-I	12-13	M2	4.00	1.11		0.91	4.04		CAJA DE DEMACIAS EXTERIOR
H-I	12-13	M2	4.00	0.85		0.76	2.58		CAJA DE DEMACIAS INTERIOR
F-I	9	M2	1.00	9.50		0.44	4.18		BASE PRETRATAMIENTO
F	9-15	M2	1.00	8.00		0.44	3.52		BASE PRETRATAMIENTO
							ESTIMACION 1 (UNO)	17.60	
							POSTES	91.63	

[Handwritten signature]



OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION: DESARROLLE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA FOR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOS DOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: XALTOCAN, TLAXCALA

MUNICIPIO: CON-CEAT-022-21

CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO: \$385,419.00

ESTIMACION: 2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION				NUMEROS GENERADORES					
		EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
						ESTIMACION 2 (DOS, FINIQUITO)			78.61		
								SE ESTIMA EN TOTAL	TOTAL	501.75	
									TOTAL	514.76	

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTARLOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER, DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACIÓN: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021


IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00

ESTIMACION: 2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

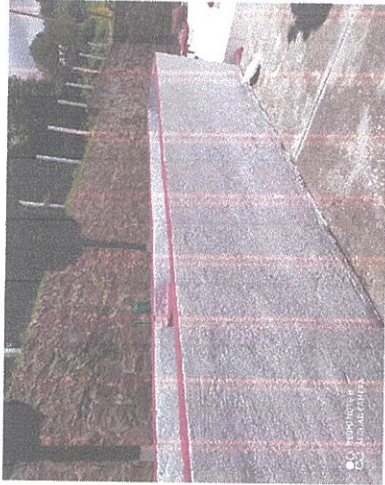

CONCEPTO

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR VINO MARCA COMEX O SIMILAR, APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

[Signature]

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

CONTRATISTA

FECHA: 29 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESOLIVAR Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTARLOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 XALTOCAN, TLAXCALA
 CON-CEAT-022-21

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 \$365,419.00

2 (DOS, FINIQUITO)

DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

OBRA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:


CONTRATO:

PERIODO CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO:

ESTIMACION:


PERIODO ESTIMACION:

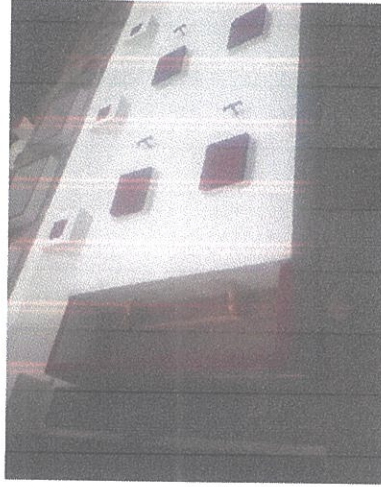

REPORTE FOTOGRAFICO

CONCEPTO

REHABILITACION DE TANQUE DE FILTRACION INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA LIMPIA, CONEXION CON TUBO DE P.V.C. DIAM. 6" DE SALIDA DEL TANQUE A VALVULA EXISTENTE PARA SALIDA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

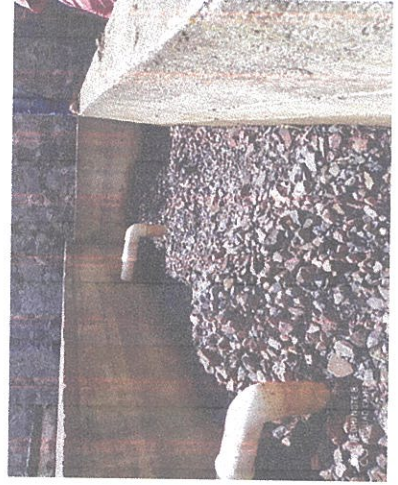

[Signature]

INVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]
 ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT


[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA





OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
FECHA: 29 DE JULIO DE 2021
DESCRIPCION: DESAGUAVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES; BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOS DOS FIBRA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA BRVING Y COMPUESTA PARA FIBRATAMIENTO TIPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VERDEAZUL, COLOR BLANCO Y COLOR VISO
UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21
PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$363,419.00
ESTIMACION: 2 (DOS, FINIQUITO)
PERIODO ESTIMACION: DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021


DETALLE GENERAL

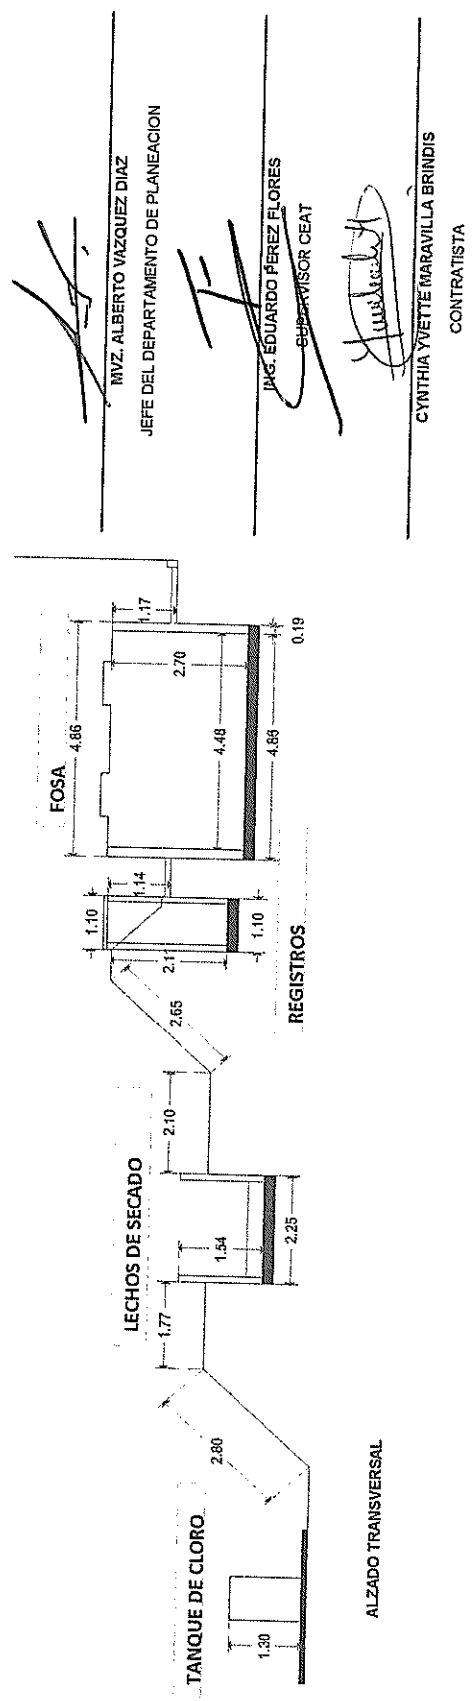

ALZADO TRANSVERSAL


 IMVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


 IMC EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT


 CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR, DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUO CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LOCALIDAD:
 MUNICIPIO:
 XALTOCAN, TLAXCALA

CON-CEAT-022-21
 DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 \$365,419.00
 2 (DOS, FINIQUITO)

PERIODO ESTIMACION:
 DEL 21 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

29 DE JULIO DE 2021

CALENDARIO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	JULIO							%	
			L	M	J	M	M	J	S		
CEAT_5211	RETIRO DE COMPUERTAS Y REJILLAS METALICAS EXISTENTES SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA									0.60%
CEAT_1506	COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE CON PLACA DE ACERO DE 1/8" SECCION 0.25 X 1.00 MTS. CON VASTAGO ROSCADO DE 3/4" Y VOLANTE DE REDONDO DE 1/2" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA									3.69%
CEAT_0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, PARA PRETRATAMIENTO DE 0.25 X 1.00, INCLUYE: SOLERA DE CARGA DE 1" X 1/8" @ 3 CM DE SEPARACION, MARCO DE ANGULO DE 1", MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA									1.87%
CEAT_0504	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2									15.13%

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLABRINDIS
 CONTRATISTA



ASUNTO: **CARTA DE TERMINO DE OBRA**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA **29 DE JULIO DE 2021** SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21
MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00
PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

POR LO TANTO, SOLICITO A USTED REALIZAR LA INSPECCION OCULAR A FIN DE DAR EL VISTO BUENO Y CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAX. A 29 DE JULIO DE 2021

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



ASUNTO: **CARTA ENTREGA - RECEPCION**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA DEL **29 DE JULIO DE 2021** SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA QUE SE MENCIONA ACONTINUACION Y UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO, DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION APROBADOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21
MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00
PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

SIN OTRO PUNTO EN PARTICULAR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD Y CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.

TLAXCO, TLAX. A 29 DE JULIO DE 2021

ENTREGA

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

RECIBE

Vo. Bó.

ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION



ASUNTO: **CARTA GARANTIA**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y MANIFESTARLE QUE EN REACION A LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, OTORGO CARTA DE COMPROMISO POR EL EQUIVALENTE AL **10%** DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA A "LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA" PARA "**GARANTIZAR**" LOS TRABAJOS POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA RELACION DE LOS MISMOS "VICIOS OCULTOS" POR UN TIEMPO DE 12 MESES, (UN AÑO) A PARTIR DE ESTA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA QUE SERA EFECTIVA SIEMPRE Y CUANDO LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES AMBIENTALES Y DE TRABAJOS NATURALES, SIN DAÑOS Y PERJUICIOS O MODIFICACIONES QUE ALTEREN LA PERMANENCIA DE DICHS TRABAJOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21
MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00
PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAX. A 29 DE JULIO DE 2021

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION: DESAZOLAR Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO: CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:	NO.
22-Julio-2021	6
Con esta fecha informo que se continua con la aplicacion de pintura vinilica. Blanco y color vino ademas de elaborar y fabricar las compuertas y rejillas del pretratamiento.	
Ing. Eduardo Perez Flores Supervisor	Arg. Antonio Maravilla Residente

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:



CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE GONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:	NO.
26. Julio - 2021.	(7)
Con esta fecha en forma que se esta rehabilitando el filtro (tanque) se realizo una adecuacion con el tubo de PVC para el buen funcionamiento de la planta. se realiza tambien el cambio de los grillos.	
 Ing. Fernando Perez Flores Supervisor	 Ing. Antonio Hernandez

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLPE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOSOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA, IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:

CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:		NO.
28 Julio 2021		(8)
<p>Con esta fecha informo que se realiza la limpieza final de la planta y con este trabajo concluimos los trabajos relacionados con esta obra. Junto de la manera mas pronta se realiza la inspeccion-evaluacion para dar al V.O. Bro. de la misma.</p>		
<p>Ingeniero Eduardo Perez Flores Supervisor.</p>		<p>Residente Antonio Maravillas</p>

Tlaxcala, Tlax., julio 26 de 2021.


ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
PERSONA FISICA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionado con las misma y con base al contrato **CON- CEAT-022-21**, Obra "REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE LA ASCENSIÓN HUITZCOLOTEPEC DE MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAX.," deberá presentar el finiquito correspondiente en las oficinas de la Comisión estatal de Agua de Tlaxcala para su revisión, tramite y cierre administrativo en un plazo de 10 días hábiles a partir de esta fecha.


Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA DE TLAXCALA**



MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

**SUPERVISOR DE OBRA DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA**



ING. EDUARDO PEREZ FLORES

C.c.p.- Archivo.

Recibi Documentos
26 Julio 2021
Cynthia Yvette Maravilla Brindis 
