

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Factura

Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: ■ 3 ■

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

RFC: ■■■■■ 4 ■■■■■ Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: ,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ■■■■■ 5 ■■■■■

Número de comprobante: A17

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-07-21T15:47:24

Fecha de certificación del CFD: 2021-07-21T15:52:13

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFD: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
72103300	1	ACT - Actividad	RE-HABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE LA ACENSION HUITZCOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAXCALA. CONTRATO: CON-CEAT-022-21, PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021, IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00, ESTIMACION: 1 (UNO) IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 341,591.29, PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021, DEDUCCIONES: (\$ 3094.94) OFS 5.51 AL MILLAR \$ 1,622.56, C.E 5 AL MILLAR \$ 1,472.38, IMPORTE LIQUIDO A COBRAR: \$ 338,496.35	294,475.25	294,475.25

Subtotal 294,475.25

Descuento

IVA (16) % 47,116.04

Total 341,591.29

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.

ELIMINANDO: 16 palabras, 1.-R.F.C., 2.- Domicilio Particular, 3.-Código postal, 4.- R.F.C., 5.- Folio fiscal. Fundamento legal por tratarse de información confidencial que contiene datos personales de conformidad en lo dispuesto en el artículo 99 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Emiso por: **FACTUR@**
Agua de Mexico S.A. de C.V.


"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000506249409

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|41599CF8-6ACE-48FA-9133-0480A5BEE72B|2021-07-21T15:52:13|TSPD90724QW6|E9nC5zq+uOonJb7ZLh8K+rx/X1v5sW0A8yGEOcNPongZ
vPuQpsYrk+uECqjJj8brwyHaM1|80BJC|Dye0QW6ARCo+u9b8CvKfXMDG4bjmDDOuCMZeamJmcmsS3zNI0Hx2DvKa+K5mVL2abi+|CB4DS19o+veedUM
OIFIKTO9auXhEvCFh+i04j|C|U|50|E|X|R|d|6|Y|E+5c1UBzj|0.61P|U|q|Hg|YY6x|J|Ob|J27x|M|O|J|V|S|I|J|H|D|D|O|S|R|J|O|N|e|F|O|p|N|c|H|D|P|6|J|G|a|Z|K|s|d|J|q|F|U|X|U
BzWYan7CLDB0or2B3mXKM2H6CHJzJe24drPN7sh9BibhZfMnxGYaW2KQ==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

E9nC5zq+uOonJb7ZLh8K+rx/X1v5sW0A8yGEOcNPongZvPu0psYrk+uECqjJj8brwyHaM1|80BJC|Dye0QW6ARCo+u9b8CvKfXMDG4bjmDDOuCMZeamJmcmsS3zNI0
DvKa+K5mVL2abi+|CB4DS19o+veedUMOIFIKTO9auXhEvCFh+i04j|O|F|50|E|X|R|d|6|Y|E+5c1UBzj|0.61P|U|q|Hg|YY6x|J|Ob|J27x|M|O|J|V|S|I|J|H|D|D|O|S|R|J|O|N|e|F|O|p|N|c|H|D|P|6|J|G|a|Z|K|s|d|J|q|F|U|X|U
pnNchOP6JG2KasdJtqFUXuBzWYan7CLDB0or2B3mXKM2H6CHJzJe24drPN7sh9BibhZfMnxGYaW2KQ==

Sello digital del SAT:

UQbAep0QgUkF0+I|ILuV688BQ0+M0UjryRDbC0SNe7ITsN3qInWmSR+si2C8sCOXbRyohPjaUaFMHa4/EI79KnrYqoYcXFaYD63nQjm0VgZINrRmRA1m
AbUJc3vFVW3ib8W6QndBgWVWKPj|a|e|29Q34n759K6RxCe65dVj3i7mtoXWZadKkGQMMWp27fjfdEVUMIlgUhdcsJp5mCGIILM11T6S4JsIKS2S0TUWGF3+Sz9LOX
y93YpPrQ3hieVz6YIEcW1VmqQta|ANr8hsl5a3o5zH3cHrRGUMDZWWVqTtE9eVqTtERUa|XCPrea/CA==





Insurgentes
SEGUROS Y FIANZAS

Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Alcaldía Tlalpa, Ciudad de México
Teléfono: (55) 54-7-3900

Fianza Número:	4301-24303-0
Código de Seguridad:	dgct/4b
Folio:	1400353
Monto de la fianza:	\$36,541.90
Monto de este movimiento:	\$36,541.90

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 5 de Julio de 2021

Moneda: MXN

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Fiado: CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.


A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR LA C. CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° CON-CEAT-022-21, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2021, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$366,418.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., RESPECTO A LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC, MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAX., CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021 AL DIA 29 DE JULIO DEL 2021, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B) EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD, D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ENTIDAD, E) LA INSTITUCION ASEGURADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la Fianza Electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 80 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".




MANUEL CARDENAS CAMPOS

LÍNEA DE VALIDACIÓN
I18E-NIQ3 21

E/R XXVI-VII-MMXXI V.1

Firma Digital: WIRY010MawCfKga0D6pRKRIRReoG1amsRt0576RZgmymy197RC0PEADzizCWWF5eHXB7L0MZmluph52SLK6TUG7D76SV0CPW41X0R7JKN18-32-21W1HVE152P0E57Y0MAUd1Lg02cHBM000UNY1Tmm7adN7P77771E1VPC-Parm1xkEhV3U3hWj4NgL1Aaa7BhZmEzBako1ncS-8J7m7Vlyw1Dc3d71kww6401F9561V-Ucs3wcd2Du481Dxq7VdDmNkMkU2L1MkR8aH0TeocakK1mmCq15Q==



CARATULA DE LA ESTIMACION

DEPENDENCIA: **COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA** FECHA: **21 DE JULIO DE 2021**
 ESTIMACION: **1 (UNO)**

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS**
 DOMICILIO: **[REDACTED]**
 C.P.: **[REDACTED]** R.F.C.: **[REDACTED]**

DATOS DE LA OBRA

PERIODO DEL CONTRATO

OBRA: **REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

INICIO: **05 DE JULIO DE 2021**
 TERMINO: **29 DE JULIO DE 2021**

DESCRIPCION: **DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.**

PERIODO DE LA ESTIMACION

UBICACION: **LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC**

DEL: **05 DE JULIO DE 2021**

MUNICIPIO: **XALTOCAN, TLAXCALA**

AL: **20 DE JULIO DE 2021**

PERIODO DEL CONTRATO MODIFICATORIO

CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO
CON-CEAT-022-21	\$365,419.00	\$0.00

DEL:
AL:

BUENO POR: **\$341,591.29**

RECIBI DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA LA CANTIDAD DE : **TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.**

EN PAGO DE LA ESTIMACION: **1 (UNO)**

AMPARANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS AL : **20 DE JULIO DE 2021**

DEDUCCIONES

IMPORTE DE LA ESTIMACION

AMORTIZACION DEL ANTICIPO :		\$ -	IMPORTE EJECUTADO	\$ 294,475.25
O.F.S. 5.51 AL MILLAR		\$ 1,622.56	IVA 16%	\$ 47,116.04
C.E. 5 AL MILLAR		\$ 1,472.38	IMPORTE ESTIMACION UNO	\$ 341,591.29
			AMORTIZACION ANTICIPO	\$ -
			IMPORTE TOTAL	\$ 341,591.29
			5 AL MILLAR C.E.	\$ 1,472.38
			5.51 AL MILLAR O.F.S.	\$ 1,622.56
			TOTAL DEDUCCIONES	\$ 3,094.94
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 3,094.94	SALDO LIQUIDO A COBRAR:	\$ 338,496.35

ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

OBRA:
DESCRIPCION:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:

CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION:

1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO			\$365,419.00
IMPORTE ESTIMACION No. 1 (UNO)	\$341,591.29		
SALDO POR ESTIMAR	\$23,827.71		
SUMAS IGUALES	\$ 365,419.00	\$	365,419.00

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO		\$	-
AMORTIZACION ESTIMACION 1 (UNO)	\$ -		
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ -	\$	-

ELABORÓ

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA CEAT

AUTORIZO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

XALTOCANI, TLAXCALA

CON-CEAT-022-21

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

\$365,419.00

1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE CONTRATADO		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	E-1	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE
			CONTRATADO	IMPORTE								
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO												
CEAT_0111	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, ACARREO INTERIOR HASTA 30 MTS DE DISTANCIA, CARGA DE MATERIAL A MANO, ACARREO EN CAMION HASTA 1 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	750.79	\$ 95.50	\$ 71,700.45	750.79	\$ 71,700.45	750.79	\$ 71,700.66	0.00	\$ 0.00	
CEAT_5003	BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	163.30	\$ 827.90	\$ 135,192.76	163.30	\$ 135,192.76	163.30	\$ 135,192.76	0.00	\$ 0.00	
CEAT_0114	LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIA QUE OBSTRUYE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA, RETIRO DE GRAVA (FILTRO) ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 1,678.50	\$ 5,035.50	3.00	\$ 5,035.50	3.00	\$ 5,035.50	0.00	\$ 0.00	
CEAT_0706	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO Y PASILLOS, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	11.82	\$ 725.30	\$ 8,573.05	11.82	\$ 8,573.05	11.82	\$ 8,573.05	0.00	\$ 0.00	

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING-EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

XALTIJACAN, TLAXCALA

CON-CEAT-022-21

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

\$365,419.00

1 (UNO)

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE CONTRATADO			E-1	IMPORTE	VOLUMENES E IMPORTES			
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE
CEAT_0412	RETIRO DE COMPUERTAS Y REJILLAS METALICAS EXISTENTES SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 378.50	\$ 1,892.50	5.00	\$ 1,892.50	5.00	\$ 1,892.50	0.00	\$ 0.00
CEAT_1541	COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE CON PLACA DE ACERO DE 1/8" SECCION 0.25 X 1.00 MTS. CON VASTAGO ROSCADO DE 3/4" Y VOLANTE DE REDONDO DE 1/2". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 3,878.30	\$ 11,634.90	3.00	\$ 11,634.90	3.00	\$ 11,634.90	0.00	\$ 0.00
CEAT_1542	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING PARA PRETRATAMIENTO DE 0.25 X 1.00, INCLUYE: SOLERA DE CARGA DE 1" X 1/8" @ 3 CM DE SEPARACION, MARCO DE ANGULO DE 1", MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 2,945.20	\$ 5,890.40	2.00	\$ 5,890.40	2.00	\$ 5,890.40	0.00	\$ 0.00
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON ROJILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	501.75	\$ 95.00	\$ 47,666.25	423.14	\$ 40,198.57	423.14	\$ 40,198.57	78.61	\$ 7,467.68

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

MVZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.
 UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LOCALIDAD: XALTOCAN, TLAXCALA
 MUNICIPIO: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 CONTRATO: CON-CEAT-022-21
 PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
 ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE CONTRATADO			E-1	IMPORTE	VOLUMENES E IMPORTE			
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR VINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	17.37	\$ 95.00	\$ 1,650.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.37	\$ 1,650.15
CEAT_6166	REHABILITACION DE TANQUE DE FILTRACION INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA LIMPIA, CONEXION CON TUBO DE P.V.C. DIAM. 6" DE SALIDA DEL TANQUE A VALVULA EXISTENTE PARA SALIDA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 14,357.13	\$ 14,357.13	1.00	\$ 14,357.13	1.00	\$ 14,357.13	0.00	\$ 0.00
CEAT_5305	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE DOS HOJAS DE 2.00 X 4.00 M. CAL. 12.5, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, POSTES EN DIFERENTES DIAMETROS, ELEMENTOS DE FIJACION, BASES DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIAL HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 8,578.30	\$ 8,578.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,578.30

AUTORIZO

IMZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

REVISO

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR-CEAT

ELABORO

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
XALTOCAN, TLAXCALA

CON-CEAT-022-21
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

IMPORTE DEL CONTRATO:
\$365,419.00
1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO			VOLUMENES E IMPORTES				
		UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE	POR EJECUTAR	IMPORTE
CEAT_6167	REHABILITACION DE EQUIPO DE CLORACION; INCLUYE: REHABILITACION DE TUBERIA, VALVULA DE PASO, PUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION/ P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 2,845.00	\$2,845.00	0.00	\$ -	1.00	\$2,845.00
SUBTOTAL:					\$315,016.38		\$ 294,475.25		\$294,475.25
16% I.V.A.:					\$50,402.62		\$47,116.04		\$47,116.04
IMPORTE TOTAL:					\$365,419.00		\$341,591.29		\$341,591.29

ELABORÓ

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR CEAT

AUTORIZO

IMZ ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO	\$341,591.29
IMPORTE DE LA EST. 1 (UNO, FINIQUITO)	\$23,827.71
IMPORTE POR ESTIMAR	\$365,419.00
SUMAS IGUALES	\$365,419.00



ARQUITECTURA
DISEÑO
PROYECTOS
INGENIERIA

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOSOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.
UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21
PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
ESTIMACION: 1 (UNO)

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021
PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021


NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
CEAT_1542	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, PARA PRETRATAMIENTO DE 0.50 X 1.20, INCLUYE: SOLERA DE CARGA DE 1" X 1/8" @ 3 CM DE SEPARACION, MARCO DE ANGULO DE 1", MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	F-H	12-13	PZA	2.00					2.00	
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	A-I	3-4	M2	1.00	30.00	2.80		84.00		
		A-J	7-8	M2	1.00	30.00	2.65		79.50		
		B-I	8-9	M2	1.00	28.07	0.64		17.96		
		B-F	9-10	M2	1.00	13.23	1.48		19.58		
		E-F	9-15	M2	1.00	8.07	1.28		10.33		
		C-E	11-14	M2	1.00	AREA	67.26		61.02		
		D-E	5-6	M2	3.00	11.00		0.50	16.50		
		D-E	5-6	M2	3.00	9.96		1.54	46.02		
		B-C	11-14	M2	1.00	8.44		1.17	9.87		
		B-C	11-14	M2	1.00	7.68		2.50	19.20		
		B-E	9-10	M2	4.00	AREA	2.70		10.80		
		B-E	9-10	M2	4.00	AREA	1.15		4.60		
		C-E	11-14	M2	1.00	37.40		1.17	43.76		
										423.14	

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR-CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



ARQUITECTURA
DISEÑO
PROYECTOS
INGENIERIA

FECHA:
21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA
TRANSPORTAR TODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
REJILLA IRVING Y CUBIERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.
LA ASCENSION IUITZCOLOTEPEC
XALTOCAN, TLAXCALA
CON-CEAT-022-21
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
\$965,419.00
1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:
DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021


NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
CEAT_6206	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR VINO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.											
CEAT_6166	REHABILITACION DE TANQUE DE FILTRACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA LIMPIA, CONEXION CON TUBO DE P.V.C. DIAM. 6" DE SALIDA DEL TANQUE A VALVULA EXISTENTE PARA SALIDA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.		B-C	11-14	PZA	1.00				1.00		
CEAT_5305	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE DOS HOJAS DE 2.00 X 4.00 M. CAL 12.5, INCLUYE RETIRO DE PUERTA EXISTENTE, POSTES EN DIFERENTES DIAMETROS, ELEMENTOS DE FIJACION, BASES DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.										1.00	

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR-CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



21 DE JULIO DE 2021

FECHA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOS CANGOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

XALTOCAN, TLAXCALA

CON-CEAT-023-21

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 28 DE JULIO DE 2021

\$385,419.00

1 (UNO)

OBRA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

PERIODO CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO:

ESTIMACION:


PERIODO ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION										NUMEROS GENERADORES				
		EJE	TRAMO	UNIDAD	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	SUB-TOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES					
CEAT_6167	REHABILITACION DE EQUIPO DE CLORACION, INCLUYE: REHABILITACION DE TUBERIA, VALVULA DE PASO, PUERTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL.															

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
SUPERVISOR-CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA



ARQUITECTURA
DISEÑO
PROYECTOS
INGENIERIA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


DESARROLLO Y LIMPieza DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOROS FIERRA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA, INTING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER, DESHIDRATACION Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
XALTOCAN, TLAXCALA
CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

DETALLE GENERAL DE LA OBRA

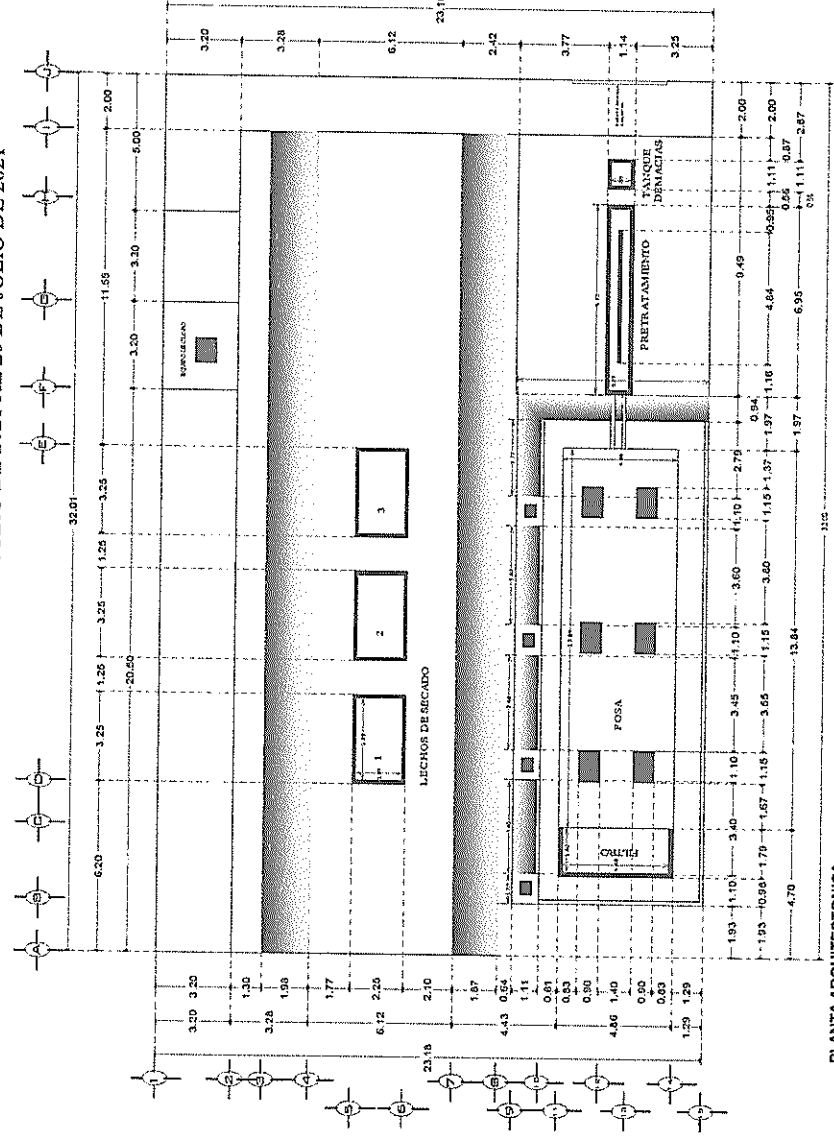


PLANTA ARQUITECTONICA

[Signature]
ING. ALBERTO VAQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]
ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]
CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



ARQUITECTURA
DISEÑO
PROYECTOS
INGENIERIA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

OBRA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

PERIODO CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO:

ESTIMACION:

PERIODO ESTIMACION:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLAR Y LINDREAR DE MANERA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA. LA OBRA DEBE SER REALIZADA EN UN LUGAR DE SECADO, BOMBEO Y COLOCACION DE GRASA EN LECHOS DE SECADO, BOMBEO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y CONDUCCION PARA PRETRATAMIENTO TIPO MUJER DESLIZABLE, SUBMUESTRO Y APLICACION DE PINTURA VERDEGA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

XALTOCAN, TLAXCALA

CON-CEAT-022-21


DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021


\$365,419.00


1 (UNO)


DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

DETALLE GENERAL


 MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


 IAS. EDILBERTO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT


 CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

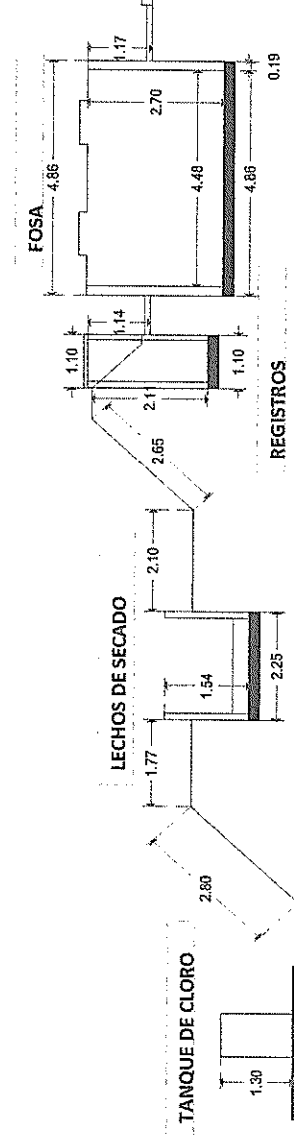

ALZADO TRANSVERSAL

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBRA:

DESCRIPCION: DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES INCLUYE ACARREO Y APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

[Signature]
 MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]
 ING. EDUARDO PEREZ ELGORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE AGRIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUESTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
 CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
 ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

CONCEPTO

BOMBEO DE AGRIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS, IMANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.



[Signature]
 MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]
 ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]
 CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y, COMPUESTA PARA PRETRATAMIENTO TPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO

LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIA QUE OBSTRUYE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA, RETIRO DE GRAVA (FILTRO) ACARREO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



[Signature]

INV. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES **FECHA:** 21 DE JULIO DE 2021




DESCRIPCION: DESAZOYE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIO MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR Lodos A FOSAS DE LA FOSA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y CUBIERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO

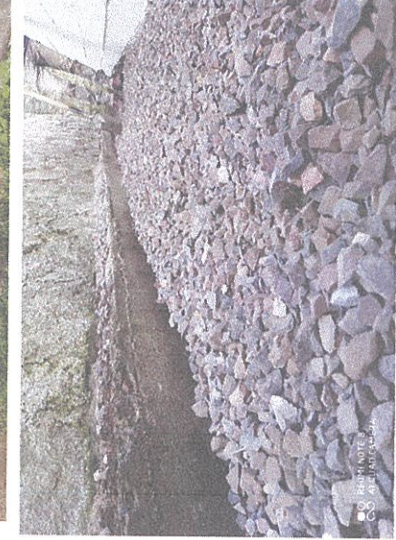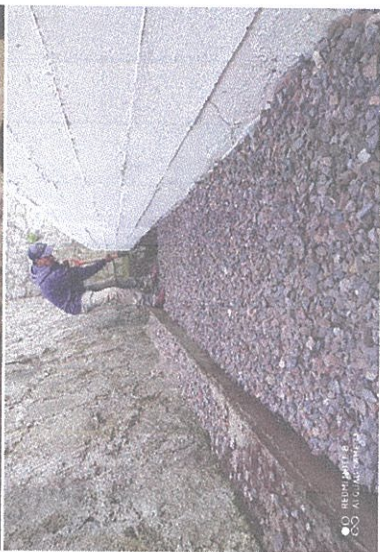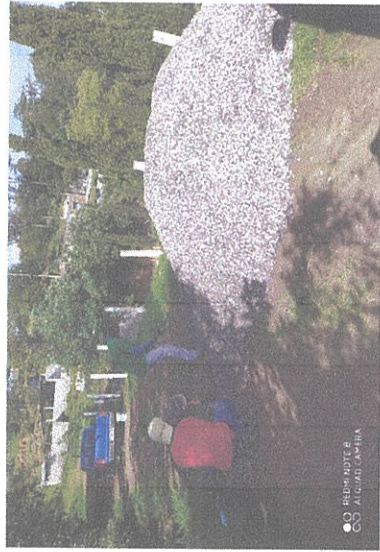

CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO Y PASILLOS, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

[Signature]
 INVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]
 ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOGA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTARLOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA, IRVINO Y COMPUESTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
 CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
 ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO

RETIRO DE COMPUERTAS Y REJILLAS METALICAS EXISTENTES SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA

FECHA: 21 DE JULIO DE 2021

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESAZOBE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LOS CILINDROS DE GAS. LIMPIEZA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAYA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUESTA PARA PRETRATAMIENTO TPO MILLER DESIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC
 MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA
 CONTRATO: CON-CEAT-022-21

PERIODO CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$365,419.00
 ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO ESTIMACION: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021

REPORTE FOTOGRAFICO



CONCEPTO

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.



[Signature]

INV. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

[Signature]

ING. EDUARDO PEREZ FLORES
 SUPERVISOR CEAT

[Signature]

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
 CONTRATISTA



ASUNTO: **CARTA DE INCIO DE OBRA**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA 05 DE JULIO DE 2021 DOY INICIO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO: CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

POR LO TANTO, SOLICITO A USTED REALIZAR LA INSPECCION OCULAR A FIN DE DAR EL VO. BO. PARA EL COMIENZO DE LA OBRA Y CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE APERTURA DE BITACORA DE LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAX A 05 DE JULIO DE 2021

CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA

LIC DAVID GUERRERO TAPIA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.

PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE CON FECHA 05 DE JULIO DE 2021 EL **ING. ARO. ANTONIO EDGAR MARAVILLA BRINDIS** ES ASIGNADO COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA MISMA.

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO: CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NANACAMILPA, TLAXA 05 DE JULIO DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

ASUNTO: **RENUNCIA DE ANTICIPO**

LIC DAVID GUERRERO TAPIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE
TLAXCALA.
PRESENTE

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO MANIFESTARLE QUE EN RELACION A LA OBRA QUE SE MENCIONA A CONTINUACION, RENUNCIO AL PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO COMO ANTICIPO (CLAUSULA QUINTA).

OBRA: REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION: DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD: LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO: XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO: CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO: \$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE
NANACAMILPA, TLAX A 05 DE JULIO DE 2021



CYNTHIA YVETTE MARAVILLA BRINDIS
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLEZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:

CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:


DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021


FECHA: 05-Julio-2021

NO.

①

Con esta fecha se realiza la apertura de la presente bitacora de obra donde se haran las anotaciones mas relevantes de la misma para lo cual el Ing. Eduardo Perez Flores sera el supervisor de la obra por parte de la comision estatal de agua de Tlaxcala y el ing. arq. Antonio Edgar Maravilla Brindis el residente de obra por parte del contratista.


Ing. Eduardo Perez Flores
Supervisor de obra.


Ing. Arq. Antonio Maravilla B.
Residente de obra

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESHIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:



CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:		NO.
05. Julio. 2021		2
<p>Con esta fecha damos inicio a los trabajos relacionados con la obra antes mencionada.</p>		
<p>Este día realizamos la limpieza y desahucio de tanques (pretratamiento, caja de elevación y tanque de claración.) limpieza de maleza en tanques, andadores y rampas de la P.T.A.R.</p>		
<p> Ing. Eduardo Pérez Flores. Supervisor de obra.</p>		<p> Arq. Antonio Marañón B. Residente obra.</p>

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESARROLLO Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:

CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:

08- Julio - 2021

NO.

3

Este día continuamos retirando maleza de cada una de las partes que conforman la planta de tratamiento, hago mención que sobre los tanques hay pasto, raíces de árboles etc. el material producto de la limpieza se está colocando fuera de la planta para posteriormente ser cargado y retirado fuera del lugar.

Ing. ~~Eduardo~~ Pérez Flores
Supervisor de obra

Ing. Antonio Marañón B.
Residente de obra.

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESMONTABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:



CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:	NO.
12 Julio 2021	(4)
Con esta fecha informo que se esta realizando el bombeo retirando agua y loscos del tanque (fosa con equipo mecanico tipo wactor, se extraen raices, se rehabilitan tapas del tanque).	
Ing  Eduardo Perez Flores Supervisor de obra.	 Arg Antonio Maravilla Residente de Obra.

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:



CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:	NO.
17. Julio. 2021.	5
<p>Este día esta en proceso la aplicacion de pintura vinilica en fanques, rampas, guarniciones etc. Es aplicada con rodillo y brocha a dos manos.</p>	
<p>- Tambien se realiza el tendido de grava en pasillos 10-15cm de espesor</p>	
<p>- Retiro de rejillas y compuertas existentes.</p>	
<p> Ing. Eduardo Perez Flores Supervisor de Obra</p>	<p> Arq. Antonio Paravilla B. Residente Obra</p>

BITACORA DE OBRA

OBRA:

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DESCRIPCION:

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA EN TERRENO INTERIOR DONDE SE ENCUENTRA LA FOSA POR MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE PARA TRANSPORTAR LODOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN LECHOS DE SECADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING Y COMPUERTA PARA PRETRATAMIENTO TIPO MILLER DESLIZABLE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y COLOR VINO.

UBICACION:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

LOCALIDAD:

LA ASCENSION HUITZCOLOTEPEC

MUNICIPIO:

XALTOCAN, TLAXCALA

CONTRATO:



CON-CEAT-022-21

MONTO DEL CONTRATO:

\$365,419.00

PERIODO DE CONTRATO:

DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 29 DE JULIO DE 2021

FECHA:		NO.
20 Julio 2021		6
<p>Con esta fecha se esta trabajando en la rehabilitacion del tanque de filtracion de agua, vaciandole para realizar el cambio de filtro, cambio de tuberia para que funcione correctamente se coloca un tuberia ligando el tanque con la valvula de compuerta. (registro no 1) con tubo de PVC RD-26 diam. 4" incluye conexiones.</p>		
<p> Ing. Eduardo Perez Flores Supervisor obra</p>		<p> Ing. Antonio Herravilla B. Residente de Obra</p>
