



GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA, S.A. DE C.V.
RFC: GAA030228CP7
Prolongacion 2 Norte S/N San Juan Negrete . Tepeaca Puebla CP 75200

FACTURA TIPO (I)

Folio
141
Folio Fiscal
A8886571-36EC-437E-AE6C-A8439FB97730
No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000507252153
No. de Serie del CSD del SAT
00001000000508341381
Fecha y hora de emisión
2022-06-02 13:03:58
Fecha y hora de certificación
2022-06-02 13:06:06
Lugar de Expedición
C.P. 75200

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
RFC: CEA091222BM2
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ZAHUAPAN SIN NUMERO SAN HIPOLITO CHIMALPA . TLAXCALA Tlaxcala CP 90112.
4622256 , México

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS
Clave SAT: 01010101 / Concepto: E1 - ESTIMACION No. 1 (UNO)						
1.00	E51 / Trabajo	55,825.78		55,825.78	8,932.12	64,757.90

ESTA FACTURA AMPARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO)
REFERENTE AL CONTRATO No: CON-CEAT-005-22
DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA. PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.
CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$1,193,337.17 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO.
PERIODO DE CONTRATADO: 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022
PERIODO DE ESTIMACION No. 1 (UNO): DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022
IMPORTE DE LA ESTIMACION No: 1(UNO) \$55,825.78
I.V.A. (16%) \$8,932.12
TOTAL: \$64,757.90
MENOS DEDUCCIONES
DEDUCCION 5 AL MILLAR (C.E.E.T) \$279.13
DEDUCCION 5.51 AL MILLAR DEL (O.F.S.) \$307.60
IMPORTE LIQUIDO A COBRAR: \$64,171.17

SubTotal	MXN 55,825.78
I.V.A. 16%	MXN 8,932.12
Total IVA	MXN 8,932.12
TOTAL	MXN 64,757.90

(SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

Dwy3+8JMPdQmWHHdsPIWMHc9YH/MWlaQ6nnRWC66Jc9jmFvKx8qpc9OEw8fpavbxyF16heTGW8lshI91FkOLZE0eicepWYiURy/wa5fqFoJmnOYnWt6v6+ccNXx1Pez9jKOqYOVQVx25/SJV9rZMzbNxaI5pRmiQG432BYWh9dWTbQQdYbDeCWJtNQFT5y+zTNKV29B4YvHraBWfj4vVeG3XFdA+jeOVQGBEtxfdt8znPxxvHwD4zUz6cXm+2dqUysKP64ly2uW6KWL0/GGcZW4657XEOPn vLiTAFF/erUWdhRB3bbkSki/Wxj8P/c4IOoYYf66XW5B5faq2pYVA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

agV02LqRu0qmL.Sy13TOr2WEzcKgXclmqx0AFBnfv27qt5I/DyGb+MV1w++WmetKT7j7kPpKbrQO+uW75oWm8KifV6FVH3CrcNon4MrtEc4m8BP1qer7Hq4nZS8NkYme0adrD/Ock8Pv+JcZnn6AsuSYm1P7fSkurUB+rYR4EgcscI06e9O9gT7cx4OSGqS76xeW6EbQMjPuv5+VdbskQnSbjPUhoCL02ZdX4O3huBml6G3zln9FJ/p3iIpgHlaYp6cxUEYOHDRPwXWdfxk4rRfUIWdj1fbkNzDsA+22fR6pT1e9gcE9By053dJXZBoTdN1h+eZEvbQmqIsVqCrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|141|2022-06-02T13:03:58|03|00001000000507252153|55825.78|MXN|64757.90||PUE|75200|GAA030228CP7|GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA, S.A. DE C.V.|601|CEA091222BM2|COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA||01|01010101|1|E51|Trabajo|E1 - ESTIMACION No. 1 (UNO)|55825.78|55825.78|55825.78|002|Tasa|0.160000|8932.12|002|Tasa|0.160000|8932.12|8932.12||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|A8886571-36EC-437E-AE6C-A8439FB97730|2022-06-02T13:06:06|CCF1011111K9|Dwy3+8JMPdQmWHHdsPIWMHc9YH/MWlaQ6nnRWC66Jc9jmFvKx8qpc9OEw8fpavbxyF16heTGW8lshI91FkOLZE0eicepWYiURy/wa5fqFoJmnOYnWt6v6+ccNXx1Pez9jKOqYOVQVx25/SJV9rZMzbNxaI5pRmiQG432BYWh9dWTbQQdYbDeCWJtNQFT5y+zTNKV29B4YvHraBWfj4vVeG3XFdA+jeOVQGBEtxfdt8znPxxvHwD4zUz6cXm+2dqUysKP64ly2uW6KWL0/GGcZW4657XEOPn vLiTAFF/erUWdhRB3bbkSki/Wxj8P/c4IOoYYf66XW5B5faq2pYVA==|00001000000508341381||

Uso del CFDI: Construcciones (I01)

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos (03)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

CARATULA DE ESTIMACION

				HOJA No.	01	E	01	
EST. No.	1 (UNO)	No. DE OBRA:	CON-CEAT-005-22	R.F.C.	GAA0302288CP7			
CONTRATO No. :	PERIODO DE CONTRATO:	MONTO DEL CONTRATO		ANTICIPO				
CON-CEAT-005-22	13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022	\$1,193,337.17		\$0.00				
PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION :		DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022						
FECHA DE ELABORACION :		27 DE MAYO DE 2022						
DESCRIPCION DE LA OBRA		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AV. PUEBLA.						
UBICACIÓN:		SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.						
EMPRESA:		GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.						
REPRESENTANTE:		ARQ. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ						
RECIBIMOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TLAXCALA LA CANTIDAD DE: (TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS 76/100 M. N.)					\$ 64,171.17			
CONCEPTO:		ESTIMACIÓN No.:			PERIODO			
PAGO DE LA ESTIMACIÓN No:		1 (UNO)	ESTIMACIÓN 1 (UNO)			DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022		
DEDUCCIONES:				CALCULO DE LA ESTIMACION:				
AMORTIZACION ANTICIPO (100%)		\$0.00		IMPORTE EJECUTADO		\$55,825.78		
C.E.E.T.		\$279.13		I.V.A.		\$8,932.12		
O.F.S		\$307.60		TOTAL		\$64,757.90		
TOTAL DEDUCCIONES		\$586.73		AMORTIZACION ANTICIPO (100%)		\$0.00		
				IMPORTE NETO A COBRAR		\$64,757.90		
				DEDUCCIONES		\$586.73		
				IMPORTE LIQUIDO A COBRAR		\$64,171.17		

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT

VO. BO.

LIC. ALEXANDRA GONZALEZ PIOQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION 1 (UNO)

DESCRIPCION DE LA OBRA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AV. PUEBLA.						
UBICACION:	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.						
EMPRESA:	GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.						
REPRESENTANTE:	ARQ. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ						
R.F.C.	GAA0302288CP7	EST. No. :	1 (UNO)	CONTRATO No. :	CON-CEAT-005-22	PERIODO DE CONTRATO:	13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022
MONTO DEL CONTRATO			\$1,193,337.17	FECHA DE ELABORACION :	11 DE MAYO DE 2022	PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION :	DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022
ANTICIPO			\$0.00			IMPORTE EJECUTADO ESTIMACION 1 (UNO)	\$55,825.78
SUBTOTAL DEL CONTRATO			\$1,028,738.94	DEDUCCIONES		IVA	\$8,932.12
IVA			\$164,598.23	C.E.E.T.	\$279.13	IMPORTE TOTAL ESTIMACION 1 (UNO)	\$64,757.90
TOTAL CONTRATADO			\$1,193,337.17	O.F.S	\$307.60	AMORTIZACION ANTICIPO (100%)	\$0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	\$5,103.13	IMPORTE NETO A COBRAR	\$64,757.90
SALDO TOTAL POR EJECUTAR			\$1,128,579.27			TOTAL DEDUCCIONES	\$5,103.13
ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$0.00			IMPORTE LIQUIDO A COBRAR	\$59,654.77

ELABORO

REVISO

VO.BO.

ARQ. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT

LIC. ALEJANDRA GONZALEZ PICOQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

PROLONGACION DE LA 2 NORTE S/N, COL. SAN JUAN NEGRETE, TEPEACA, PUEBLA, C.P 75200



GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN 1 (UNO)

OBRA: : REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.

No. DE CONTRATO:	PERIODO DEL CONTRATO:	FECHA DE ESTIMACIÓN:	PERIODO DE ESTIMACIÓN:
CON-CEAT-005-22	13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022	27 DE MAYO DE 2022	DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022
MONTO DEL CONTRATO		ANTICIPO	
\$1,193,337.17		\$0.00	

CLAVE	CONCEPTO	EST.	U. M	Cantidad ó Volumen	ESTA ESTIMACION	SALDO POR EIERCER	IMPORTE			ESTA ESTIMACION	SALDO POR EIERCER
							PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL		
	PRELIMINARES										
CEAT_0101	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MADERA PARA CRUCETAS, CAL PARA INDICACION DE ANCHOS, VARILLAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1	M2	\$1,238.40	1,238.40	\$0.00	\$ 13.64	\$7,513.42	\$16,891.78	\$16,891.78	\$0.00
CEAT_030 2	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1	M3	\$2,520.00	2,520.00	\$0.00	\$ 15.45	\$38,934.00	\$38,934.00	\$38,934.00	\$0.00
							IMPORTE EJECUTADO ESTIMACION 1 (UNO)				
										PRESUPUESTO	\$55,825.78
										IVA	\$8,932.12
										TOTAL	\$64,757.90

IMPORTE TOTAL POR PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) \$64,757.90

AMORTIZACIONES:

ANTICIPO (100%) \$0.00

TOTAL ESTIMACION \$64,757.90

ELABORO

ING. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT

YO, JR. B.
LIC. ALEJANDRA GONZALEZ QUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AV. PUEBLA.

No. DE CONTRATO:
CON-CEAT-005-22

PERIODO DEL CONTRATO:
13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE ESTIMACION:
27 DE MAYO DE 2022

PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	EST.	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO PROMEDIO	ALTO	PZA.	CANTIDAD		U.M.	OBSERVACIONES
			DE	A					PARCIAL	TOTAL		
	PRELIMINARES		INICIO	FIN								
CEAT_0101	TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MADERA PARA CRUCETAS, CAL PARA INDICACION DE ANCHOS, VARILLAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1	1	2	316.00	0.8			252.8			
			2	3	482.50	0.8			386			
			3	4	749.50	0.8			599.6			
					1548.00				1238.4	1238.40	M2	
CEAT_0302	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1	1	2	10.00				40.00			LAS PIEZAS SE BASAN SUMANDO UN CORTE POR CADA LADO DONDE SE UBICA LA ZANJA EN EL CONCRETO ACTUAL Y HACIENDO LO MISMO UNA VEZ COLOCADO EL CONCRETO NUEVO
			2	3	6.00				4			
			3	4	482.50				4	1930.00		
			4	5	4.50				4	18.00		
			5	6	7.20				4	28.80		
			7	8	6.00				4	24.00		
			8	9	113.80				4	455.20		
					630.00					2520.00	2520.00	ML

ELABORO

VO.BO.

REVISO

LIC. ALEJANDRA GONZALEZ PICOQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ARQ. MARCO ANTONIO PAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT




GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO)

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.

UBICACIÓN	No. DE CONTRATO:	PERIODO DEL CONTRATO:	FECHA DE ESTIMACION:	PERIODO DE ESTIMACION:
SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.	CON-CEAT-005-22	13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022	27 DE MAYO DE 2022	DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022

CEAT_0101 TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MADERA PARA CRUCETAS, CAL PARA INDICACION DE ANCHOS, VARILLAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

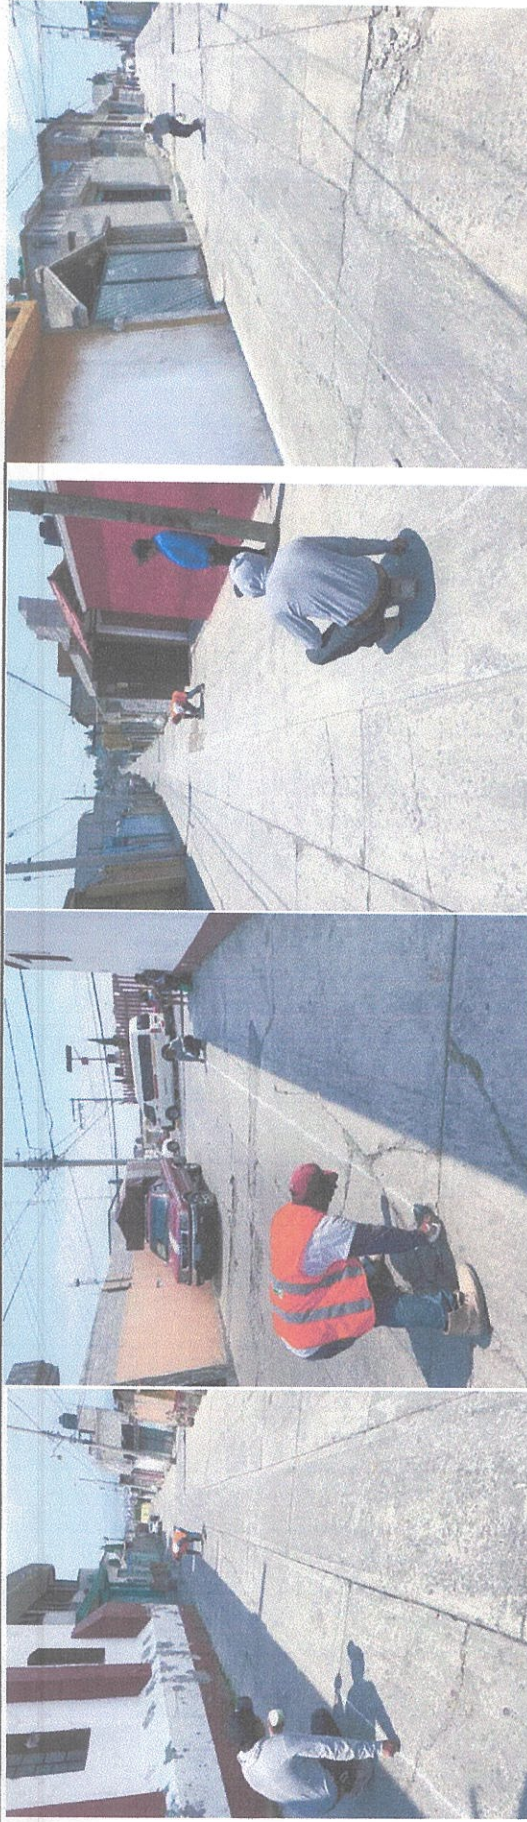

ELABORO


ARQ. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT

VOBO.


LIC. ALEJANDRA GONZALEZ PIQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

PROLONGACION DE LA 2 NORTE S/N, COL. SAN JUAN NEGRETE, TEPEACA, PUEBLA, C.P 75200



GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO)

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.


UBICACIÓN	No. DE CONTRATO:	PERIODO DEL CONTRATO:	FECHA DE ESTIMACION:	PERIODO DE ESTIMACION:
SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA.	CON-CEAT-005-22	13 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2022	27 DE MAYO DE 2022	DEL 13 DE MAYO AL 27 DE MAYO DE 2022
CEAT_0302	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.			
				
ELABORO				
REVISOR				
V. O.B.O.				

ING. MARCO ANTONIO BAEZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT

LIC. CESAR ORTIZ GONZALEZ PIQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


PROLONGACION DE LA 2 NORTE S/N, COL. SAN JUAN NEGRETE, TEPEACA, PUEBLA, C.P 75200

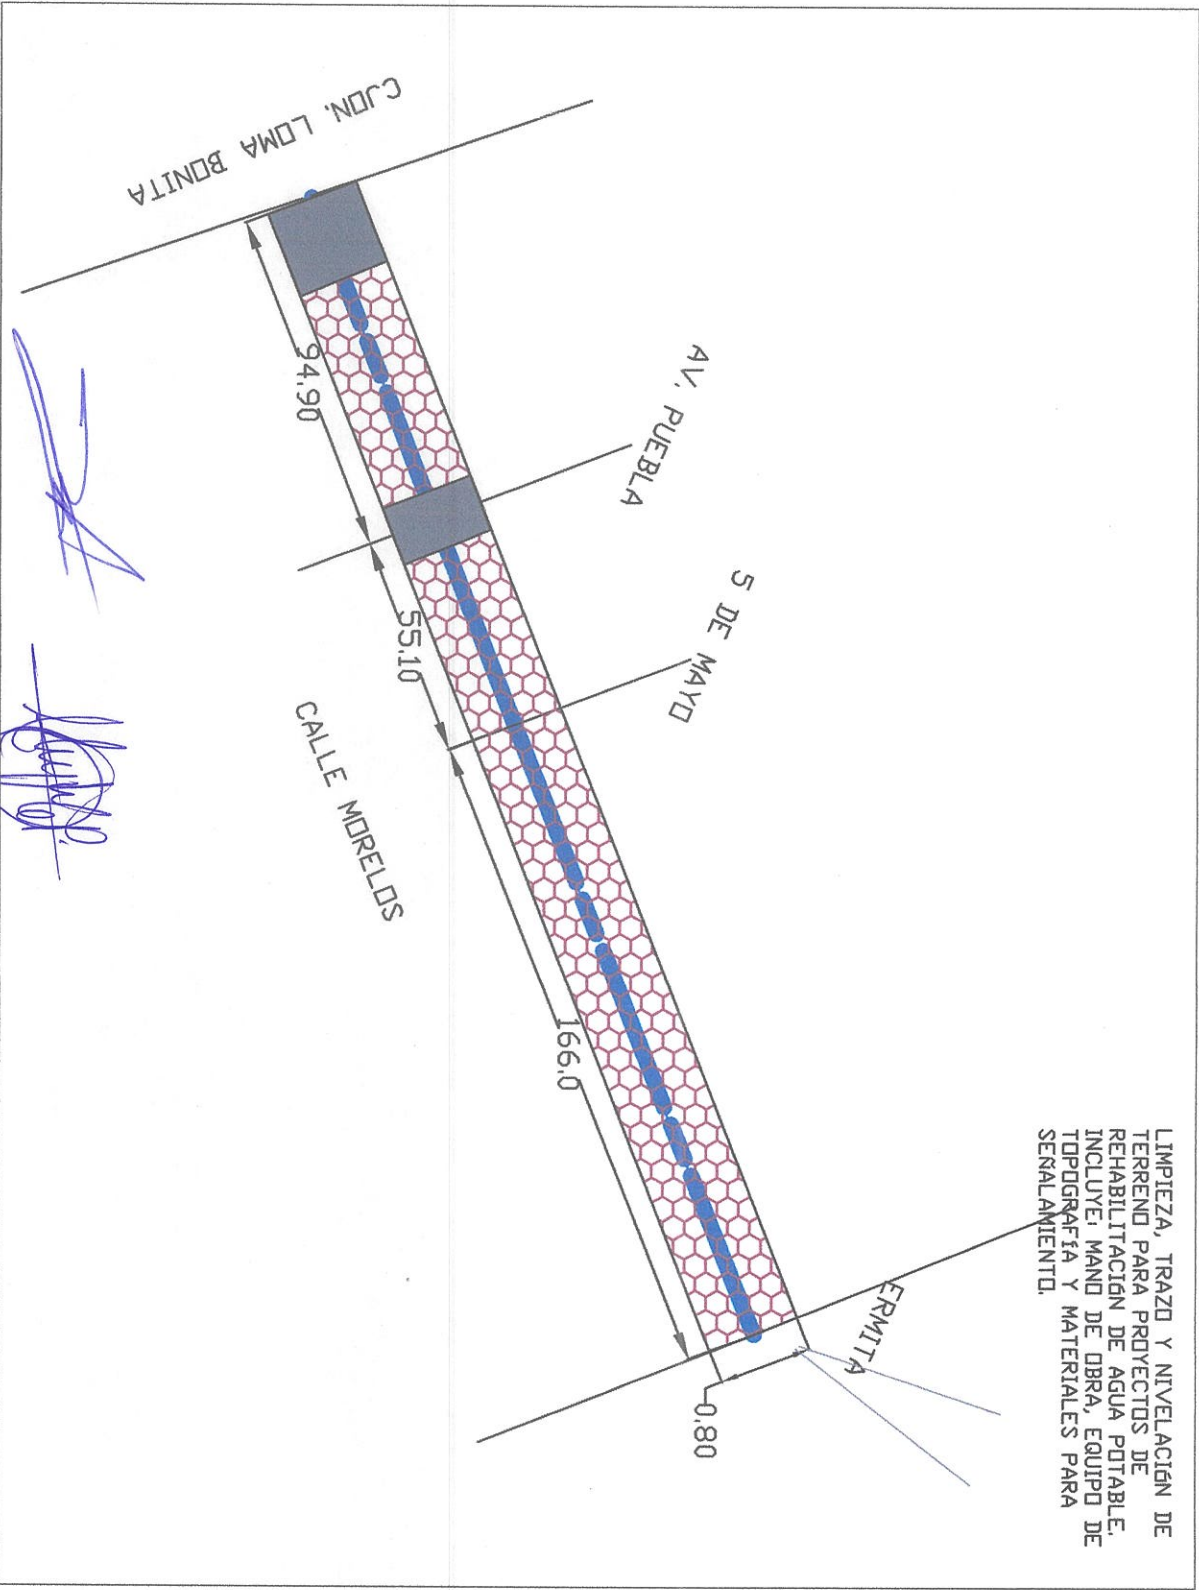


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

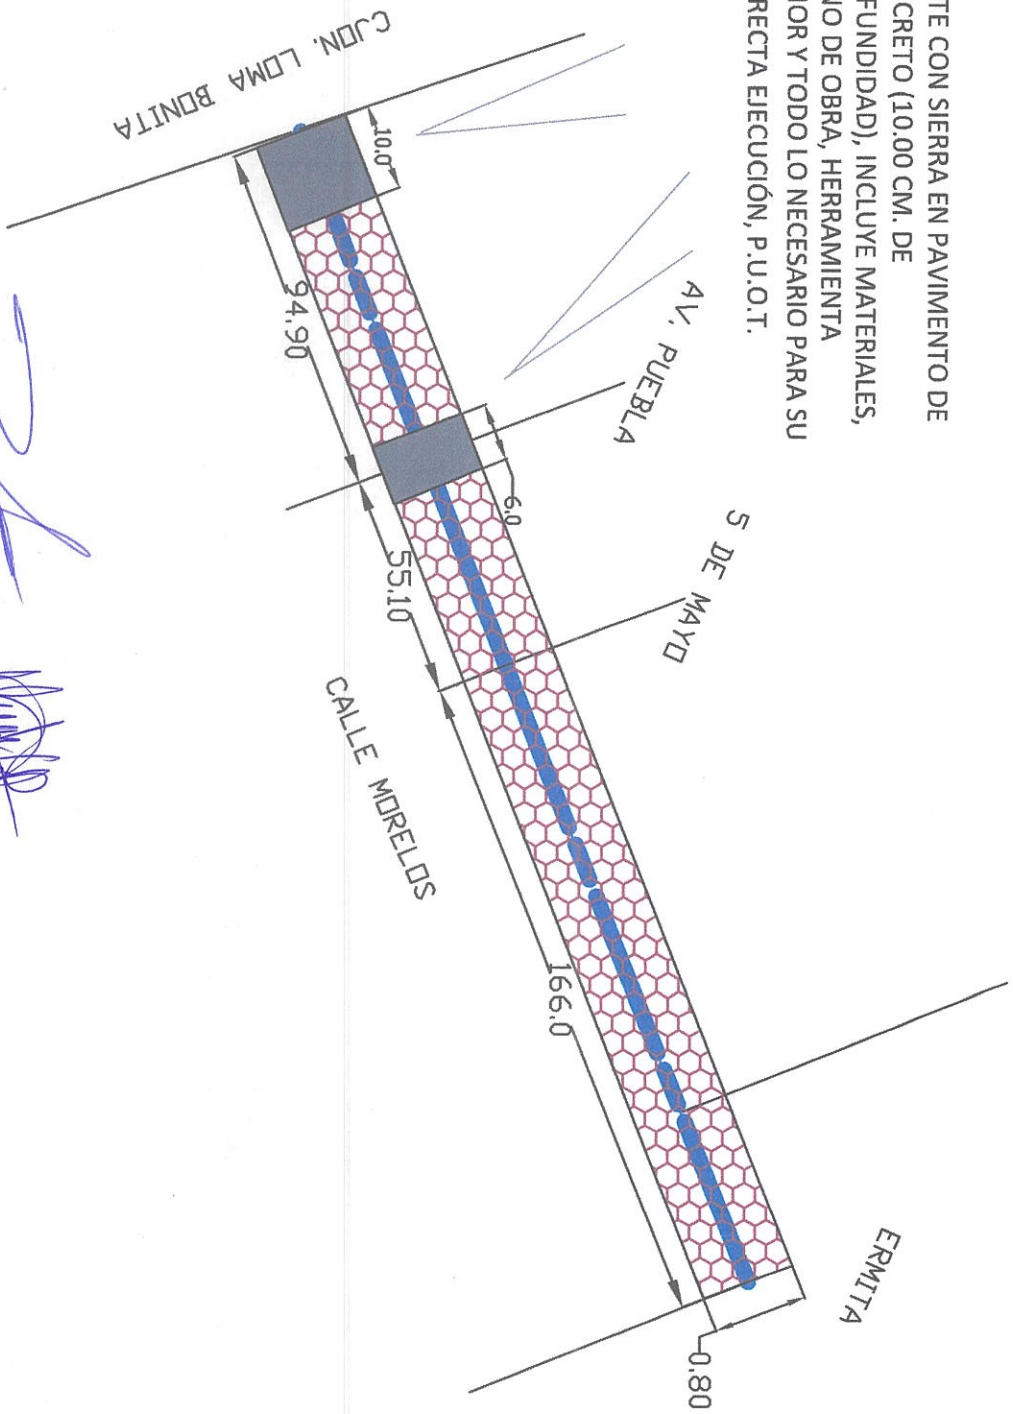


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

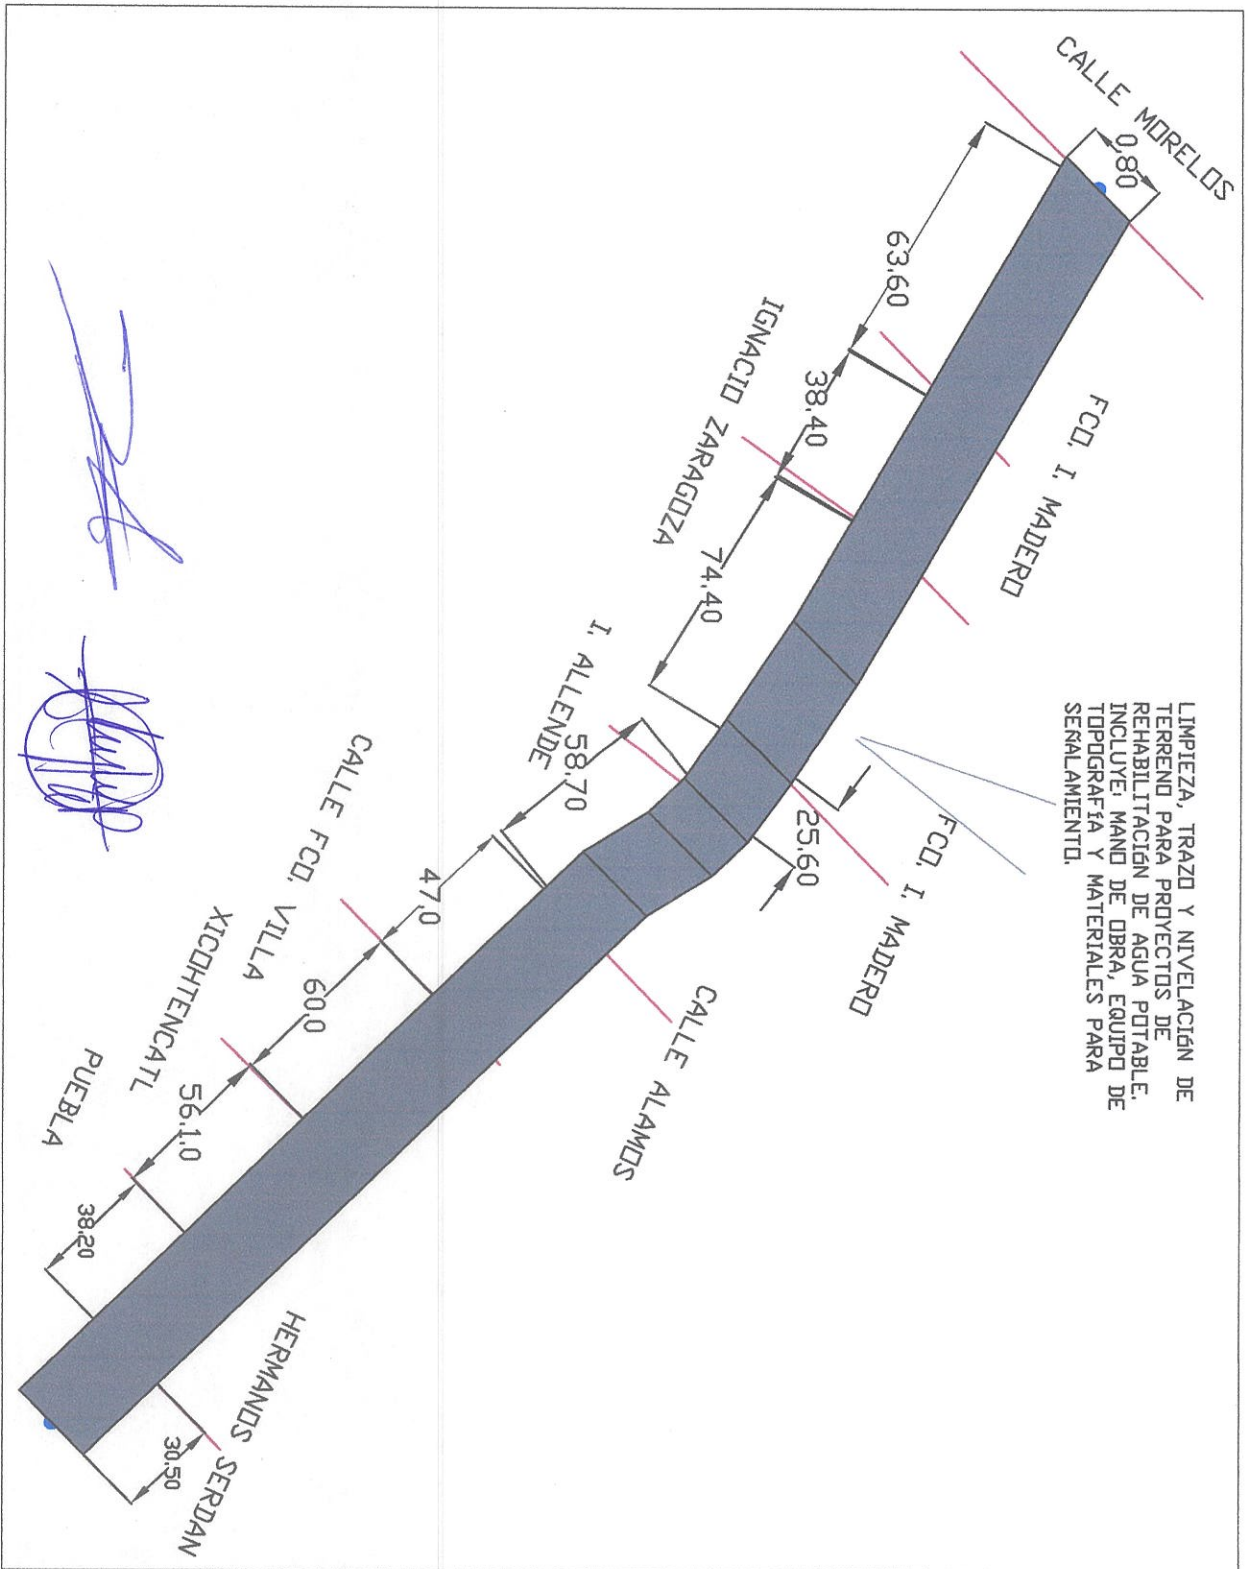


LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PROYECTOS DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE. INCLUYE: MANDO DE OBRA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SERALAMIENTO.

[Handwritten signatures in blue ink]

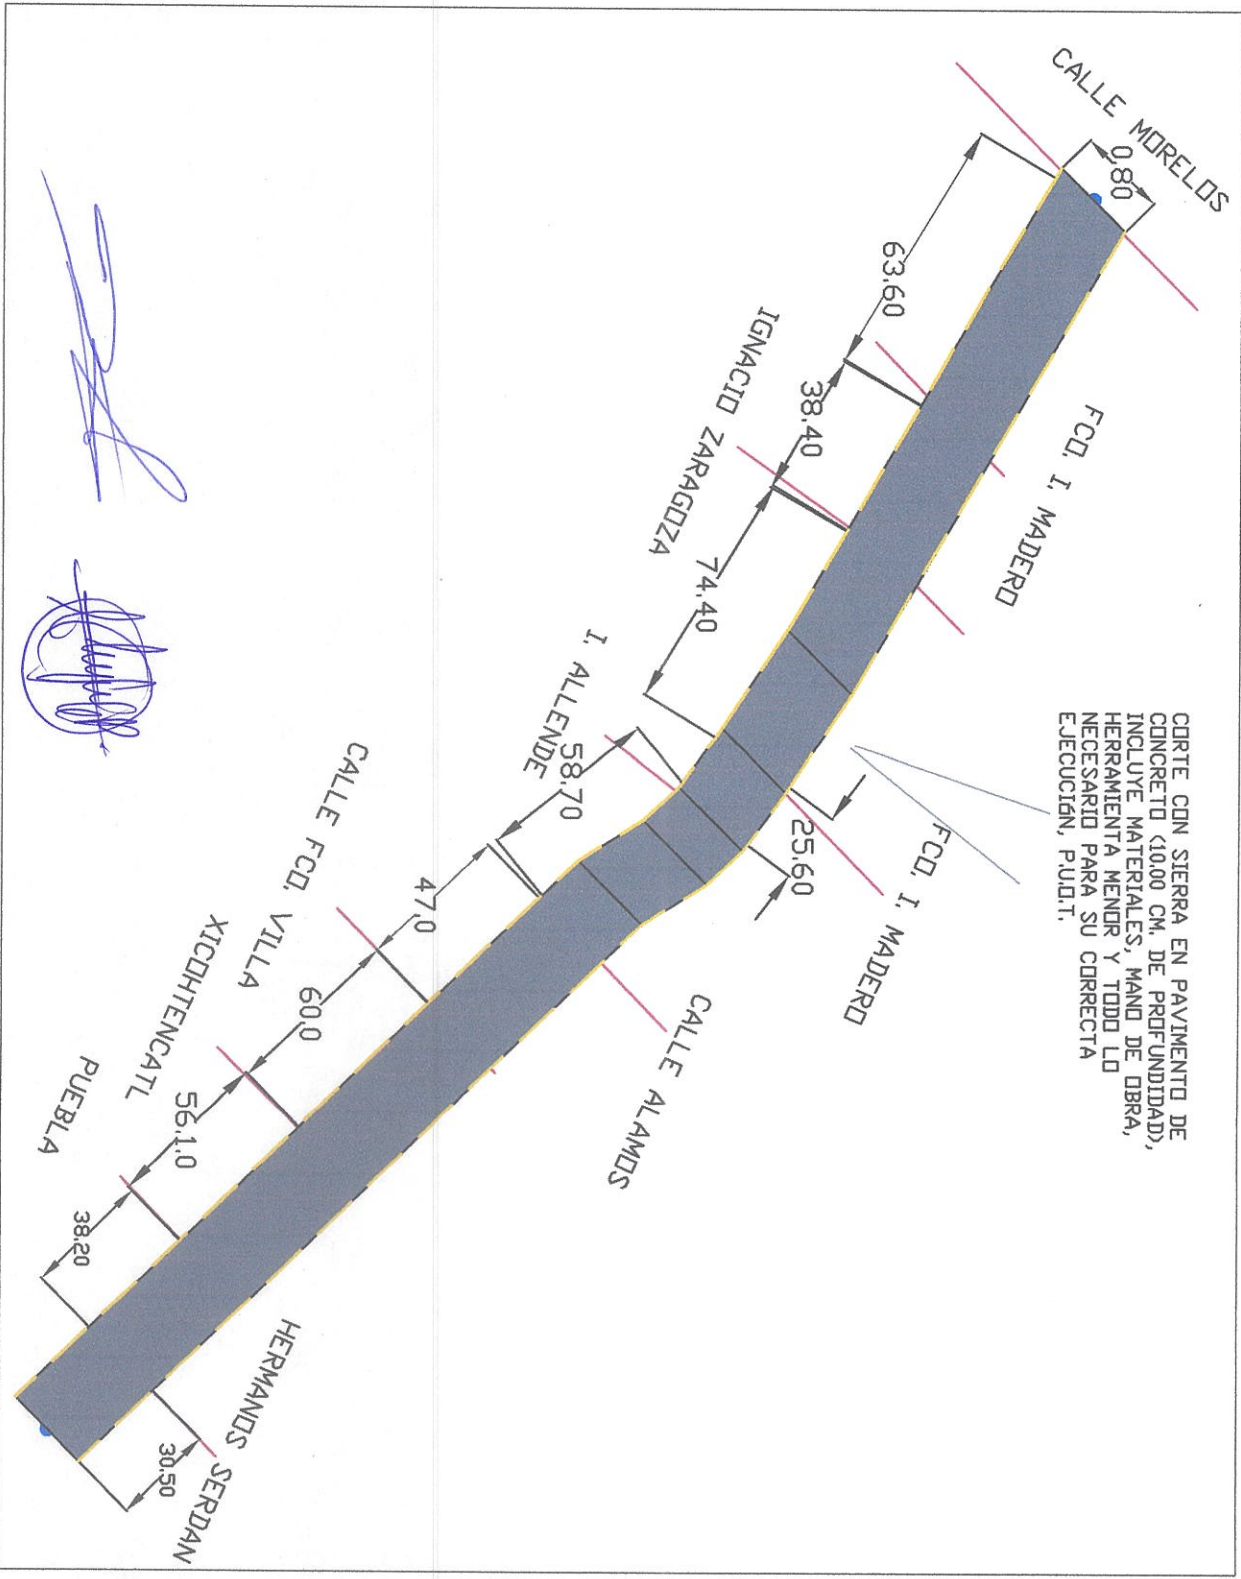


CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.D.T.

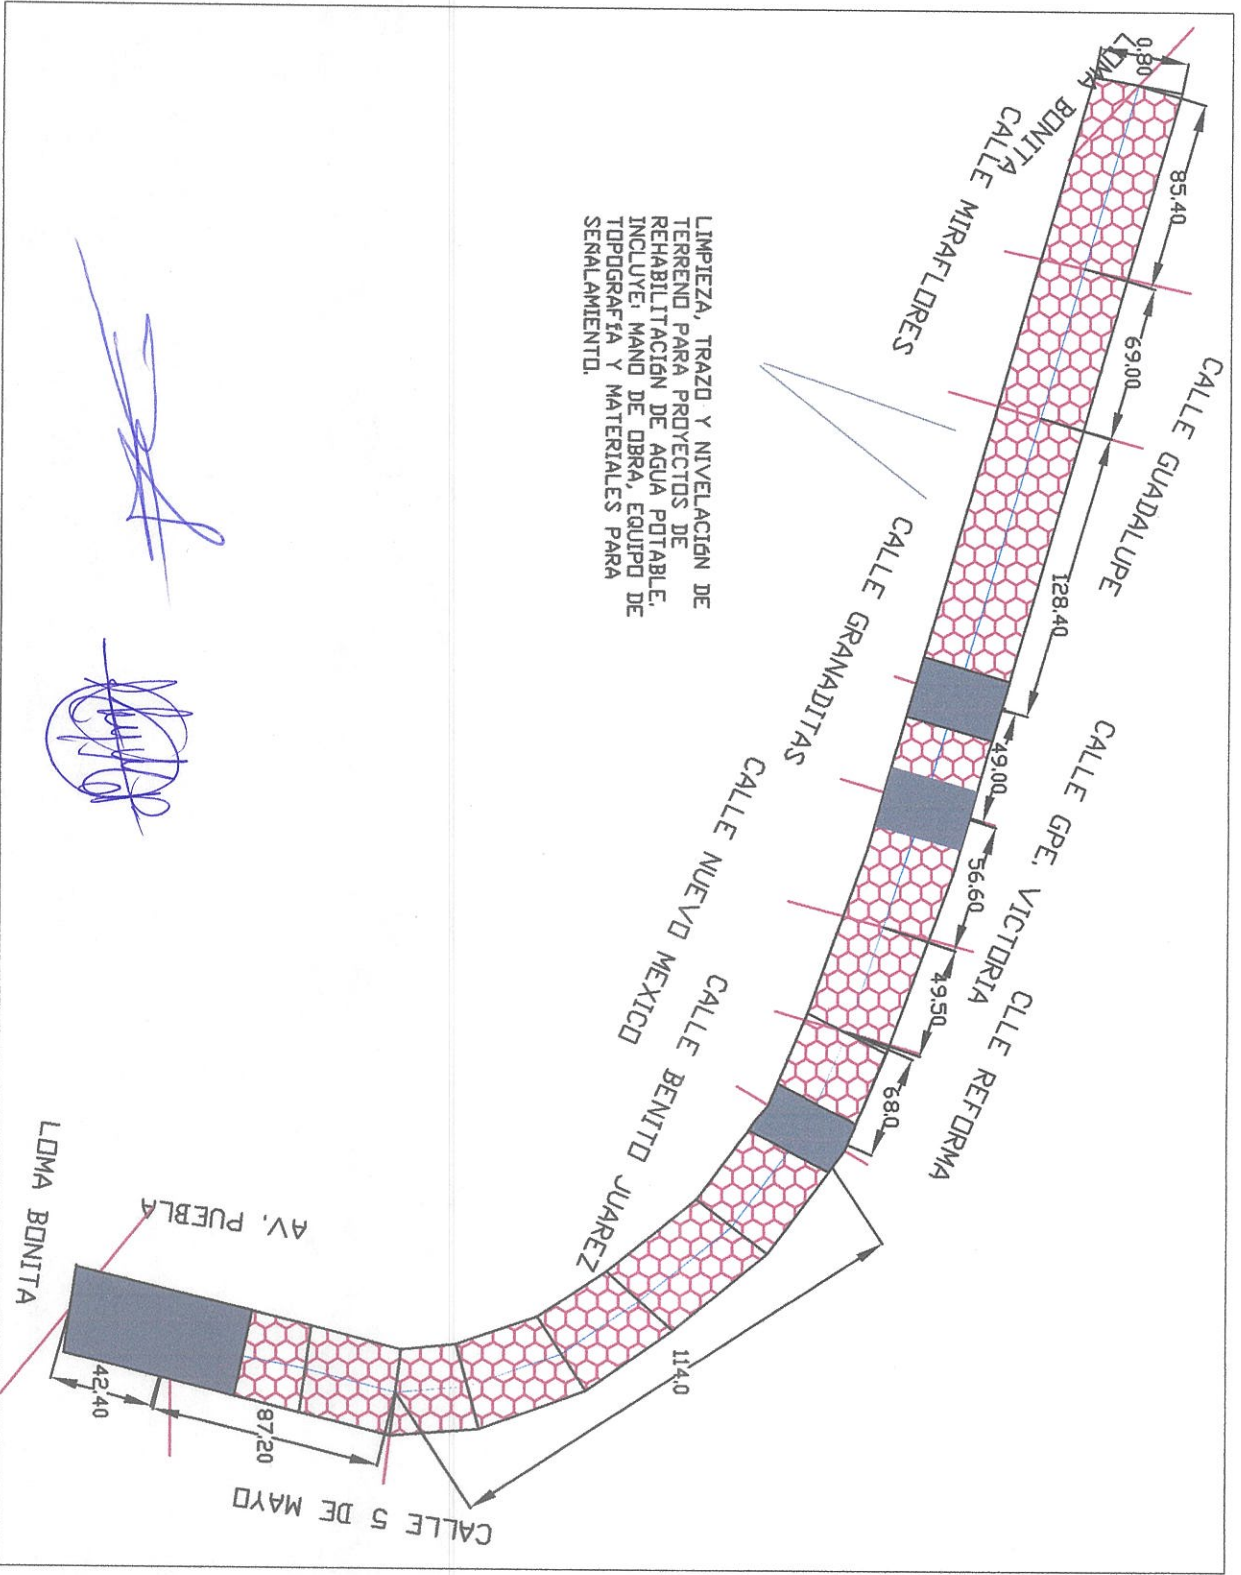

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE
 TERRENO PARA PROYECTOS DE
 REHABILITACION DE AGUA POTABLE.
 INCLUYE: MANDO DE OBRA, EQUIPO DE
 TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA
 SENALAMIENTO.

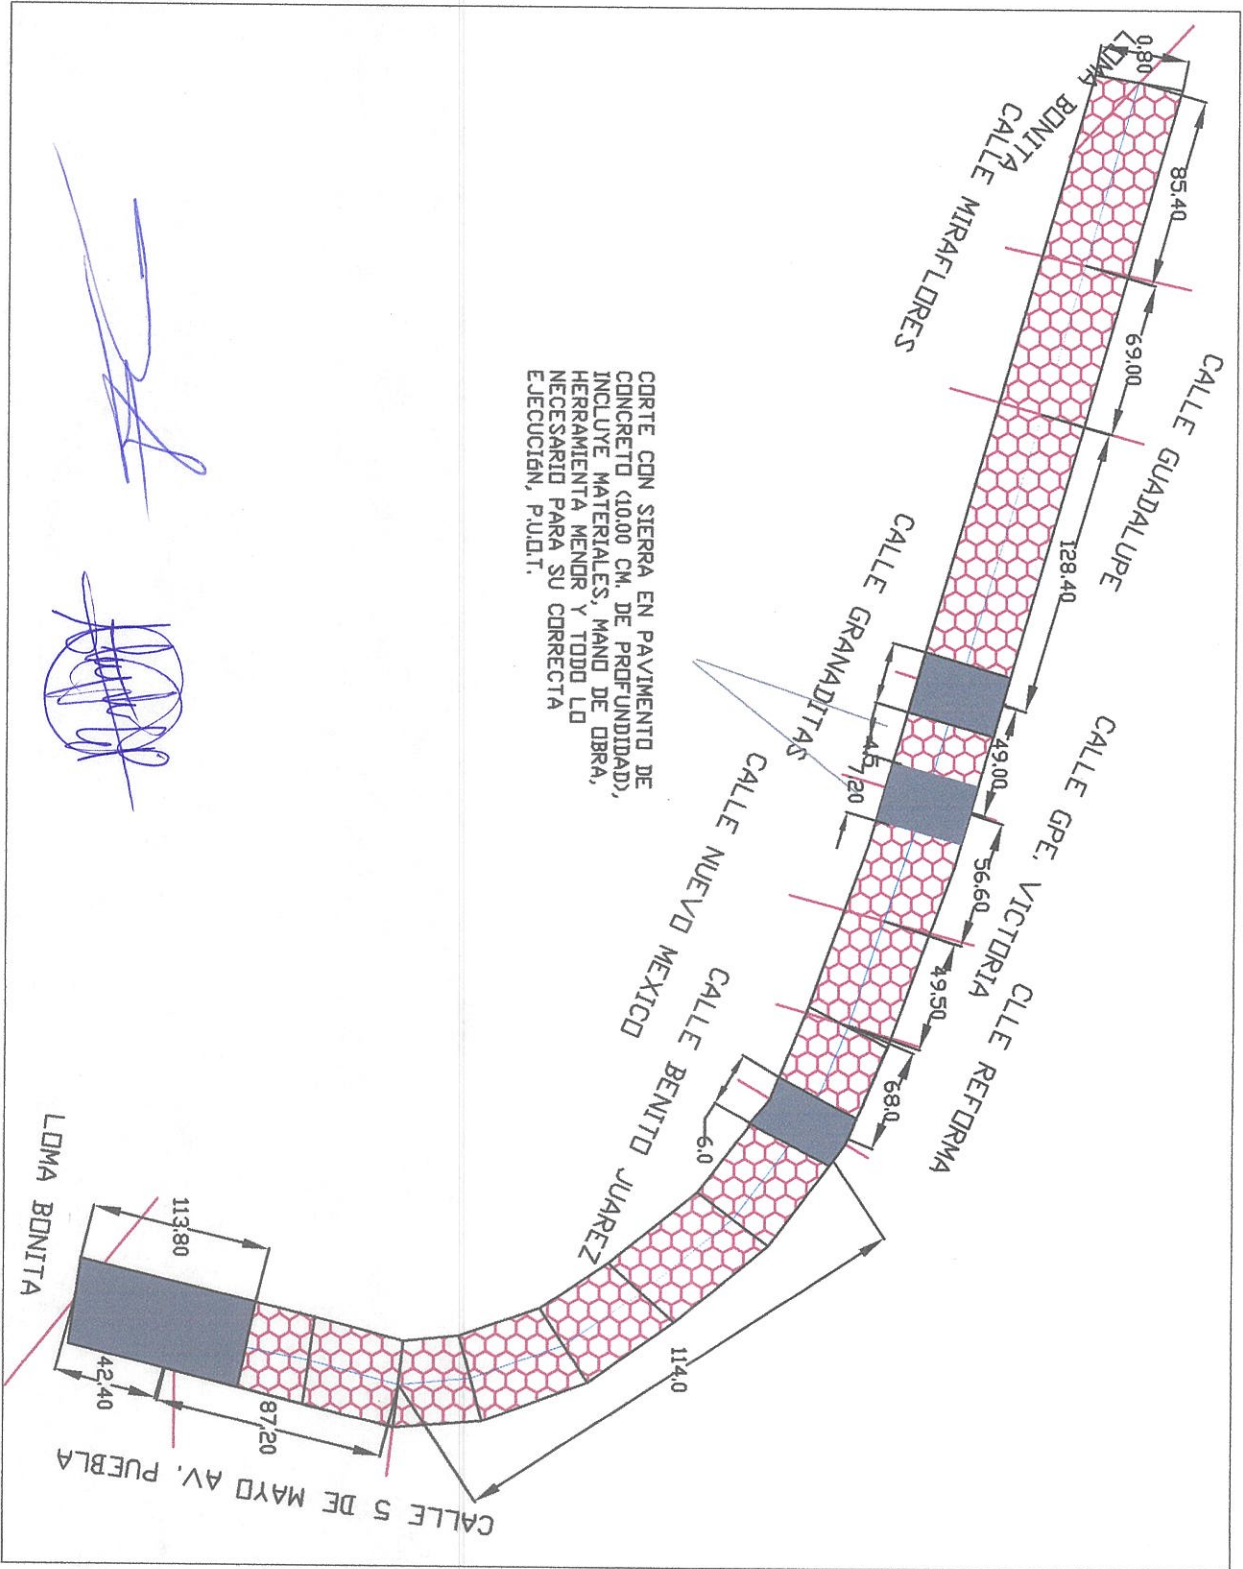

CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE
 CONCRETO (10,00 CM. DE PROFUNDIDAD),
 INCLUYE MATERIALES, MANDO DE OBRA,
 HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
 NECESARIO PARA SU CORRECTA
 EJECUCION, P.U.D.T.






GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE

TEPEACA S.A. DE C.V

CALENDARIO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AV. PUEBLA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN,

CONTRATO:

CON-CEAT-005-22

PERIODO DE CONTRATO: 45 DIAS NATURALES
DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022

ACTIVIDAD	ESTIMACION 1														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TRAZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER EYES Y REFERENCIAS DEFINITIVAS, INCLUYE: MADERA PARA CRUCETAS, CAL PARA INDICACION DE ANCHOS, VARILLAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.															
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10.00 CM. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.															

BITACORA DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA. PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA."	No. DE CONTRATO: CON-CEAT-005-22
PERIODO DEL CONTRATO: 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022	ESTIMACION No: 1 (UNO)
PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES DEL 13/05/22 AL 27/06/22	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022

Nota de Apertura de Bitacora.

Folio N° / Anejo N° 01

Con fecha de 13 de mayo de 2022 se hace la apertura oficial de esta bitacora, correspondiente a la obra: Rehabilitación de Red de Agua Potable en calle Morelos, Calle Independencia y Avenida Puebla, ubicado en el Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, que se ejecuta mediante el numero de contrato: CON-CEAT-005-22, y con un importe de \$ 1,193,337.17 IVA incluido.

Los trabajos de este contrato consisten en: Limpieza, trazo y nivelación, corte con sierra, demolición de pavimento, retiro del material proveniente de la demolición, retiro de adoquin existente, excavación, tendido de arena en cepas, suministro y colocación de tubería hidráulica, tomas domiciliarias con hidrotoma, relleno de cepas, elaboración de registros de 0.60 x 0.80 x 0.80 (int). suministro y colocación de valvulas de seccionamiento de 3" y finalizando con la colocacion de adoquin y elaboracion de firme de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ colocado en la parte demolida.

El plazo de ejecución contractual es de 45 días naturales, del 13 de mayo de 2022 al 27 de Junio del 2022.

Quien estara a cargo de la obra como superintendente es el Ing. Ernesto Hernandez Lopez de la empresa Grupo de Arquitectos y Asociados de Tepeaca S.A. de C.V.

FIN DE TEXTO



ING. ERNESTO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA



LIC. ALEJANDRA GONZÁLEZ RIQUINTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

SUPERVISOR CEAT

BITACORA DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA. PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA."	No. DE CONTRATO: CON-CEAT-005-22
PERIODO DEL CONTRATO: 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022	ESTIMACION No: 1 (UNO)
PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES DEL 13/05/22 AL 27/06/22	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: Del 13 de mayo de 2022
al 15 mayo de 2022

Folio N° / Anezo N° 02

Se inicia la obra con los trabajos preliminares, comenzando con el trazo y la nivelación donde se establecen los ejes y las referencias definitivas, incluyendo madera para cruces, cal para indicaciones de anchos, varillas, mano de obra, equipo y herramienta.

FIN DE TEXTO



ING. ERNESTO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA



LIC. ALEJANDRA GONZÁLEZ PIOQUINTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

SUPERVISOR CEAT

BITACORA DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS Y AVENIDA. PUEBLA. DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA."	No. DE CONTRATO: CON-CEAT-005-22
PERIODO DEL CONTRATO: 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE JUNIO DE 2022	ESTIMACION No: 1 (UNO)
PERIODO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES DEL 13/05/22 AL 27/06/22	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022

Fecha: Del 16 de mayo de 2022
al 27 de mayo de 2022

Folio N° / Anexo N° 03

El día 16 de mayo de 2022 se iniciaron con los trabajos de corte con sierra en pavimento de concreto (10.00 cm de profundidad), se incluyo materiales, mano de obra, herramienta menor y el equipo necesario para su correcta ejecución.

Dicho trabajo finalizo el día 27 de mayo de 2022

FIN DE TEXTO


ING. ERNESTO HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


LIC. ALEJANDRA GONZÁLEZ PIOQUINTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION


ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR CEAT
