



MIRIAM ROJAS OLVERA

RFC: ROOM800420AW3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 90355

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 291
Método de pago	PLE - Pago en una sola exhibición	Fecha	21/E/2018 10:06:20
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** COMISION ESTATAL DEL AGUA TLAXCALA  
**R.F.C.:** CEAQ91222BM2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** MARGEN IZQUIERDO RIO ZAHUAPAN No. SN, SAN HIPOLITO CHIMALPA, C.P. 90112, , TLAXCALA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SEF	E48 - Unidad de servicio	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. UBICACION: POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. LOCALIDAD: QUINTA SECCION  MUNICIPIO: TEOLOCHOLCO CONTRATO: CON-CEAT-016-18 PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION: DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 PERIODO DE EJECUCION DE CONTRATO: DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2018 CONSISTE EN: REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75HP DEL POZO DE	128,379.05	0.00	002 - IVA - 20,54C 65	128,379.05



**Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,**  
**Grupo Financiero Aserta Antes**  
**Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,**  
**Grupo Financiero Aserta**  
 RFC: AAS920731477  
 Avenida Periférica Sur Número 4829,  
 Interic Piso 9  
 Co. Parque del Fedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México  
 Teléfono: (55) 5447-3900

**Fianza Número:** 3560-09343-1  
**Código de Seguridad:** WbydjvL  
**Folio:** 2480890  
**Monto de la fianza:** \$14,891.97  
**Monto de este movimiento:** \$14,891.97

**PÓLIZA DE FIANZA**

**Lugar y Fecha de Expedición:** Ciudad de México, 12 de Septiembre de 2018 **Moneda:** MXN

**Movimiento:** Emisión

**Fiado:** MIRIAM ROJAS OLVERA

Aseguradora **ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA**, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora

A Favor de **LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**


A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR LA C. MIRIAM ROJAS OLVERA, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CON-CBAT-016-18 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$148,919.70 (CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP. DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. ASEGURADORA ASEFTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE DECLARÁ: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA. B) QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA MISMA, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C) QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA DEPENDENCIA LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y SE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZAGARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (S) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283 y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA NGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



HUMBERTO COLIN YAÑEZ

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
**A19C 3Y23 18**

Firma: V9m100C2Q7A05y6S1V42X8VPRVTOyP21bveqGQaWmXWwSvqHz39V5CHVvQRA4sm1HT:J9WV50BS8vXb16wPY4lLeBC3wE7Es2P0MRK1wzyeqZxF-JiaVNZM2J-Jeq-R6ZJt8FgWIRIAY9JduJvAd9HF2MmCkv9B7nK= Digital Firmante: HUMBERTO COLIN YAÑEZ. Serie Certificac: 0000100009900010468. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,  
 Grupo Financiero Aserta Antes  
 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.,  
 Grupo Financiero Aserta  
 RFC: AAS9207314T7  
 Avenida Periférico Sur Número 4829,  
 Interior Piso 9  
 Col. Parque del Pedregal  
 México 14010, Delegación Tlalpan,  
 Ciudad de México  
 Teléfono: (55) 5-47-3900

Fianza Número: 3560-09342-0  
 Código de Seguridad: eRR4mFj  
 Folio: 2480877  
 Monto de la fianza: \$14,891.97  
 Monto de este movimiento: \$14,891.97

**PÓLIZA DE FIANZA**

Lugar y Fecha de Exepción: Ciudad de México, 06 de Septiembre de 2018 Moneda: MXN  
 Movimiento: Emisicr  
 Fiado: MIRIAM ROJAS OLVERA

Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:

A Favor de LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA


A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PARA GARANTIZAR POR LA C. MIRIAM ROJAS OLVERA. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CON-CEAT-016-18 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$148,919.70 (CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP. DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B) EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA C EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD, D) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ENTIDAD, E) LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SCMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ARTICULOS 178, 282, 283 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx)  
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PÓL ZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA ASEGURADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita y a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA ASEGURADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de internet [www.aserta.com.mx](http://www.aserta.com.mx), para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".



HUMBERTO COLIN YAÑEZ

LÍNEA DE VALIDACIÓN  
 A19C 3Y0T 18

E/R XIX-IX-MMXVIII V.1

Firma: Mhce7DhWOLcjt8TirnsFSeqdp44HydayCZvmtsrEGG1ht+s2YwVozTfjYVvIz4THojc2bTUNE81k8rHsV5kKqA2CevTO4X1SUGwCq5A8LMCTg0LGFQpnmL4jPyPKBz0ceLX512+-dJfRkLcEbDfTfSsIF5fGzUeGdJK6= Digital Firmante: HUMBERTO COLIN YAÑEZ. Serie Certificado: 00000100009900010486. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

AGUA POTABLE  
 DE LA QUINTA  
 SECCION,  
 MUNICIPIO DE  
 TEOLOCHOLCO,  
 TLAX.  
 Vo.Bo.  
 MVZ. ALBERTO  
 VAZQUEZ DIAZ  
 LA COMISION  
 ESTATAL DEL  
 AGUA DE  
 TLAXCALA  
 RESPONSABLE:  
 MIRIAM ROJAS  
 OLVERA  
 MIRALEX  
 IMPORTE DE  
 ESTA  
 ESTIMACION:  
 128,379.05  
 16% I.V.A.  
 20,540.65  
 SUBTOTAL:  
 148,919.70  
 DEDUCCIONES:  
 OFS 5 AL MILLAR  
 641.90  
 SPF 5 AL MILLAR  
 641.90  
 IMPORTE  
 LIQUIDO A  
 COBRAR: 147,  
 635.90

Importe con letra CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.	Subtotal	128,379.05
	Impuestos Traslados	20,540.65
	<b>Total</b>	<b>148,919.70</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 0000100000409642162  
 Folio fiscal 15102450-6BA2-45EE-B8C4-082A0231F4AC  
 No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000404486074  
 Fecha y hora de certificación Septiembre 21, 2018 - 10:06:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JBdwlQIOCw/vgFcyoxHPxwzkmlKnAee3nSHk2At9AqYsk1AVoj24E+hkNGUWDbY39CSAu6yMOQTkT5YRXrTQQh  
 2vopDbTs+U4+aXn/r9C/ComtwwpSlurxKgowRfoCpcfg9erxqJxuqw6vD2K39vRRKwTg+5YdzTErwsJxrOoagg  
 Wbc3BP4EixMHS1uJNseRCOClpSAD2te5/xg2ZNQeahUPIHTXy8eM5AXHHRj38WP9qictbflhCaUi5qQSEVAk+d  
 9PN4AcalWrvNwVrpkJR50CJdMQEo09H04RxdNoJzZqtKno/ldLxMPR3kgr3jssxadtndks4Pn1hjPbBDLmPC==

Sello del SAT

X2VLI+YYPYruShZftf00P98PF/TAMzLRaKQV6mWOFmnKpY6SIAeedp4cWT2sQzfs+9ARMrEm1Z++0  
 7V2F0rZ53v9lYy+Iz4W3EGYmWGMtW49V31b\*zy1bqsVMVIVbsSR7N4vUgH7EAgXzj/Lv5s7BgDOxBfms  
 FALssRfqKui4nInmo\*sz5ERezJrLc7tXCALG17wDccU+CxHV7QOCGxaknXTKm6wZlpuujNraUNVcKoGS  
 LcZzw:XCQ+kYbg\_mJaxvET8CVJbb0oPIOAEz,iE8ayYSX61PHMI55XH063d1qMpOlHnzJPOJSltrrR  
 rr0aSLEfcwtXDeR76D8PUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15102450-6BA2-45EE-B8C4-082A0231F4AC|2018-09-21T10:06:23|MAS0810247C0|JBdw  
 lQIOCw/vgFdyox+PxeWZ+w\_KnAee3nSHk2At9AqYsk1AVoj24E+hkNGUWDbY39CSAu6yMOQTkT5YRXrTQ  
 Qh2vopDbTs+U4+aXn/r9C/ComtwwpSlurxKgowRfoCpcfg9erxqJxuqw6vD2K39vRRKwTg+5YdzTErws  
 JxrOoaggWbc3BP4EixMHS1uJNseRCOClpSAD2te5/xg2ZNQeahUPIHTXy8eM5AXHHRj38WP9qictbflh  
 CaUi5qQSEVAk+d9PN4AcalWrvNwVrpkJR50CJdMQEo09H04RxdNoJzZqtKno/ldLxMPR3kgr3jssxadt  
 ndks4Pn1hjPbBDLmPC==|C0001C00000404486074||



Venta de Material Eléctrico e Hidráulico

SEMPRE FORTALONG SA  
CALLE VALLE DONADO 112 REAL DE LA VALLE APILAQUILAR TLAAXCALA C.P. 20355 C.B. (244) 320 52 00  
www.1994chobol.com

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**  
**Jefe de Planeación**  
**La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala**

**PRESENTE.**

**Asunto: Entrega - Recepción de la Obra.**

Tlaxco, Tlaxcala., a 12 de Septiembre de 2018

Por medio de la presente me permito informar el Termino y conclusion de los Trabajos de la obra denominada **REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.** Con numero de contrato **CON-CEAT-016-18** en la Localidad de **QUINTA SECCIÓN**, con ubicación en el **POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.**

Los cuales se encuentran ejecutados al cien por ciento y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones por parte de la **Comisión de Estatal del Agua de Tlaxcala**, portal motivo hago **LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA ANTES MENCIONADA.**

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

**POR EL CONTRATISTA**  
**ENTREGA**

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL**  
**AGUA DE TLAXCALA**  
**RECIBE**

**C. MIRIAM ROJAS OLVERA**

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**

**MIRALEX**



**JEFE DE PLANEACIÓN**

**ELECTROPOMPE**

**SIEMENS**

**TORK**





SOCIIDAD EXCLUSIVA DE CAPITAL

AV. C. DE LOS RINCONES No. 1000, C. DE LOS RINCONES, TOLUCA, MEXICO

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**  
**Jefe de Planeación**  
**La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala**  
**PRESENTE.**

**Asunto: Aviso de Terminación de Servicio.**

Tlaxco, Tlaxcala., a 12 de Septiembre de 2018

Por medio de la presente me permito informar el Termino y conclusion de los Trabajos de la obra denominada REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. Con numero de contrato CON-CEAT-016-18 en la Localidad de QUINTA SECCIÓN, con ubicación en la POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.

Los cuales se encuentran ejecutados al cien por ciento y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones por parte de La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. MIRIAM ROJAS OLVERA**  
**MIRALEX**





# Venta de Material Eléctrico Electrónica

COMERCIALIZADORA EN VENTA

AV. DE LA UNIDAD 1407 - COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, TOLUCA, ESTADO DE TOLUCA

**MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ**  
**Jefe de Planeación**  
**La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala**  
**PRESENTE.**

Asunto: **Carta Garantía por Vicios Ocultos.**


Tlaxco, Tlaxcala., a 12 de Septiembre de 2018

Por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los Trabajos de la obra denominada: REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX. Con numero de contrato: CON-CEAT-016-18 en la Localidad de QUINTA SECCIÓN, con ubicación en POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX, La Empresa MIRALEX en representacion la C. Miriam Rojas Olvera con RFC ROOM800420AW3, GARANTIZA POR DOCE MESES DEFECTO ALGUNO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ASI COMO CUALQUIER VICIO OCULTO a partir de la Fecha de Entrega-Recepción.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. MIRIAM ROJAS OLVERA**  
**MIRALEX**



# Venta de Material Eléctrico e Instalación

COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA

CALLE VALLE DORADO 413 COLONIA DE LAS VALLAS APDOADO EL ARCAJO, TLAXCALA, C.P. 90016 TEL. (243) 526 52 50

## ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

ESTIMACIÓN No.:	Estimación UNO FINIQUITO		
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO	CONTRATO:	CON-CEAT-016-18
LOCALIDAD:	QUINTA SECCIÓN	UBICACIÓN:	POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		

PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018

CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.
--------------	---

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$148,919.70	
IMPORTE EXTRAORDINARIO	\$0.00	
IMPORTE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	\$148,919.70	

SALDO POR EJECUTAR	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$148,919.70	\$148,919.70

### ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$0.00	\$0.00

RESPONSABLE:

MIRALEX



C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. ALFREDO GONZALES OLIVO  
SUPERVISOR

VO. BO.


LA COMISIÓN ESTADAL DE AGUA DE TLAXCALA

MVZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACIÓN









Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS



MIRIAM ROJAS OLVERA

R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		NÚMEROS GENERADORES	
MUNICIPIO:	Estimación UNO FINIQUITO	CONTRATO:	12NCPA1-016-18
LOCALIDAD:	TEHUACATEPEC	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 08 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	QUINTA SECCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 08 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
OBRA:	POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACATEPEC	HOJA:	1
CONSIERE EN:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACATEPEC, TLAX.		


CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN		ALTO	PIEZAS	RESULTADO	UNIDAD
		TRAMO	TIPO				
125-79	MANOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBA CON TUBERÍA DE 6" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
					2.00	2.00	MAN
					TOTAL	2.00	MAN
25-207	SUMINISTRO DE MOTOR DE ACERO INOXIDABLE DE 75 HP / 440 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
					1.00	1.00	PIEZA
					TOTAL	1.00	PIEZA
75-798	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE RUIDO Y RECTIFICADO DE FLECHA E IMPULSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO						
					1.00	1.00	REHAB
					TOTAL	1.00	REHAB

RESPONSABLE:

MIRALEX  
C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. ALFREDO GONZALEZ SANDOVAL  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
  
Mtz. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACIÓN



Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS



MIRIAM ROJAS OLIVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

CALENDARIO DE OBRA	
MUNICIPIO:	TEOLOCHILCO
LOCALIDAD:	QUINTA SECCIÓN
UBICACIÓN:	POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO, TLAX.
SERVICIO:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO, TLAX.
CONTRATANTE:	CON-CEAT-016-18
CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO, TLAX.
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	Adjudicación Directa
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Del 05 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018


CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	FECHA	CALENDARIO DE OBRA						
					INICIO	TERMINA	DURACIÓN	SEMI1	SEMI2	SEMI3	SEMI4

125-79	MANOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON TUBERÍA DE 6" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MAN	2.00	05-sep-18	08-sep-18	3 días								
25-207	SUMINISTRO DE MOTOR DE ACERO INOXIDABLE DE 75 HP / 440 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	08-sep-18	11-sep-18	4 días								
25-208	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO Y RECTIFICADO DE FLECHA E IMPULSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	REHAB	1.00	11-sep-18	12-sep-18	2 días								

RESPONSABLE:  
MIRALEX  
C. MIRIAM ROJAS OLIVERA

ING. ALFREDO GONZALES OLIVO  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESPECIAL DE AGUAS DE TLAXCALA  
ING. ROBERTO VARELA OLIVERA  
JEFE DE PLANEACIÓN



venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico



OSRAM PHILIPS



MIRIAM ROJAS OLIVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFJLR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		CONTRATO:	
MUNICIPIO:	Estimación UNO FINIQUITO	CON-CFAT-016-18	
LOCALIDAD:	TEOLOCHOLCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	QUINTA SECCIÓN POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	
OBRA:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	HOJA:	1
CONSISTE EN:	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		
125-79	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON TUBERÍA DE 6" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		

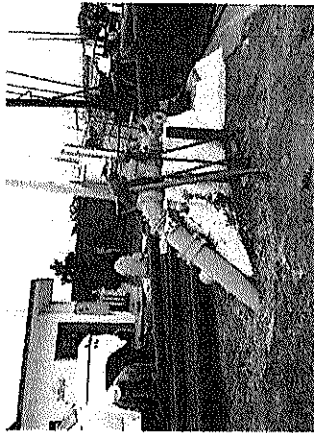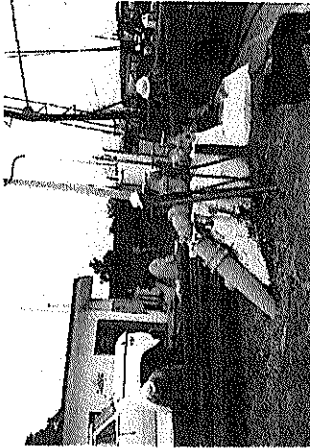


RESPONSABLE:

MIRALEX

C. MIRIAM ROJAS OLIVERA

ING. ALFREDO GONZALES OLIVO  
SUPERVISOR

VO. BO.  
LA COMISIÓN ESTIMAL DE AGUA DE TLAXCALA  
  
MZ. ALBERTO VÁZQUEZ DÍAZ  
JEFE DE PLANEACIÓN



Venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS




ELECTROSISTEMAS S.A. DE CV.

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACION		CONTRATO:	
ESTIMACION	Estimación UNO FINIQUITO	CONTRATO:	CON-CEAT-016-18
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO	PERIODO DE EJECUCION DE ESTIMACION:	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
LOCALIDAD:	QUINTA SECCION	PERIODO DE EJECUCION DE CONTRATO:	Del 08 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
UBICACION:	POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	HOJA:	2
OBRA:	REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		
CONSISTE EN:	REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		
25-207	SUMINISTRO DE MOTOR DE ACERO INOXIDABLE DE 75 HP 7 440 VOLTS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		

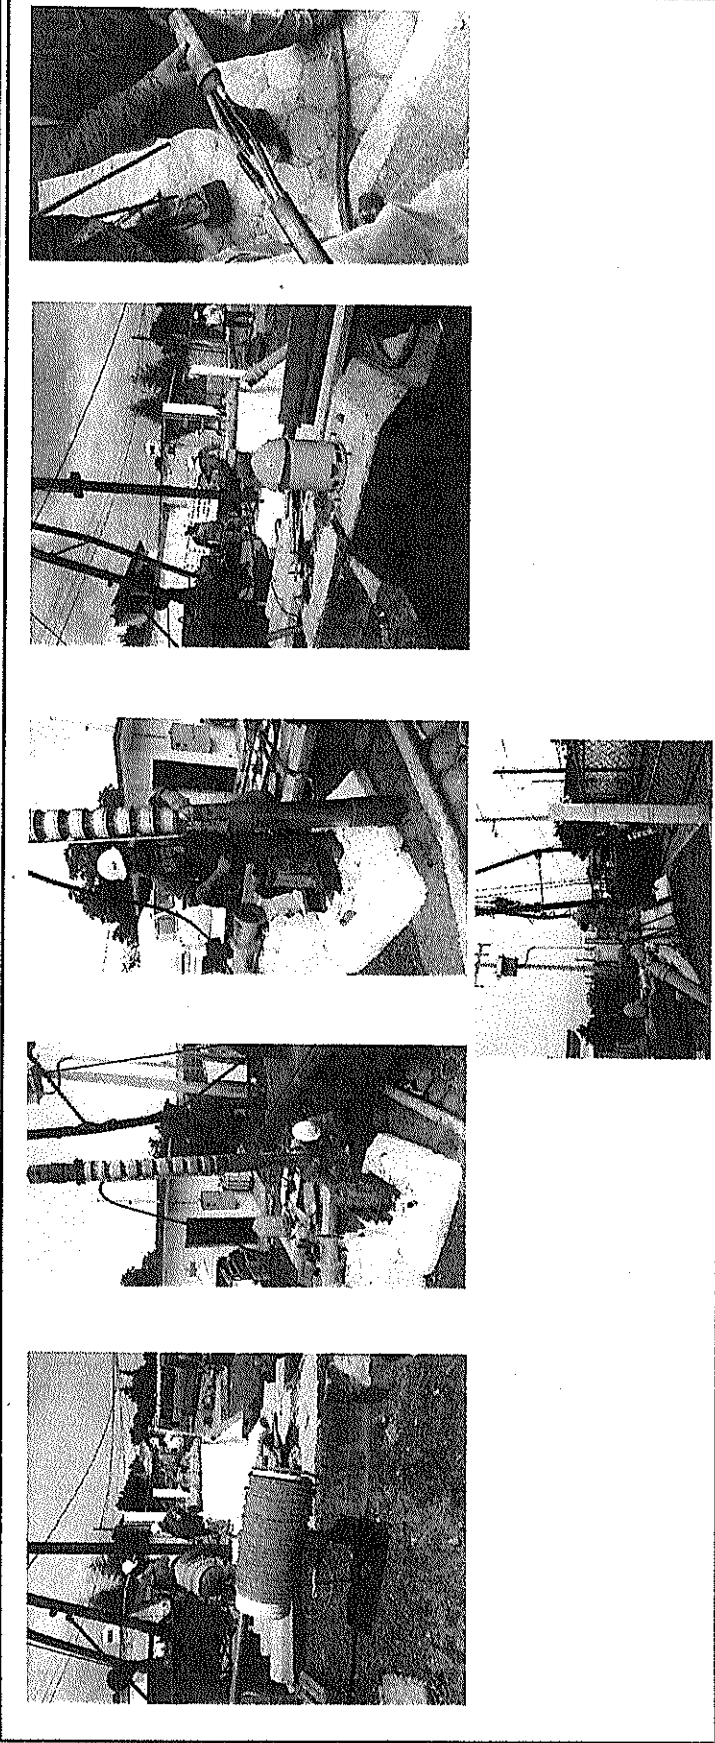


RESPONSABLE: MIRALEX

C. MIRIAM ROJAS OLVERA

ING. ALFREDO GONZALES OLIVO  
SUPERVISOR

VO. BO. LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  
MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ  
JEFE DE PLANEACION



venta de Material Eléctrico  
e Hidráulico

OSRAM PHILIPS

ISB  
SOLA S.A.B.I.C.


TORK  
ELECTRO INSTRUMENTOS S.A. DE C.V.

MIRIAM ROJAS OLVERA  
R.F.C. ROOM800420AW3 C.U.R.P. ROOM800420MDFILR05

CALLE VALLE DORADO 112 REAL DEL VALLE APIZACO, TLAXCALA C.P. 90355 CEL. (241) 120 52 50 mirale1194@hotmail.com

ESTIMACIÓN		CONTRATO: CON-CEAT-016-18	
MUNICIPIO:	TEOLOCHOLCO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTIMACIÓN:	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
LOCALIDAD:	QUINTA SECCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	Del 06 de Septiembre de 2018 Al 12 de Septiembre de 2018
UBICACIÓN:	POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.	HOJA:	3
OBRA:	REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		
CONSISTE EN:	REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 75 HP DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA SECCION, MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, TLAX.		
25-208	REHABILITACION DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE, PULIDO Y RECTIFICADO DE FLECHA E IMPULSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		

REPORTE FOTOGRAFICO

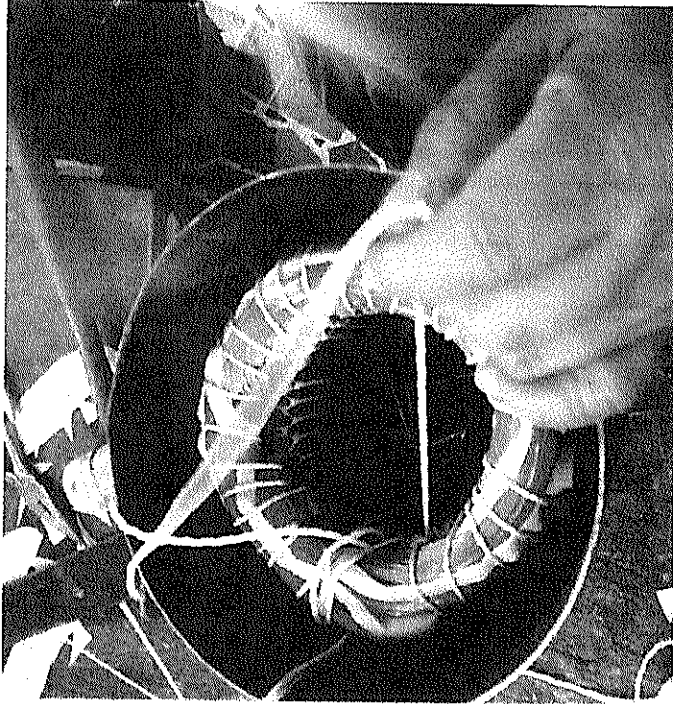

RESPONSABLE: MIRALEX  
C. MIRIAM ROJAS OLVERA

Alfredo  
ING. ALFREDO GONZALES OLIVO  
SUPERVISOR

VO. BO. [Signature]  
LA COMISION ESTATA DE AGUA DE TLAXCALA  
MVZ. ALBERTO VAZQUEZ DIAZ  
JEFE DE PLANEACION

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/09/2018

N° 01

Con esta fecha se da apertura a la presente nota de bitácora del contrato COL-CEAT-016-18, iniciando con las maniobras de desinstalación de equipo de bombeo tipo sumergible con grúa tipo pozera, sin otro punto que tratar se firma de conformidad en ella personal de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala y personal de la empresa "MIRALEX"

Mora Pías Olesca

Alfredo González Olivo

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 11 / 09 / 2018

Nº 02

Con esta fecha se continúa con los trabajos del contrato COW-CEAT-016-18 rehubiéndole la bomba sumergible y acoplándole motor nuevo en conexiones tipo nema y mangueras termocauterificables sobre el conductor, sin otro punto que tratar. Firmas de conformidad personal de la empresa MIRALEX y personal de la Comisión Estatal de Tlaxcala.

Miriam Rojas Ojeda

Alfredo González Olivo




BITÁCORA DE OBRA

FECHA 12 / 09 / 2018 |

N° 03

Con esta fecha se continúa con los trabajos del contrato CON-CEAT-016-18 instalando equipo de bombas tipo sumergible en el pozo de agua potable con estos trabajos queda ejecutado al 100% el contrato, en otro punto que tratar se cierra la presente nota de bitácora, Firmado de conformidad personal de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala y personal de la empresa "MIRALEX"

Miriam Rojas



Olcasa

Alfredo

